


Bijlage 2: elektriciteit – stand van zaken (NPRES)

Resultaten monitor april 2025 - RES Arnhem Nijmegen - begrippenkader jan '23 (cijfers in GWh)


	Totaal	Wind op Land	Zon op Veld > 15 kWp	Zon op Gebouw > 15 kWp	Wind en of zon onbepaald
Ambitie niet uitgewerkt	212,8	0,0	1,8	211	
Ambitie uitgewerkt	108,1	61,5	46,6	0,0	
Ambitie agv realisatiegraad pijplijn	396,7	118,7	262,6	0,0	X
Ambitie totaal	717,6	180,2	311,0	211	0
Voortraject	18,0	6,7	9,6	X	X
Vergunningaanvraag	61,6	37,2	24,4	X	X
Vergunningverlening	147,0	100,9	46,1	X	X
Subsidiebeschikking en bouw	120,7	39,2	81,5	65	X
Pijplijn Totaal	410,6	184,0	161,6	65	X
Gerealiseerd (huidig)	710,3	171,6	328,7	210	X
TOTAAL	1840	553	801	486	0
RES bod volgens RES 1.0	1620				

In dit overzicht is sprake van 'overprogrammering'. Het totaal telt op tot boven het bod om voor tegenvallers te compenseren. Dit komt tot uitdrukking in de correctie voor de realisatiegraden van de pijplijn, zie "ambitie agv realisatiegraad pijplijn". De resterende ambitie om het bod te realiseren is op dit moment 910 GWh. Zie volgende slide voor een verdere toelichting.

A. Verhouding zon op veld/wind (in MW)

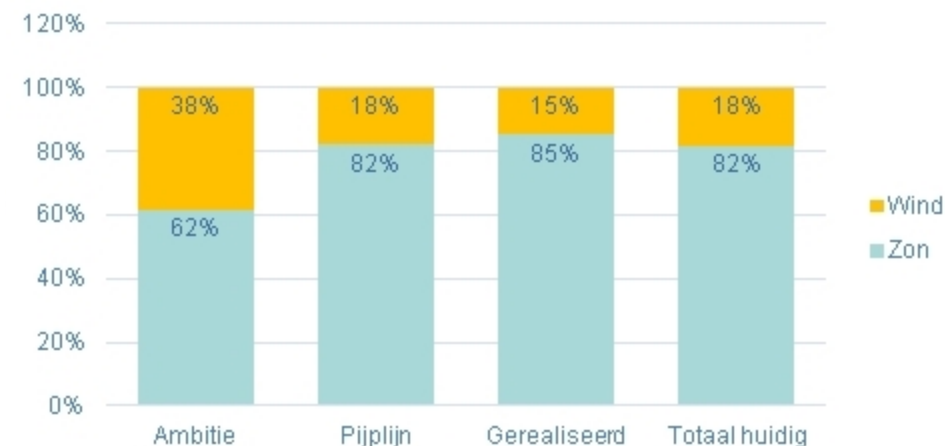

B. Verdeling in bod

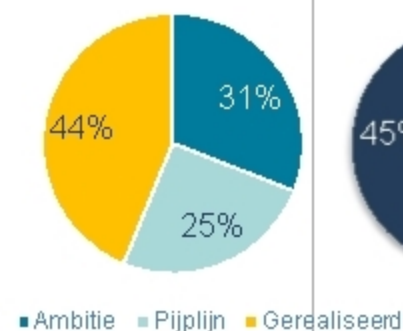

C. Verdeling in pijplijn

