

Status mijlpalen inrichtingsprojecten

Afdeling: Projecten & Programmeren

Onderstaande overzichten geven de status weer van de mijlpalen en financiën voor de grootste inrichtingsprojecten, als het gaat om doelrealisatie en impact, die een bijdrage leveren aan de volgende opgaven:



EVZ



Beekherstel



Vismigratie



NVO



Waterberging




Voldoende
water




Verdrogings-
bestrijding



Knelpunt
wateroverlast

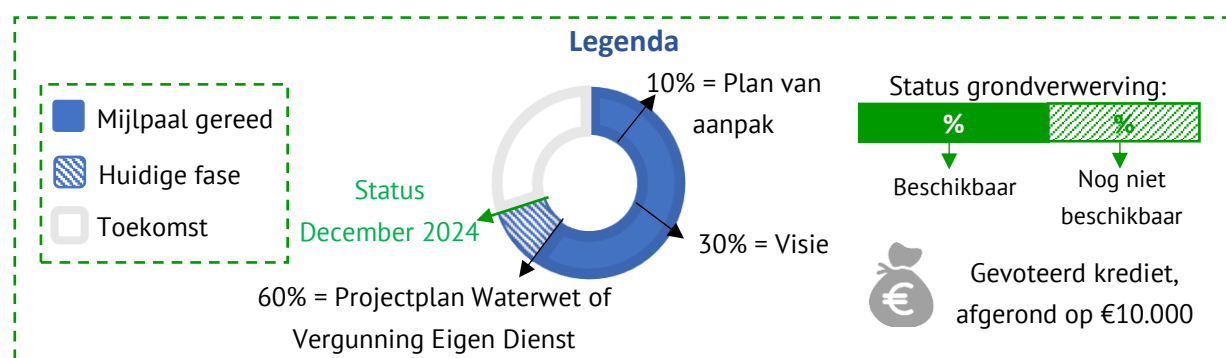


Overzicht mijlpalen en financiën per project:

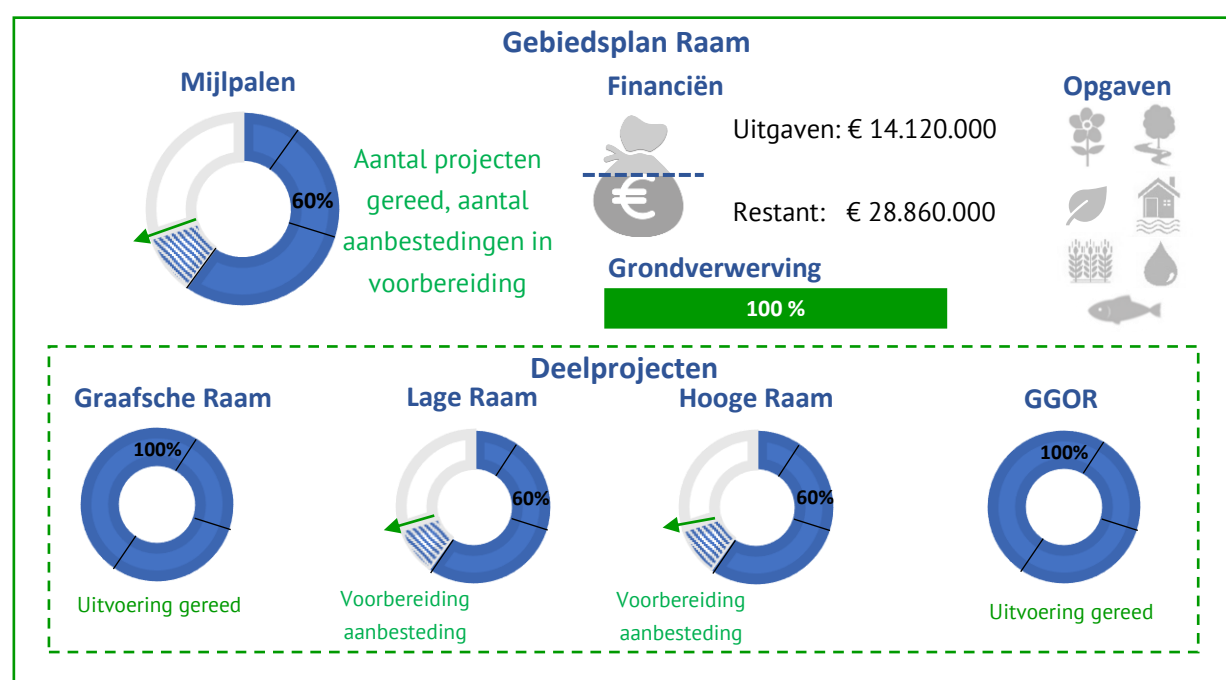

Programma Hoogwateraangepak Brabant-Oost (HoWaBo)

Mijlpalen



Voor 5 projecten
waar wij trekker
van zijn is de
verkenning
gestart

Financiën (voorbereidingskrediet)



Uitgaven: € 2.120.000

Restant: € 1.360.000

Grondverwerving


*Pas na visie beter zicht op mogelijke
grondverwerving*

Opgaven




Deelprojecten

Gemaal Crevecoeur




Voorlopig
ontwerp gereed

Baardwijkse Overlaat




Verkenning
alternatieven

Extra inlaat Engelermeer




Verkenning
alternatieven

Peilregulatie tussen Dommel en Aa



Verkenning
alternatieven

Bokhovense Polder




Verkenning
alternatieven

Aa-dal Zuid fase 1

Grotendeels
afgerond,
1 project
nog in
uitvoering

Mijlpalen



Financiën



Uitgaven: € 15.950.000

Restant: € 750.000

Grondverwerving


100 %

Opgaven




Deelprojecten

Beekdal- ontwikkeling Aa




Uitvoering gereed

Slievensse Loop




In uitvoering

EVZ Kleine Aa



Uitvoering gereed

Beekerloop




Uitvoering gereed

Integrale wateropgave Aa-dal Noord

Financiën: voorbereidingskrediet

Mijlpalen




Modellering en hydrologische doorrekening loopt



Uitgaven: € 440.000

Restant: € 170.000

Grondvererving




Opgaven




Deelprojecten

Eyckenlust (Lieshoutse Beemden)




Concept masterplan gereed

Erp




Grondvererving i.s.m. gemeente Meijerijstad

't Hurkske




Kansrijkheid uitvoering onderzoeken

Ham-Veghel & Aa-Broeken




Opstellen integraal gebiedsplan

Veghel aan de Aa




Integrale aanpak grondvererving

Kameren



Planuitwerking loopt

Heeswijk-Dinther




Integrale aanpak grondvererving

Natuurrealisatie en klimaatrobuust watersysteem Maashorst

Financiën: voorbereidingskrediet

Mijlpalen

Uitvoeren maatregelen antiverdroging



Uitgaven: € 84.000

Restant: € 550.000

Grondvererving




Opgaven




Deelprojecten

Grondvererving NNB






Verwervingsgesprekken lopen

Anti verdrogingsmaatregelen




Gefaseerde uitvoering

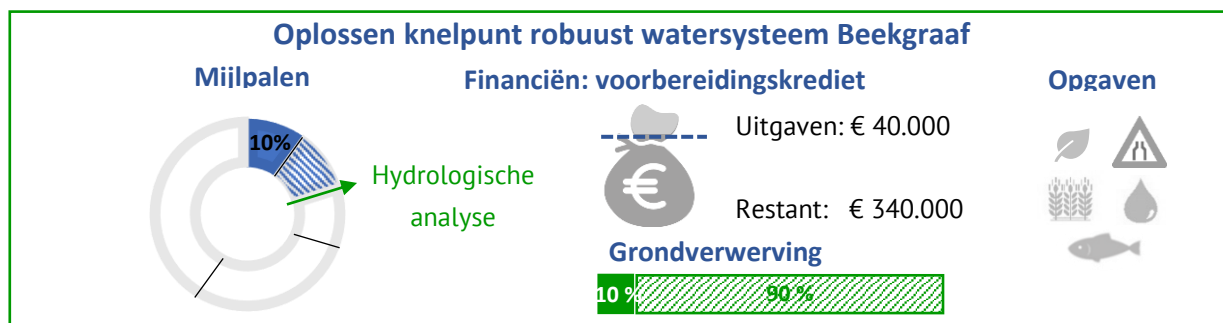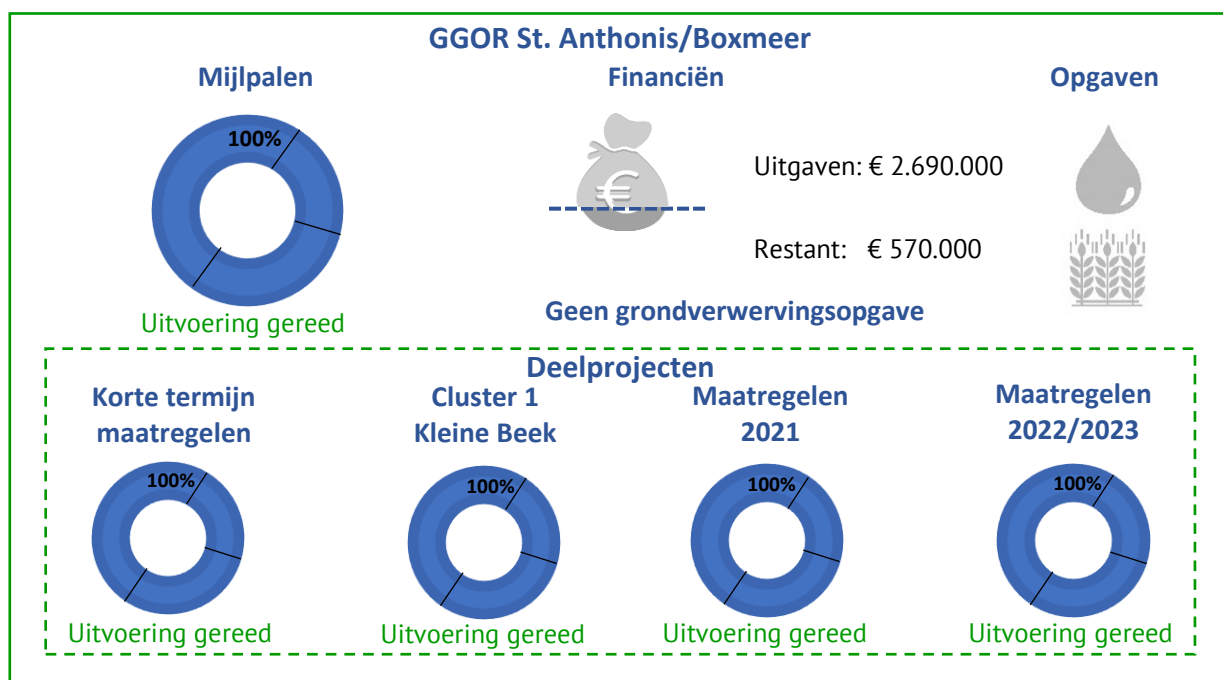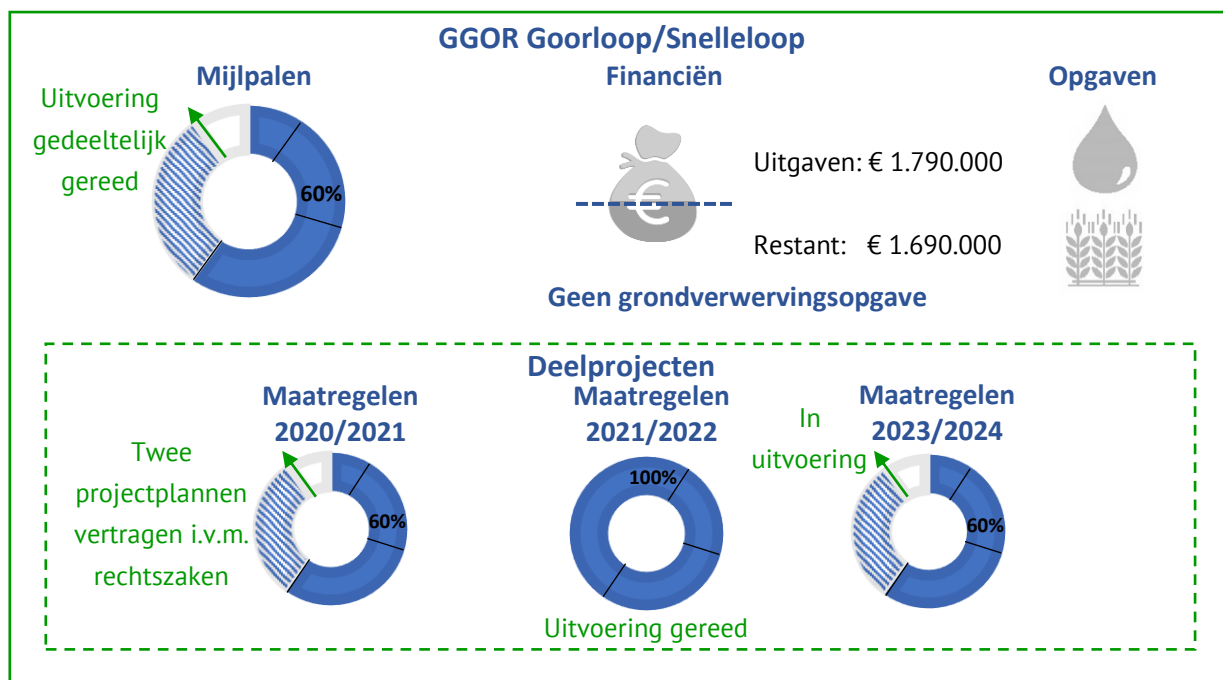

c

Uitvoeringsprogramma 't Gulden Land

Grotendeels
gereed



Financiën



Uitgaven: € 1.890.000

Restant: € 2.580.000


Grondvererving

100 %

Opgaven




**Natuurontwikkeling
Kop van Aarle-Rixtel**



Uitvoering gereed


Deelprojecten

Rondgang



In uitvoering


Bundertjes



Uitvoering gereed

Blauwe Poort Laarbeek Financiën (fase 2)

Mijlpalen



Aanbesteding fase 2 in voorbereiding



Uitgaven: € 1.730.000

Restant: € 8.390.000

Grondvererving (fase 2)


80 %

20 %

Opgaven




Fase 1



Uitvoering gereed


Deelprojecten

Fase 2



Voorbereiding aanbesteding


Fase 3



Nog niet gestart

Sint Jansbeek

Gefaseerde
uitvoering



Financiën



Uitgaven: € 3.110.000



Restant: € 4.650.000

Grondvererving

100 %

Opgaven



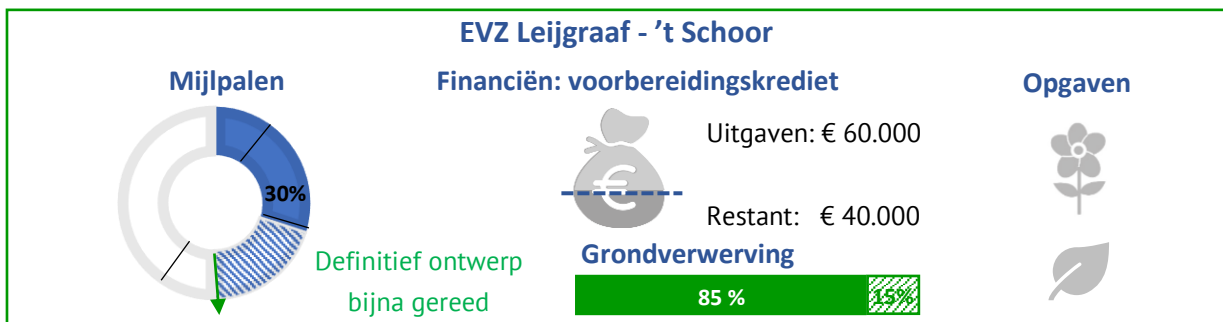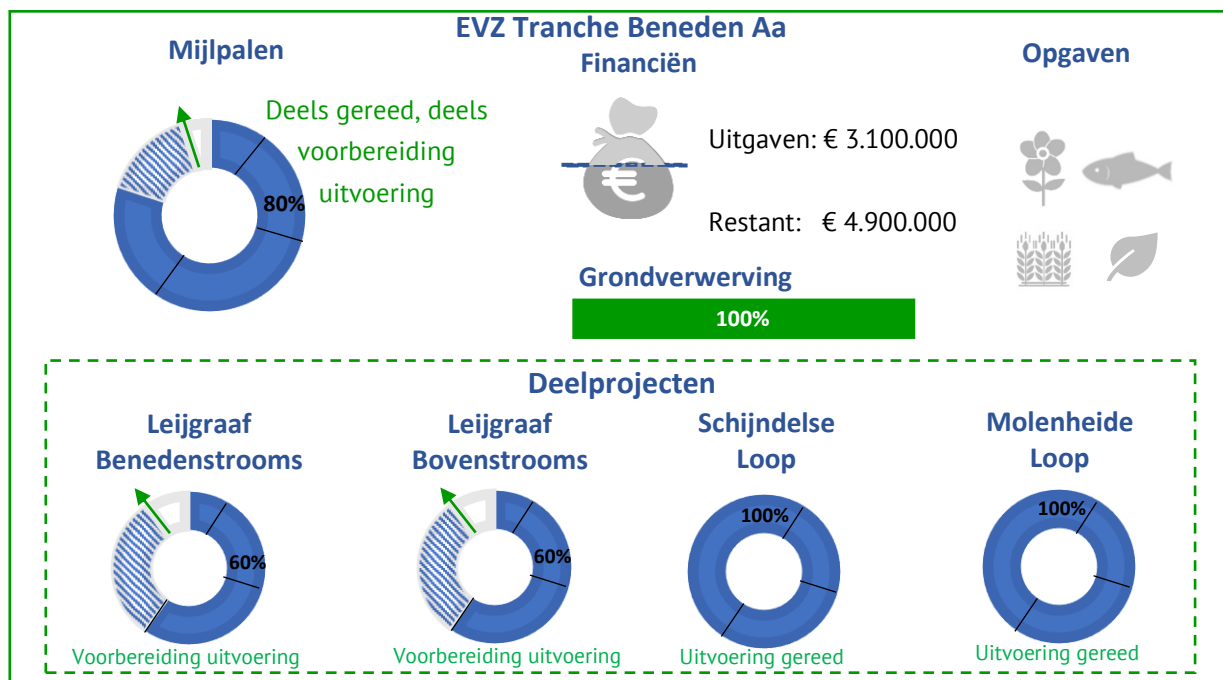

Status mijlpalen Zuiveren

Afdeling: Ontwerp & Realisatie

Onderstaande overzichten geven de status weer van de mijlpalen en financiën voor de financieel grootste projecten die een bijdrage leveren aan de volgende opgaven:




Schoon water:
RWZI's



Schoon water:
Rioolgemaal en transportleidingen



Schoon water:
Energie en innovatie

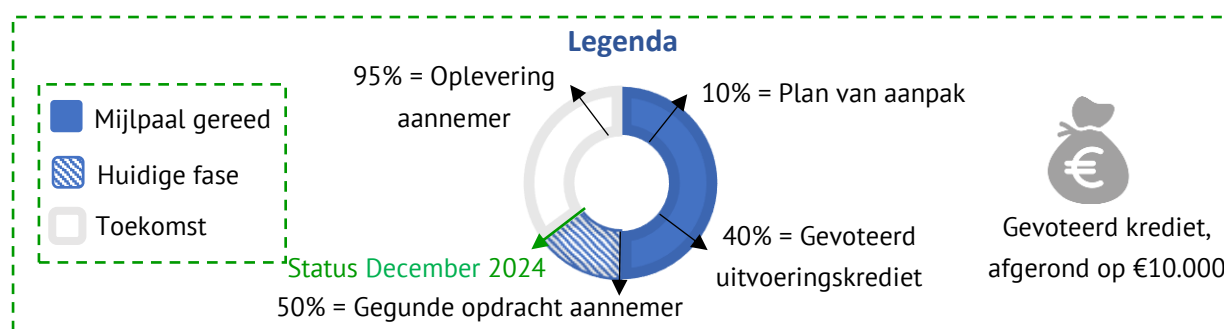


Overzicht mijlpalen en financiën per project:



Effluentverbetering RWZI Dinther

Mijlpalen



Financiën



Uitgaven: € 11.470.000


Restant: € 26.680.000

Opgave



Deelprojecten


Nutriënten



In voorbereidingsfase (bouwteam)


Demo medicijnresten

Opgeleverd met aannemer



Effluentverbetering RWZI Vinkel: kwaliteitsverbetering fosfor en medicijnresten

Mijlpalen



In voorbereidingsfase (bouwteam)

Financiën



Uitgaven: € 1.180.000

Restant: € 9.020.000


Opgave



Effluentverbetering rwzi Aarle Rixtel

Financiën: voorbereidingskrediet

Mijlpalen



Uitgaven: € 60.000


Restant: € 2.940.000

Opgave



Uitbreiding verwerkingscapaciteit RWZI Land van Cuijk

Mijlpalen



In uitvoering

Financiën



Uitgaven: € 18.650.000


Restant: € 50.850.000

Opgave



Uitbreiding slib- en gaslijn RWZI Den Bosch*

Mijlpalen



Project
gepauzeerd

Financiën



Uitgaven: € 3.720.000

Restant: € 1.780.000


Opgave



Grootschalige realisatie van zonneweides

Mijlpalen

Grotendeels
gereed



Financiën



Uitgaven: € 18.380.000


Restant: € 4.030.000

Opgave




Deelprojecten

Dinther




Gereed

Vinkel




Gereed

Aarle-Rixtel




Gereed

Asten




Fase 1 opgeleverd,
fase 2 in
initiatie-
fase

Oijen




Gereed

Land van Cuijk



Gereed


Den Bosch



Gereed

Datagestuurde waterketen: Poseidon

Mijlpalen



Gezamenlijk data-
platform met
gemeentes wordt
ingericht

Financiën



Uitgaven: € 660.000

Restant: € 2.790.000

Opgave

