



gemeente
Barneveld

Nr. 1061451

Collegevoorstel

Onderwerp:
evaluatie speelruimtebeleidsplan

Gevraagde beslissing:

1. Instemmen met de evaluatie uitvoering speelruimtebeleid en de presentatie ter informatie aan de raad aanbieden

Raad

- ☐ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:
☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Datum 7 november 2017

Steller: T.B. Albers

Afd: BOR-BEDRIJ

Aantal bijlagen 1

Afd.hoofd:

Portefeuillehouder

Openbaarheid

- Besluit (voorblad) openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispunt :
Groentje openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispunt :
Bijlagen openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, vermelden op bijlage

	Akkoord	Bespreken	Aantekeningen
Secretaris			
Burgemeester			
Wethouder A. de Kruijf			
Wethouder P.J.T. van Daalen			
Wethouder G.J. van den Hengel			
Wethouder D. J. Dorrestijn-Taal			

Beslissing burgemeester en wethouders :

21 NOV. 2017

Nummer op besluitenlijst:

47/03.

Conform advies 3 weth

1. Inleiding

Op 25 mei 2016 heeft de gemeenteraad het speelruimtebeleidsplan vastgesteld en het onderstaande amendement laten opnemen als beslispunt 4:

Het college informeert eenmaal per jaar de raad over de voortgang binnen het beleidsplan middels een nota in het vierde kwartaal van het jaar. In de nota wordt beschreven:

- de effecten van het beleid
- het communicatieverloop t.a.v. nieuwe projecten met de betrokken bewoners
- de financiën

In de bijgevoegde PowerPoint presentatie geven wij weer hoe het eerste jaar tot nu toe verlopen is.

2. Beoogd effect

a) Meetbaar effect

Het speelruimteplan zorgt voor een ander type speelruimte. Naast traditioneel spelen treedt een stuk vergroening op en zullen meer kinderen op jongere leeftijd in contact komen met groen/natuur. Speelplekken zijn meer landschappelijk ingericht dan alleen een aantal toestellen in een veilige ondergrond. Dit brengt meer speelwaarde met zich mee. Bewoners zien ook de waarde van informele speelruimte. Dit is ruimte waar kinderen spelen en geen toestellen staan. Dit kan zijn de straat, stoep of het pleintje of veldje voor de deur. Speelruimteplanning verloopt volgens beleid en is flexibel genoeg voor overleg met bewoners (kaders zijn duidelijk).

b) Maatschappelijk effect

Contact met de betrokken bewoners bij het aanpassen van de speelruimte is van cruciaal belang. Er is in deze fase gekozen voor hoogste participatietrede... zelf ontwerpen.

Op sommige plekken ontstaat onenigheid tussen bewoners met betrekking tot de inrichting, maar hierover wordt gesproken en helpt de gemeente om een concessie te vinden. Het betreft hier vaak oudere mensen die bang zijn voor overlast.

Rond de meeste speelplekken komen bewoners (weer) in contact en zijn mensen enthousiast en gaan meedenken. Zo zijn er op twee speelplekken toestellen blijven staan in het kader van inclusief spelen (kinderen met en zonder handicap).

Bewoners komen gezamenlijk op voor hun speelplek. De gemeente lijkt daarbij soms op een 'gezamenlijke vijand' dat bindt de mensen. Mooi om te zien dat er dan in overleggen een band groeit tussen gemeente en omwonenden. Op sommige speelplekken bieden inwoners aan om te helpen met onderhoud van de zandbak.

2. Argumenten

1.1 De evaluatie geeft op een overzichtelijke manier informatie over de aanpak.

De evaluatie maakt inzichtelijk hoe de aanpak van het eerste jaar is geweest. De opzet van de aanbesteding. De wijze van participatie en communicatie. En leerpunten voor de aanpak van het volgende uitvoeringsjaar.

4. Kanttekeningen

De voorbereiding participatie en communicatie is gereed; de uitvoering (schep in de grond) van het eerste plan jaar moet nog plaatsvinden. Van de uitvoering wordt in de evaluatie van het laatste kwartaal van 2018 verlag gedaan.

5. Financiën

Aangezien de uitvoering nog moet starten is er geen zicht op de eindafrekening voor fase 2017. Echter wordt er gewerkt met taakstellende budgetten voor de contractanten. Hierdoor worden geen overschrijdingen verwacht.

6. Uitvoering

Planning:

Aanleg speelplaatsen van januari tot en met maart (1 april 2018 opleveringen daarna nog kleine puntjes hooguit).

Communicatie:

Huis aan huis brief over uitvoering en flyer in de week voor de start van de uitvoering. Vooruitlopend in november en december worden bomen gekapt en al wat werkzaamheden door eigen dienst uitgevoerd zoals verwijderen van kleine speeltoestellen.

Evaluatie/controle

Er heeft evaluatie plaatsgevonden van ontwerp en werkvoorbereidingstraject met de contractanten. We willen nog meer en intensiever samen het project oppakken als een bouwteam die samen optimale eruit haalt.

het

7. Bijlagen

- Evaluatie speelruimtebeleidsplan in een PowerPoint



Stand van zaken speelruimte

Evaluatie uitvoering fase 1 (aug 2016 – sep 2017)



Inleiding

De eerste jaarfase van de uitvoering van het speelruimteplan is bijna aan de uitvoering toe. Een bijzonder participatietraject heeft geresulteerd in bijna veertig ontwerpen voor speelplekken in Rootselaar-West, Norschoten en Zwartebroek. Binnenkort gaat de schop in de grond om deze plekken ook daadwerkelijk aan te leggen. In deze evaluatie blikken we terug op het proces en bekijken we wat we daaruit kunnen leren voor de volgende ronde.

Het was een bewogen jaarfase, waarbij we veel met bewoners hebben gepraat en natuurlijk met onze contractanten die het werk gaan uitvoeren. Samenwerken om zo te komen tot het optimum of, heel eerlijk, soms ook tot een concessie. Maar wel samen. Op naar 2018 tot 2021.





Onderwerpen

[Uitvoeringsplan](#)

[Aanbesteding](#)

[Participatie en ontwerp](#)

[Werk in uitvoering](#)

[Leerpunten](#)

[2018 en verder](#)





Uitvoeringsplan

Het uitvoeringsplan is opgesteld in het najaar van 2016. Hierin is de voorcalculatie van het project gemaakt en de prioritering van de wijken bepaald.

Per jaar worden een aantal wijken/kernen tegelijkertijd aangepakt. Zo kunnen we de communicatie en de uitvoering bundelen. Hierbij houden we rekening met de werkvoorraad.

- [Werken in jaarfasen](#)
- [Projectgroep](#)
- [Planningstabel](#)





Werken in jaarfasen

Iedere jaarfase worden vooraf de plekken die aan de beurt zijn bezocht. Zo worden de werkzaamheden bepaald. We kijken naar groen, verhardingen, meubilair, speeltoestellen, kinderaantallen, uit te voeren beleid, al bestaande bewonersvragen of wensen. Zo proberen we een plek voor circa 10 jaar weer naar ieders tevredenheid op te pakken en in te richten.

De plekkenlijst voor fase 2018 en het communicatieplan zijn in de maak. Ieder jaar worden circa 35 plekken aangepakt.





Projectgroep

Het project wordt uitgevoerd door een projectgroep. Hierin zit een projectleider, ontwerper, groenmedewerker, toezichthouder, beleidsbewaker, beheerder speelvoorzieningen en daarnaast de contractanten en soms [de Speeltuinbende](#).

De projectgroep vergadert waar nodig in een samenstelling die nodig is voor de betreffende projectfase. Een praktische insteek. De projectleider informeert de projectgroepleden en overige betrokkenen regelmatig door tussentijdse stand van zaken berichten te sturen.





Planning

jaar	Wijken/dorpen
2017	Norschoten, Rootselaar-west en Zwartebroek
2018	Centrum, De Koot, Oldenbarneveld, Rootselaar-Oost, Staatsliedenwijk, Veller en Vogelbuurt
2019	Voorthuizen en Kootwijkerbroek
2020	De Burgt
2021	De Lors, De Vaarst, De Valk, Vliegersveld, Garderen, Stroe, Blankenhoef en Terschuur

De planning is ook verwerkt in de digitale kaart op de [website](#) van gemeente Barneveld.





Aanbesteding

In het voorjaar van 2017 is er een raamovereenkomst gesloten met 4 contractanten voor de duur van het project (2017-2021). Hiervoor moest gezien de hoogte van het bedrag een Europese aanbesteding worden gedaan. Insteek bij de uitvraag waren lage selectie eisen zodat veel partijen konden inschrijven en voor het project zeer specifieke gunningseisen. Een verificatiegesprek was onderdeel van de gunning zodat we ook zeker wisten met wie we te maken zouden krijgen.

Ook voor de speelmarkt even zoeken naar hoe in te schrijven, want het was een andere aanbesteding dan gemiddeld op de markt.

- [Contractanten](#)
- [Werking bouwteam](#)






Contractanten

We hebben vier contractanten die creatief zijn, speelruimte kunnen ontwerpen, toestellen kunnen leveren en ondersteunen bij de participatie. Dit zijn:

- [Kompan](#)
- [Nijha](#)
- [Eibe](#)
- [HVR Speeltotaal](#)

In 2017 is een kennismakingsjaar en voeren ze allemaal een deel uit. Vanaf 2018 doen steeds 2 contractanten mee bij de uitvoering van de betreffende jaarfase om het werk wat meer te bundelen.

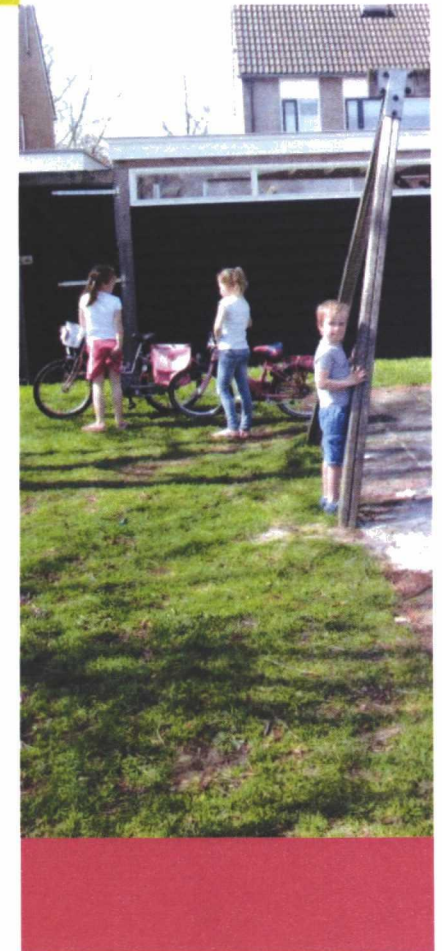




Werking bouwteam

In het bouwteam zit de projectgroep en de contractanten. Ieder najaar gaat het bouwteam om tafel om de afgelopen jaarfase te evalueren en de nieuwe jaarfase te plannen en een aanpak te kiezen. Op deze manier wordt de expertise van iedere bouwteamlid optimaal ingezet.

De projectgroep bewaakt de randvoorwaarden waarbinnen ontwerp en participatie plaatsvinden en wijst de speelplekken aan en uit te voeren maatregelen.

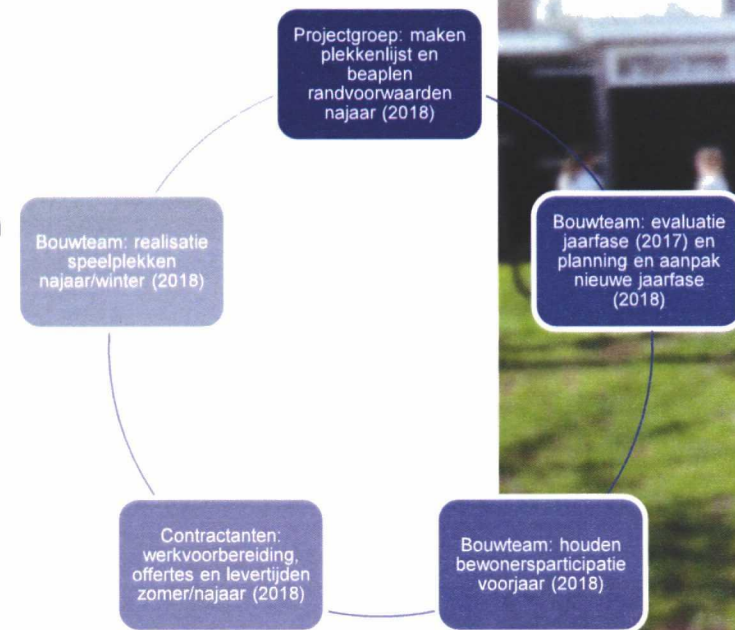



Participatie en ontwerp

Voor de eerste jaarfase is gekozen om de bewoners de gelegenheid te geven zelf speelplekken te ontwerpen. Een hoge mate van participatie en verantwoordelijkheid. Alle inwoners zijn hiervoor huis aan huis uitgenodigd. Op de eerste bijeenkomst zijn bewoners geïnformeerd over de visie en de aanpak voor hun wijk en konden bewoners kiezen tussen een intensief of een extensief participatietraject.

- [Communicatiestrategie](#)
- [Intensief traject](#)
- [Extensief traject en enquêtes](#)
- [Ontwerp](#)
- [De Speeltuinbende](#)





Communicatiestrategie

De jaarfasen worden ^{het} hele wijken of dorpen opgepakt. Zo kunnen we met de hele wijk in gesprek over de speelruimte. We stimuleren gesprek over speelbuurten in plaats van alleen de speelplek voor de deur. Oudere kinderen of (groot)ouders met kleine kinderen kunnen prima wat verder lopen naar een mooie, grote en uitdagende samenspeelplek.

Door kleinere plekken anders in te richten met minder speeltoestellen en deze investeringen te bundelen op de samenspeelplek kunnen er daar grotere en uitdagende toestellen worden geplaatst. De kleine plekjes blijven voor de kleine kinderen en voor kortere speelmomenten wel bestaan, maar minder 'zwaar' ingericht.





Intensief traject

De intensief betrokken bewoners hebben een ontwerples gekregen en konden toen thuis aan de slag. Op de navolgende bijeenkomst zijn samen ontwerpen gemaakt. Deze zijn aan de contractanten gegeven die een concept ontwerp hebben gemaakt. Dit concept ontwerp is besproken en vervolgens gepresenteerd op 14 juni aan de wijken.


Bijeenkomst 1: algemene informatieavond beleid en aanpak voor de wijk

Bijeenkomst 2: ontwerples

Bijeenkomst 3: ontwerpen samenvoegen tot wensbeeld

Bijeenkomst 4: bespreken concept ontwerp

Bijeenkomst 5: presenteren definitief ontwerp

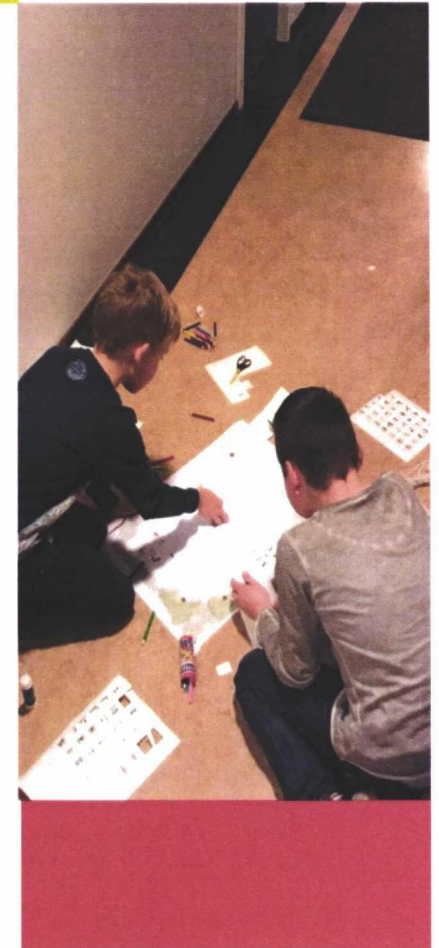



Extensief traject

Het extensieve traject bestond uit het bijwonen van de eerste bijeenkomst en vervolgens het bekijken van het eindontwerp op bijeenkomst 5. Sommige bewoners kwamen ook tussendoor nog wel kijken.

Door circa 125 bewoners jong en oud is een enquête ingevuld over de speelplekken. De resultaten zijn verwerkt in het ontwerp.

Welke speelprikkel zou je hier willen?





Ontwerp

De ontwerpen zijn gemaakt door de contractanten aan de hand van inrichtingsschetsen die samen met ruim 100 bewoners waren gemaakt.

Op 14 juni 2017 zijn de ontwerpen aan alle bewoners gepresenteerd tijdens festiviteiten voor de Nationale Buitenspeeldag op de school in Norschoten en op de Slotstraat. De ontwerpen kwamen tegelijkertijd [online ter inzage](#).

In het ontwerp is veel gewerkt met speelaanleidingen en speelgroen en minder met speeltoestellen. Dit was even wennen voor bewoners, maar de bewoners die de ontwerples hebben gevolgd zien ook de voordelen van minder toestellen. Zo houden ze veel ruimte over om zelf activiteiten te doen. Bovendien konden ze mooie grote toestellen uitkiezen voor de samenspeelplekken.






De Speeltuinbende

Om meer aandacht te genereren voor het samen spelen op de samenspeelplekken is de expertise van de Speeltuinbende ingeschakeld.

De Speeltuinbende is een 'bende' van kinderen die de speelruimte toetst op toegankelijkheid en geschiktheid voor samenspelen van kinderen met en zonder handicap. Ook geven ze tips voor het ontwerp.

Helaas heeft de Speeltuinbende nog weinig leden in Barneveld en zijn ook in jaarfase 2017 buiten één actief lid geen andere mensen lid geworden. We denken nog na over borging hiervan in de komende jaarfasen.






Werk in uitvoering

In de maanden november tot en met maart worden de speelplekken fase 2017 gerealiseerd. De uitvoering van bijna 40 speelplekken vergt grote coördinatie. Er gaan 4 contractanten aan de slag. Grond, verhardingen, speeltoestellen en meubilair moet van en naar speelplekken en de werf. De financiële afrekening vindt pas daarna plaats.

Bewoners worden geïnformeerd door publicaties op de gemeentepagina, in de krant, social media en www.barneveld.nl/spelen. Betrokken bewoners en direct omwonenden krijgen persoonlijk bericht over de uitvoering.

Voor het speelseizoen 2018 begint zijn de speelplekken klaar. Tijd voor feestelijke openingen rond Koningsdag!

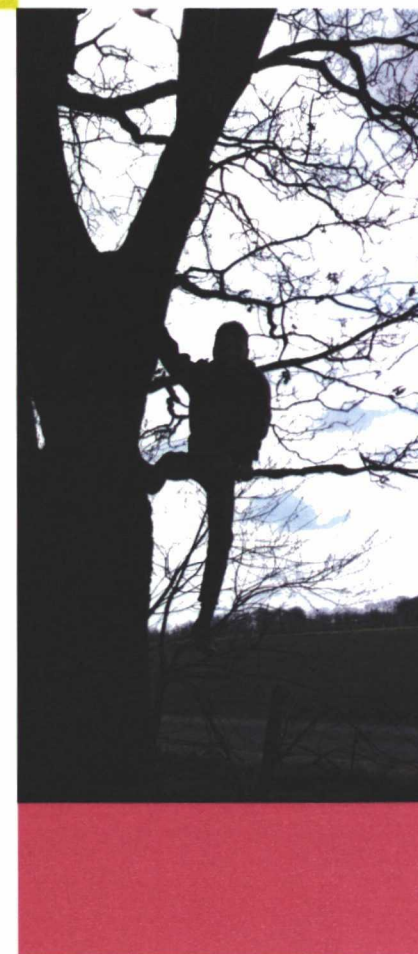




Leerpunten 1 van 3

In oktober en november wordt fase 2017 geëvalueerd met het bouwteam. De volgende punten zijn al als leerpunt naar voren gekomen:


- In de praktijk bleek dat bewoners kwamen en gingen buiten de trajecten om, wat soms voor veel ergernis zorgde voor zowel het bouwteam als de intensief betrokken bewoners. Herhaling van zetten lijkt bijna onmogelijk te voorkomen. Je kan bewoners immers niet verbieden om te komen of het ze kwalijk nemen als ze een keer niet kunnen.
- In de nieuwsbrief waren wel de speelplekken waar het om ging aangegeven maar niet dat al het openbare groen ook is in te zetten als speelruimte. Mensen die dachten niet betrokken te hoeven zijn wilden later toch meepraten. In de volgende uitnodiging komt dit explicieter te staan. Ook de kaart op de website moet aangepast of de toelichtende tekst erbij.

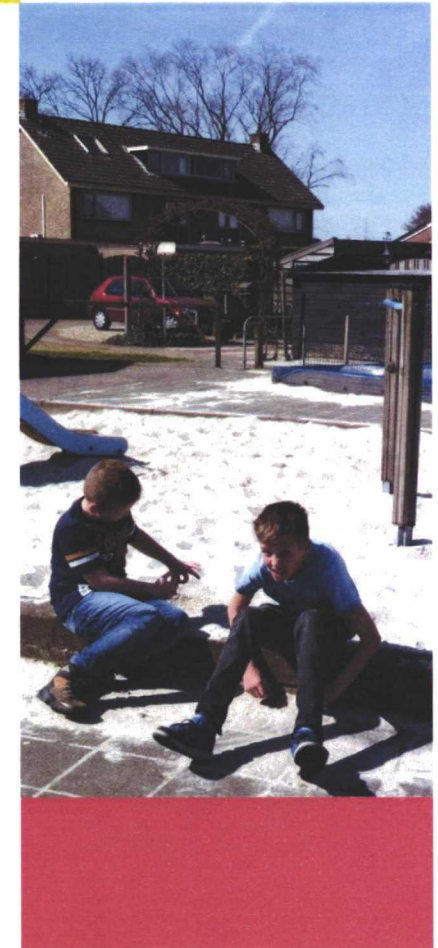



Leerpunten 2 van 3

- In fase 2017 liepen we vertraging op door vragen omtrent de aanbesteding. Dit was niet goed ingepland waardoor we wat moesten haasten en een extra communicatiestap kregen in het traject. Het bouwteam werd pas halverwege de participatie geformeerd. Volgend jaar hebben we dit probleem niet.
- De voorcalculatie is lager dan de offertes van de contractanten. Dit komt met name door het toevoegen van de groenrenovaties. Deze worden volgend jaar alleen meegenomen waar dit toegevoegde speelwaarde genereerd. De partners hadden de standardeisen met betrekking tot grondverbetering niet goed tussen de oren. Hierover worden nog gesprekken gevoerd, wat tot enige vertraging leidt in het uitvoeringstraject.

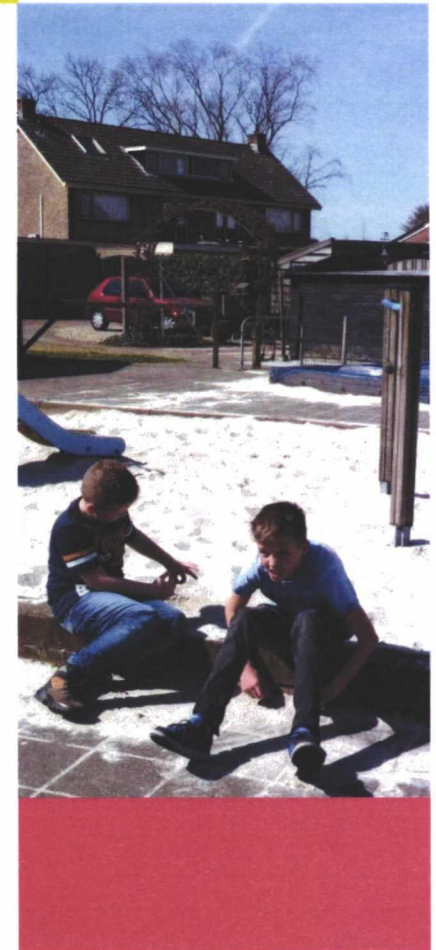




Leerpunten 3 van 3

- Er is gewerkt met 2 projectleiders naast elkaar en een groenadviseur vanuit de gemeente. Dit was voor de contractanten niet altijd even helder. Volgende fase is er 1 projectleider die interne communicatie ook doet.
- We hadden te maken met de participatiespagaat tussen:
 1. volwassen en kinderen
 2. omwonenden en verder weg wonende ouders
 3. bewoners en de Speeltuinbende/gemeente
 4. wensen bewoners en algemeen belang (beleid)

Het is onmogelijk om iedereen tevreden te houden. We maken nog duidelijker dat de speelbelangen van de kinderen het belangrijkste uitgangspunt vormen.

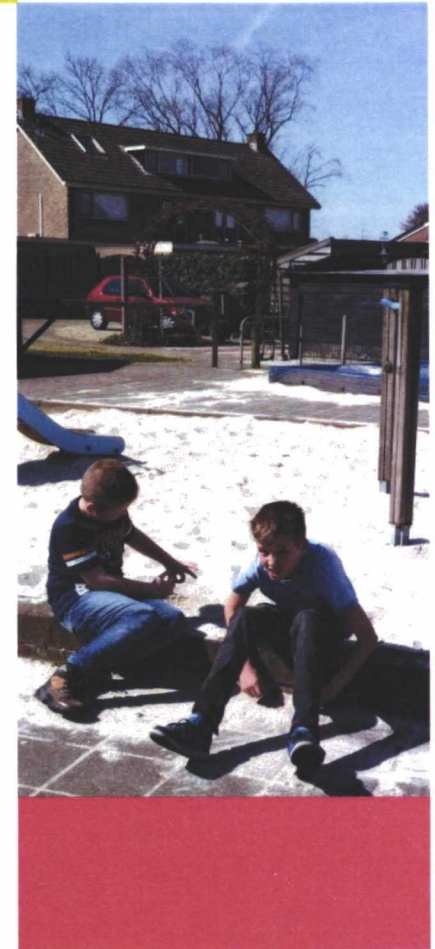



2018 en verder

Fase 2018 is al weer opgestart. De plekkenlijst wordt gemaakt en in november de aanpak bepaald inclusief de aanpak voor communicatie en participatie. Daarna zullen bewoners weer worden uitgenodigd mee te doen.

Naast het werk in de jaarfasen wordt via lopende projecten ook al gewerkt aan de invulling van bijvoorbeeld nieuwe speelplekken die later stonden gepland. Zo is er bijgedragen aan een openbaar toegankelijk schoolplein in De Burgt waar jeugd en jongeren nu al kunnen gaan sporten.

Daar waar kan proberen we kansen te benutten.

