



aanpak oostelijke
vechtplassen

Voortgangsrapportage 2021



Inhoudsopgave

1	Organisatie en draagvlak	6
2	Communicatie	10
3	Financiën	14
4	Status projecten	17
	Pijler 1: ontwikkelen vrijetijdslandschap	20
	Pijler 2: versterken ecologische waarden	40
	Pijler 3: transformatie recreatiesector	72
5	Organisatiekosten	84
	Bijlage	88
	Mutaties Nationaal Groenfonds rekening 2021	



Voorwoord



Beste lezer,

Na twee jaar treden we uit de schaduw van de pandemie. Strengere veiligheidsmaatregelen en een lang aanhoudende lockdown maakten ons werk niet eenvoudig. Tegelijkertijd raakten we bedreven in het online vergaderen en slaagden we er goed in met de omgeving in contact te blijven.

Mede daardoor kon het werken aan de uitvoering van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen gewoon doorgaan. Sterker nog, er is in 2021 veel werk verzet.

We zijn intussen vier jaar onderweg. De meeste projecten zijn opgestart, dat wil zeggen dat er verkenningen worden uitgevoerd, dat er plannen worden uitgewerkt voor besluitvorming en soms zelfs al voor uitvoering. En ja, ook de eerste resultaten zijn zichtbaar.

Met elkaar - en we hebben het dan over maar liefst 21 partners - maakten we in 2017 duidelijke afspraken over onze gezamenlijke doelen: het stimuleren van natuur, recreatie én de leefomgeving. Op basis van de in 2021 uitgevoerde evaluatie stel ik vast wat wij ons allemaal - stuk voor stuk - nog steeds betrokken voelen, met commitment naar en vertrouwen in elkaar. Wat mij betreft zetten we op die manier de komende zes jaar de samenwerking voort.

De vele projecten zijn ons allen even lief. Toch licht ik er een paar uit als voorbeeld, omdat ze laten zien hoe onze extra aandacht en inzet helpt bij het vinden van passende oplossingen.

Zo blijkt de baggeropgave echt een zoektocht. Want waar en hoe voeren we bagger op de juiste manier af, rekening houdend met de natuur en met wensen van de bewoners in en gebruikers van het gebied? Uiteindelijk biedt de aanleg van een tijdelijk depot in de polder Mijnden nu de oplossing. Daar is ruimte om de bagger op een verantwoorde manier te laten drogen en inklinken, opdat we het later in het proces makkelijker kunnen verwerken.



Dat de realiteit soms weerbarstig kan zijn is geen nieuws. Toch is het ons gelukt om een forse uitdaging het hoofd te bieden. Op de vraag of we nu wel of niet moesten investeren in vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, staakten de stemmen telkens weer.

Na rijp beraad en de inzet van een extern en onafhankelijk adviseur, besloten we samen dit project uit het gebiedsakkoord te halen. In plaats daarvan spannen wij ons nu in om alternatieve projecten op te starten die hetzelfde doel nastreven: het stimuleren van de watersportsector in het Loosdrechts Plassengebied.

De evaluatie laat ook zien dat we binnen het gebiedsakkoord tegen een aantal praktische zaken aanlopen zoals de beperkte financiële middelen, beperkte capaciteit en het ontbreken van middelen om beloftevolle verkenningen tot uitvoering te brengen. In 2021 hebben we de eerste stappen gezet om deze kwesties duurzaam op te lossen.

De voorstellen zijn de opmaat voor het herzien van een aantal passages in het gebiedsakkoord en voor een grondige actualisatie van uitvoeringsprogramma. Beide documenten zullen in 2022 hun beslag krijgen. Ook het aanpassen van de governance, het proces van besluitvorming, nemen we daarbij mee.

Conform afspraken beschikken we als programma intussen over een eigentijdse huisstijl inclusief bijbehorende zelfstandige website, waardoor we herkenbaar en vindbaar zijn voor de vele betrokkenen en we iedereen van de juiste informatie kunnen voorzien.

En als kroon op het werk slaagden we erin om - tussen twee lockdowns door - in het najaar van 2021 een fysieke informatiemarkt te organiseren waar alle actieve projecten zich presenteerden. Een kleine 200 bezoekers maakten gebruik van de gelegenheid om hun vragen te stellen en meningen mee te geven.

Ik kijk uit naar het werk dat we ook komende jaar weer met elkaar gaan verzetten. Zo langzamerhand gaan we echt de vruchten plukken!

Met opgewekte groet,
Cees Loggen,

*voorzitter van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen
gedeputeerde Ruimtelijke ordening en water in de provincie Noord-Holland*

Voortgang in vogelvlucht

2021




Overzicht budget en uitgaven

De uitgaven van de afgelopen jaren (tot 31 dec 2021) zijn als volgt verdeeld:

Uitgaven per programma onderdeel in procenten ten opzichte van herzien budget (inclusief absoluut restant)


Totaal beschikbaar budget:

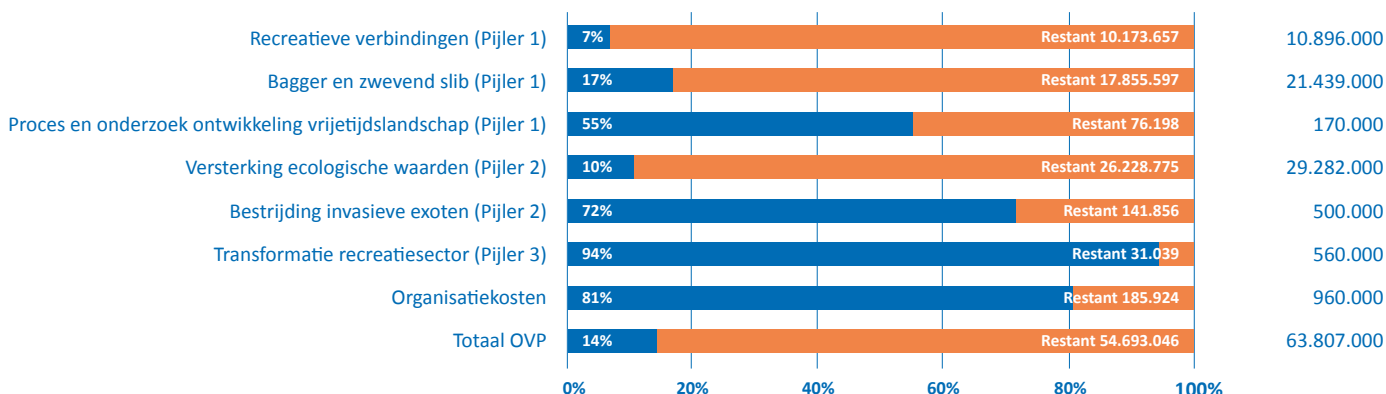


Communicatie/website in 2021



Status projecten

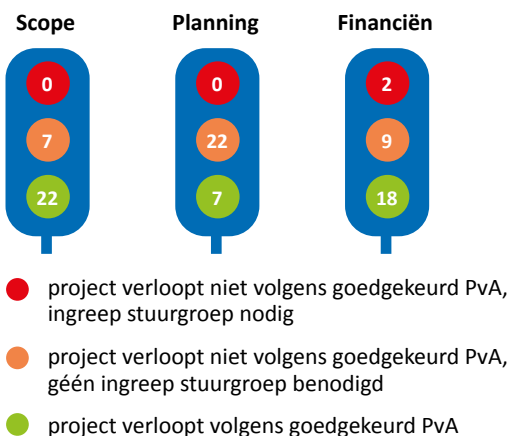

Fasering lopende (deel)projecten



1

Organisatie en draagvlak





De uitvoering van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen loopt intussen vier jaar. De organisatie bestaat primair uit de stuurgroep, de regiegroep en de projectleiders. De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de betrokken partijen: samen zijn zij eind-verantwoordelijk voor het behalen van de programmadoelstellingen. De stuurgroep is daarnaast ook opdrachtgever voor de programmamanager. De programmamanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma, geeft leiding aan het programmabureau en zit de regiegroep voor. De projectleiders rapporteren via de regiegroep aan de stuurgroep.

Het programma

Het jaar 2021 stond in het teken van het voortzetten van lopende projecten, het opstarten van nieuwe projecten en het evalueren van de vier jaar waarin het gebiedsakkoord nu in uitvoering is. In het afgelopen jaar heeft een grondige tussentijdse evaluatie plaatsgevonden en spraken regie- en stuurgroep uitgebreid over de gewenste en noodzakelijke aanpassingen wat betreft inhoud en organisatie van het gebiedsakkoord.

Voortgang in de projecten

In hoofdstuk 4 vindt u een gedetailleerde beschrijving van de voortgang van de individuele projecten. Voor een aantal lopende projecten heeft de stuurgroep belangrijke besluiten genomen: het vinden van een locatie voor een baggerdepot bij Polder Mijnden was een doorbraak bij de baggeropgave (project 1.7). Daarnaast besloot de stuurgroep de mogelijkheden voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal (project 1.3) niet verder te onderzoeken maar in plaats daarvan alternatieve watersportprojecten te verkennen.

Mutual Gains Approach

Binnen het programma wordt gewerkt met de Mutual Gains Approach (MGA). Dit is een aanpak waarbij partijen vanuit gezamenlijke belangen naar oplossingen zoeken en niet vanuit meningen. Hierdoor ontstaat meer draagvlak. De afspraken die in het gebiedsakkoord zijn vastgelegd vragen om een coöperatieve houding en het vermogen om over het eigen belang heen te stappen en te werken aan gezamenlijke doelen. Elk jaar wordt zowel op programma- als op projectniveau aandacht besteed aan de MGA-aanpak.

Capaciteit en middelen

Net als vorig jaar blijft de capaciteit bij veel partijen een uitdaging. Het grote aantal projecten vraagt om forse personele inzet van partijen. Het gaat om het lezen van stukken, meedoen in projectgroepen, of het trekken van projecten. Niet alleen de overheden kampen met capaciteitstekorten, ook andere partijen binnen het gebiedsakkoord lopen hier tegenaan. Betrokkenen uit de bewoners- en/of belangengroepen verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis, vaak naast een reguliere baan. De beperkte capaciteit binnen het gebiedsakkoord heeft effect op de kwaliteit en planning van de projecten.

Naast de beperkte menskracht, bleek afgelopen jaar ook dat de financiële middelen niet altijd even ruim waren ingeschat. De organisatiekosten, communicatiemiddelen en kosten voor monitoring waren niet of onvoldoende gedekt. Verder liep de inflatie (nog meer) op, moest er over projecten meer BTW betaald te moeten worden dan tevoren ingeschat en werd bij een aantal projecten op middelen gerekend die niet beschikbaar bleken. Zo rekenden projectleiders bijvoorbeeld op een financiële bijdrage vanuit de private sector, terwijl afgesproken was dat zij enkel een dienst zou verlenen (en geen financiële bijdrage). Tenslotte is voor een aantal projecten enkel een verkenning geraamd, en is er binnen het gebiedsakkoord geen budget om degelijke verkenningen door te zetten naar realisatie.



Dit komt ook omdat er op een grotere inzet vanuit de private sector gerekend werd bij het verder brengen van initiatieven. Deze inzet blijft achter bij de verwachtingen.

Tussenevaluatie

Bij het sluiten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen in 2017 is afgesproken om tussentijds te evalueren over de voortgang. Adviesbureau Arcadis heeft deze evaluatie in de eerste helft van 2021 uitgevoerd. Centrale vraag daarbij was: hoe staat het programma er procesmatig voor, zijn er aanpassingen nodig en zo ja, welke dan? Bij het beantwoorden van deze vragen zijn alle betrokken partijen op ambtelijk en bestuurlijk niveau, de projectleiders en belanghebbenden uit het gebied gevraagd naar hun ervaringen en inzichten.

De evaluatie leverde aanbevelingen op die betrekking hebben op het programmamanagement, communicatie- en omgevingsmanagement, governance in relatie tot de Mutual Gains Approach en de financiën. Op 30 juni 2021 besloot de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen om aan de slag te gaan met deze aanbevelingen door ze uit te (laten) werken tot concrete acties.

Voorstel herziening inhoud en organisatie, draagvlak

De opdracht van de stuurgroep om aan de slag te gaan met de tussentijdse evaluatie van Arcadis en het vinden van oplossingen voor de beperkte capaciteit en financiële middelen, leidde tot het voorstel voor een herziening van inhoud en organisatie van het gebiedsakkoord. Een kernteam, bestaande uit de ambtelijke vertegenwoordiging van de meest betrokken overheidspartijen, heeft zich afgelopen najaar ingezet om deze herijking concreet te maken. Het voorstel is in november en december 2021 uitgebreid besproken met de regiegroep Oostelijke Vechtplassen. In gezamenlijkheid is gesproken over de knelpunten waar partijen mee kampen en waar mogelijke oplossingen zouden kunnen liggen.

Draagvlak

Uit deze gesprekken blijkt dat partijen zich nog altijd erg betrokken en verantwoordelijk voelen voor de uitvoering van het gebiedsakkoord en zich ook willen blijven inzetten. Het behoud van vertrouwen in elkaar vraagt aandacht en men is zich ervan bewust dat dit inzet vereist. Het toetreden van de bewonersfederatie wordt als zeer waardevol ervaren, al blijft het wel een aandachtspunt hoe de overige bewoners en belanghebbenden aangehaakt blijven. De vele projecten die in één bepaald deelgebied kunnen spelen maakt het lastig voor inwoners het overzicht en onderling verband te blijven zien. Deze constatering heeft er ook toe geleid om vanuit het programma meer aandacht te besteden aan omgevingsmanagement.

Organisatie

Om tegemoet te komen aan de wens van de regie- en stuurgroep om de stukkenstroom te beperken, is er voorgesteld met een mandaatregeling te gaan werken. De programmamanager krijgt dan het mandaat om stukken te accorderen, zodat de projectleider verder kan. Het gaat daarbij alleen om stukken die in lijn zijn met het reeds vastgestelde uitvoeringsprogramma. De regie- en stuurgroep krijgen deze stukken vervolgens ter kennisname toegestuurd. Uit de evaluatie en de verschillende gesprekken kwam ook naar voren dat het programmabureau anders opgebouwd kon worden. In het voorstel is meer aandacht uitgegaan naar het structureel inbouwen van een projectbeheerser, communicatiemanager en omgevingsmanager (in het voorstel aangeduid als gebiedscoördinator).

Financiering

Omdat partijen geen extra financiering konden toezeggen is gezocht naar mogelijkheden om de tekorten te dekken binnen het bestaande en reeds toegezegde budget van het gebiedsakkoord. De regiegroep zocht naar bijdragen voor het versterken van het programmamanagement en het dekken van nog ongedekte posten. De regiegroep bekeek alle projecten afzonderlijk en toonde zich flexibel en ambitieus bij het maken van keuzes.



De voorgestelde oplossing zorgt er op dit moment voor dat het niet nodig is het ambitieniveau van de projecten naar beneden bij te stellen. Het voorstel voor herziening wordt begin 2022 in de stuurgroep behandeld. Bij een positief besluit is het streven om in het najaar van 2022 het uitvoeringsprogramma 2.0 vast te stellen.

Governance

Begin 2021 ontstond een geschil over een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal (project 1.3). De partijen konden het niet eens worden over het wel of niet doen van verder onderzoek naar de haalbaarheid van genoemde vaarverbinding. In het gebiedsakkoord is in artikel 13 voorzien in een situatie waarbij de stemmen staken: het inwinnen van onafhankelijk niet-bindend advies moet in zo'n geval duidelijkheid geven hoe met het geschil dient te worden omgegaan. Het advies dat in deze kwestie, na diverse gesprekken met de betrokken partijen, door onafhankelijk adviseur Bart Krol werd opgesteld, leidde tot het besluit het project niet door te zetten. In plaats daarvan besloot de stuurgroep de resterende financiële middelen beschikbaar te stellen voor het uitwerken en uitvoeren van alternatieve projecten die eveneens kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de waterrecreatiesector.

Het besluitvormingsproces en de inzet van de huidige geschillenregeling leidde tot onvrede bij de betrokken partijen. De stuurgroep heeft Bart Krol vervolgens gevraagd mee te denken over een andere, eenvoudiger en passende omgang met geschillen. Een regeling waarbij unanimitéit nog altijd het streven is maar niet langer absolute voorwaarde voor voortgang. De partners ervaren de tot nu toe gehanteerde Mutual Gains Approach als een groot goed maar vinden het niet wenselijk dat één partij de voortgang van een project tegen kan houden. De stuurgroep sprak in december 2021 voor het eerst over deze kwestie en hoopt in 2022 te besluiten over een wijziging en deze op te nemen bij de actualisatie van het gebiedsakkoord.



Communicatie





De communicatiewerkgroep heeft in 2021 op project- én op programmaniveau belangrijke vorderingen gemaakt als het gaat om het stroomlijnen van de communicatie. Het uitvoeren van de door de stuurgroep vastgestelde Communicatiestrategie 2020-2022 ligt daardoor goed op schema.

Projectcommunicatie

Ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen zijn er duidelijke stappen gezet om de betrokkenheid van de omgeving (lees: bewoners, grondeigenaren, ondernemers, gebruikers en andere belanghebbenden) bij de diverse projecten te vergroten. Fysieke bijeenkomsten zijn waar mogelijk vervangen door online werksessies, enquêtes en andere digitale werkvormen waarbij wensen, reacties en suggesties vanuit de omgeving konden worden opgehaald. Opmerkelijk gevolg van deze gedwongen omslag naar digitale communicatie is dat een aantal bijeenkomsten bovengemiddeld goed bezocht werd.

Alternatief voor de fysieke informatiebijeenkomsten was het wekelijkse spreekuur gedurende de zomermaanden in het pop-up havenkantoor in de Porseleinhaven. Belangstellenden en belanghebbenden waren elke woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur welkom voor vragen over de projecten in voorbereiding en in uitvoering. Het spreekuur werd via website, nieuwsbrief, gemeenterubriek en bewonersbrieven kenbaar gemaakt.

Interactieve processen

Een voorbeeld hiervan is het opstellen van een gezamenlijk toekomstbeeld voor recreatie in het Loosdrechts Plasseengebied (als onderdeel van project 3.3) waarbij diverse partners en ondernemers erin slaagden samen een stip op de horizon te zetten. Dit interactieve proces met meerdere workshops en digitale bijeenkomsten, ingericht en uitgevoerd door Bureau Buhrs, heeft de reeds in 2020 ingezette lijn voor meer participatie goed op de rit gezet.

Ook bij het opstellen van het plan van aanpak voor het verbeteren van de leefomgeving voor moerasvogels (project 2.4) zijn omwonenden en belangenorganisaties meerdere keren actief uitgenodigd om mee te denken over de maatregelen en de gebieden waar deze kunnen worden uitgevoerd.

Bij de zeven deelgebieden die zijn aangewezen voor het ontwikkelen van nieuwe natuur (project 2.1) wordt bij de start van elk deelplan het niveau van participatie bepaald en verwerkt in de procesplannen. Zo hebben de verenigde grondeigenaren in Weersloot zelf een schetsplan uitgewerkt, gericht op de gronden van hun leden. In Kortenhoef Oost is op verzoek van grondeigenaren een second opinion opgeleverd en in de Ster van Loosdrecht hebben de eigenaren hun eerdere gebiedsaanbod in 2021 geactualiseerd met voorstellen voor natuurontwikkeling via zelfrealisatie.

Bij het bestrijden van cabomba zijn bewoners maar ook watersporters en dagtoeristen actief betrokken in de uitvoering. Naast overleg en samenwerking met de Vereniging samen cabomba aanpakken (VSCA) zijn er (via sluiswachters, jachthavens en personeel havenkantoortje) flyers en stickers verspreid met instructies over het verwijderen van de exoot.

In de Kievitsbuurten is in december 2021 het eerste grote project in uitvoering gegaan: het duurzaam herstellen van het legakkerlandschap (project 1.8). Het betreft werkzaamheden ter voorbereiding van zes pilots waarmee onderzocht wordt op welke manier de legakkers in dit gebied het best hersteld kunnen worden. Om bekendheid te geven aan deze uitvoerende werkzaamheden is er een bouwboard-in-programmastijl ontwikkeld.



Hetzelfde format zal ook gebruikt worden bij de Loosdrechtse Plassen als eind 2022 het baggeren van start gaat. Zo proberen we in het hele gebied dezelfde uitstraling neer te zetten als het gaat om uitvoerende werkzaamheden in het kader van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

Meer regie door stroomlijnen proces

Om te zorgen dat er op projectniveau een herkenbaar communicatiebeleid ontstaat waar bewoners en belanghebbenden op kunnen bouwen en vertrouwen, heeft de communicatiewerkgroep in 2021 gewerkt aan een 'manier van werken' met een aantal basisprincipes in combinatie met maatwerk. Deze manier van werken is bij bepaalde projecten getoetst en wordt in 2022 vastgelegd in een soort 'handleiding'.

De communicatiewerkgroep is in 2021 negen keer (digitaal) bijeengekomen, afgestemd op het ritme van regie- en stuurgroep. Het onderwerp communicatie bij besluitvorming staat standaard op de agenda en wordt inhoudelijk besproken aan de hand van de communicatieparagrafen in de oplegnotities.

Berichtgeving

Na elke reguliere stuurgroepvergadering is een nieuwsbericht online geplaatst met de belangrijkste besluiten op een rij. Voor besluiten die extra toelichting of aandacht verdienen, zijn direct aansluitend aparte nieuwsberichten geplaatst. In 2021 zijn er 6 digitale nieuwsbrieven verstuurd met daarin veel aandacht voor de voortgang in de individuele projecten. Het mailbestand telde op 31 december 715 abonnees.

We hebben in de zomer van 2021 accounts aangemaakt op Twitter (eind 2021: 26 volgers), Facebook (eind 2021: 23 volgers) en Instagram (eind 2021: 21 volgers). Er zijn in de tweede helft van 2021 ca. 15 individuele berichten geplaatst op genoemde accounts. Het vergroten van ons bereik op sociale media is een speerpunt voor 2022.

Programmacommunicatie

Conform eerdere besluitvorming is in februari 2021 een communicatiemanager aangetrokken voor communicatie en woordvoering op programmaniveau. In nauwe samenwerking met de communicatiewerkgroep is vervolgens een overkoepelende programmastijl ontwikkeld en geïmplementeerd, inclusief een zelfstandige website (www.vechtplassen.nl) en werd op 12 oktober 2021 (tussen twee lockdowns door) een algemene informatiemarkt georganiseerd.

Programmastijl en gezamenlijke website

Het tweede kwartaal van 2021 werkte de communicatiewerkgroep volgens een strak geleid proces aan het ontwikkelen van een zelfstandige gezamenlijke programmastijl. Pier 19 uit Utrecht kreeg de opdracht - na aanbesteding - om op basis van een zorgvuldige briefing een programmastijl te ontwerpen waar alle 21 partners zich in konden vinden.

Op 30 juni 2021 stemde de stuurgroep in met een aangepaste naam (Aanpak Oostelijke Vechtplassen) en logo.



In de weken daarna werd de programmastijl geïmplementeerd. Door het beschikbaar stellen van een stijlgids kunnen projectpartners ook zelf middelen in de gezamenlijke stijl ontwikkelen.



De zomerperiode werd uitgetrokken voor het bouwen van een zelfstandige website. Het laatste kwartaal van 2021 werd de content (tekst en beeld) toegevoegd. Op de nieuwe website komt alle actuele informatie over het programma samen, uitgesplitst in de drie pijlers en de projecten die daarbij horen. Hier wordt duidelijk uitgelegd wat de meerwaarde van het gebiedsakkoord is, waarom de investeringen nodig zijn en wat de individuele bewoners en belanghebbenden eraan hebben.


Aanbevelingen uit de tussentijdse evaluatie

Op basis van de aanbevelingen die Arcadis deed naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie, werkte de communicatiewerkgroep in het najaar van 2021 aan een actieplan voor imagebuilding en ambassadeurschap. Nu de communicatiemiddelen op orde zijn, is het eenvoudiger gericht toe te werken naar een beter imago (publiek en pers) en het programma te positioneren als inspirerend voorbeeld van een complexe samenwerking (vakwereld).

Met het aanstellen van ambassadeurs die het programma (op onderdelen of in zijn geheel) een warm hart toedragen, wordt het mogelijk de Aanpak Oostelijke Vechtplassen ook dieper in de Gooise samenleving in een positief daglicht plaatsen. Genoemde plannen zijn ondergebracht in het *Voorstel voor herziening inhoud en organisatie gebiedsakkoord OVP* dat begin 2022 aan de stuurgroep wordt voorgelegd.

12 oktober: algemene informatiemarkt

De communicatiewerkgroep benutte de korte periode tussen de twee lockdowns om een grote informatiemarkt te organiseren waarbij maar liefst 17 actieve projecten werden gepresenteerd aan publiek en pers. Zo'n 200 belangstellenden liepen binnen tussen 17.00 en 21.00 uur bij Ottenhome, dat voor de gelegenheid was omgetoverd tot een marktplaats met informatiekramen, beurswanden, flatscreens, panelen. Naast projectleiders waren vanuit het programma ook ecologen, inhoudelijk deskundigen en omgevingsmanagers aanwezig. Alle gepresenteerde middelen waren vormgegeven in de nieuwe programmastijl. Dit zorgde voor een sterke uitstraling van samenhang en gezamenlijkheid. De markt werd goed gewaardeerd door de bezoekers en staat ook voor de komende jaren op het programma.

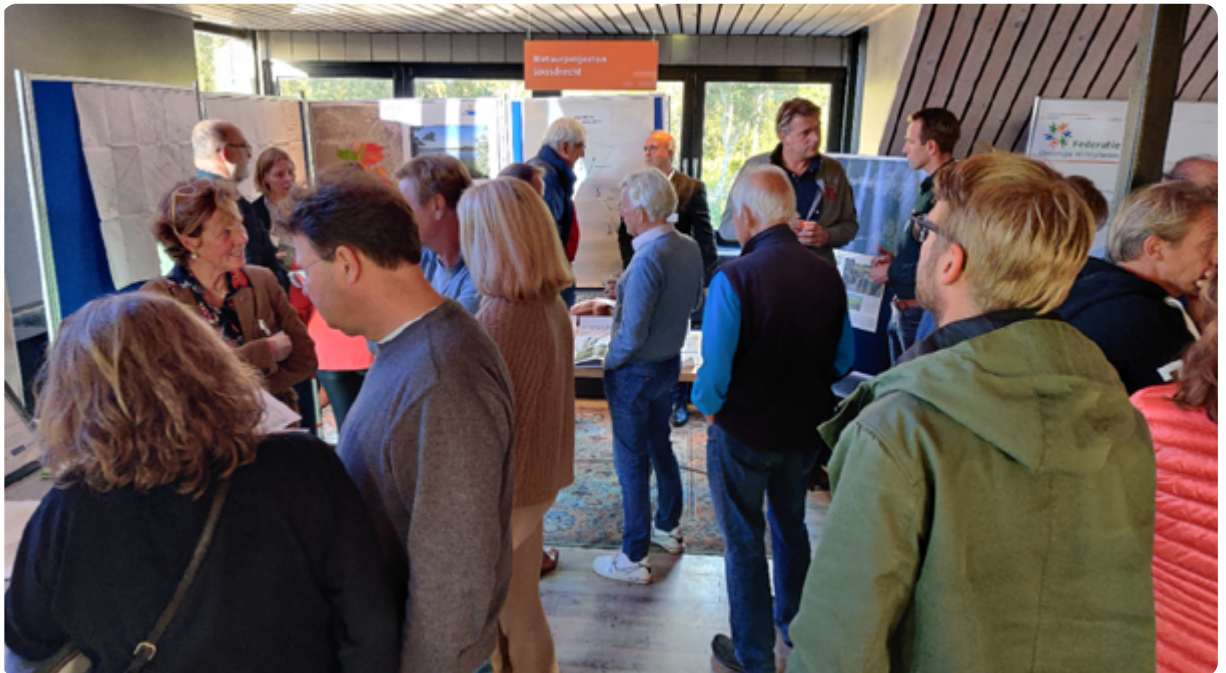

Financiën





Vier jaar na het sluiten van het akkoord (2017) zijn alle 23 hoofdprojecten gestart, net als het merendeel van de ca. 70 deelprojecten. Er zijn deelprojecten bijgekomen of vervangen en er zijn deelprojecten afgefallen, samengevoegd of afgerond. Dit maakt een herschikking noodzakelijk, inclusief een overzicht van de actuele financiering (waarbij we van de gelegenheid gebruik maken om ongedekte posten uit het programma te halen).

Vier jaar na het sluiten van het akkoord (2017) zijn alle 23 hoofdprojecten gestart, net als het merendeel van de ca. 70 deelprojecten. Er zijn deelprojecten bijgekomen of vervangen en er zijn deelprojecten afgefallen, samengevoegd of afgerond. Dit maakt een herschikking noodzakelijk, inclusief een overzicht van de actuele financiering (waarbij we van de gelegenheid gebruik maken om ongedekte posten uit het programma te halen).

In het huidige uitvoeringsprogramma is uitgegaan van een kostenraming van ruim € 77 miljoen, waarvan € 62 miljoen financieel is gedekt. Omdat voor diverse projecten extra financiering is verkregen, komen we qua dekking uit op ruim € 68 miljoen.

De stuurgroep heeft intussen zo'n € 30 miljoen aan budget goedgekeurd en vrijgegeven. Met een bedrag van € 9,1 (voorlopig cijfer) zijn de totale uitgaven beperkt gebleven. Dit komt omdat de meeste projecten nog in de voorbereidingsfase verkeren.

budget (in miljoenen euro's):	
raming uitvoeringsprogramma	77,2
dekking uitvoeringsprogramma	62,0
extra middelen	6,0
totaal huidige dekking	68,0
uitgegeven	9,1
beschikbaar restbudget	58,9

Kostenontwikkeling

Programmabreed komen de kosten in 2021 uit op een totaal van € 3 miljoen tegenover een prognose van € 4,1 miljoen. In de periode 2017-2021 is er € 9,1 miljoen uitgegeven, dit is ruim 13% van het huidige gedekte programmabudget van € 68 miljoen. Er is minder uitgegeven dan geprognosticeerd door bijvoorbeeld vertraging in de aanvoer van materiaal, capaciteitsvraagstukken, vertragende scopewijzigingen of omdat het overleg met derden meer tijd vroeg. Ook de coronamaatregelen speelden een rol in de vertraging van (en dus uitgaven in) projecten.

Verdeling over de pijlers

De uitgaven in de afgelopen jaren zijn als volgt verdeeld over de drie pijlers van het gebiedsakkoord:

- ontwikkelen vrijetijdslandschap: € 4,4 miljoen
- versterking ecologische waarden: € 3,4 miljoen
- transitie recreatiesector/organisatiekosten: € 1,3 miljoen



De meeste projecten verkeren in de verkenningsfase. Pas aan het einde van de planuitwerkingsfase (als planning, risico's en ramingen concreet worden) kan een kasritme worden afgestemd en een realistisch uitgavenpatroon worden vastgesteld. Dat is ook het moment waarop we een goede meerjarenprognose kunnen afgeven.

Uitdagingen

Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie door Arcadis is een voorstel uitgewerkt hoe doelen en ambities binnen het gebiedsakkoord in overeenstemming kunnen worden gebracht met de financiën. De stuurgroep neemt begin 2022 een besluit over dit voorstel.

Kern van het voorstel is om toe te werken naar het opstellen van een geactualiseerd en dynamisch uitvoeringsprogramma (UP 2.0) dat eind 2022 aan de stuurgroep kan worden voorgelegd. Het opstellen van een 2.0-versie maakt het mogelijk achterhaalde informatie te verwijderen, financiële tabellen te actualiseren én om financiering te vinden voor de gewenste versterking van het programmamanagement en een aantal ongedekte posten. Tenslotte geeft een UP 2.0 zicht op financieringsmogelijkheden voor nieuwe initiatieven of vervolgprojecten.

Financieel totaaloverzicht

Programma Oostelijke Vechtplassen	2017-2027	2017-2027		2021	2017-2021	2022
Deelproject	Budget GA	Herzien budget	Goedgekeurd fase budget	Kosten	Kosten	Prognose projectleiders
Recreatieve verbindingen	14.071.000	10.896.000	1.053.000	57.376	722.343	376.000
Bagger en zwevend slib	30.850.000	21.439.000	13.171.315	1.289.496	3.583.403	2.815.165
Proces en onderzoek	190.000	170.000	170.000	10.070	93.802	54.930
Versterking ecologische waarden	30.511.000	29.282.000	15.807.205	980.853	3.053.225	952.910
Bestrijding invasieve exoten	1.000.000	500.000	500.000	31.977	358.144	115.500
Transformatie recreatie sector	570.000	560.000	560.000	157.461	528.961	179.440
Organisatiekosten	-	960.000	960.000	427.761	774.076	375.000
TOTAAL OVP	77.192.000	63.807.000	32.221.520	2.954.994	9.113.954	4.868.945

4

Status projecten





Lopende projecten		Huidige fase	Scope	Planning	Financiën
Ontwikkelen vrijetijdslandschap					
1.1	Recreatieve routes & natuur-en landschapsbeleving	Verkenning			
1.2	(Water)recreatie 's-Graveland/Kortenhoef	Verkenning			
1.3	Alternatieven voor de waterrecreatie (voorheen Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen - Hilversums Kanaal)	Verkenning			
1.4	Onderzoek Ontsluiting en toegankelijkheid	Verkenning			
1.5a	Van dorpslint naar recreatieboulevard (Wijdmeren)	Verkenning			
1.7.1a	Aanpak baggerproblematiek (fase 1)	Realisatie			
1.7.1b	Aanpak baggerproblematiek (exclusief fase 1)	Planuitwerking			
1.7.2	Aanpak zwevend slib: helder water en ontwikkeling waterplanten	Verkenning en planuitwerking			
1.8	Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten	Realisatie			
Versterken ecologische waarden					
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Kortenhoef Oost	Verkenning			
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Kortenhoef West	Verkenning			
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Ankeveen (HAP/SAP)	Verkenning			
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Weersloot	Verkenning			
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Ster van Loosdrecht	Verkenning			
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Vuntus	Verkenning			
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – 't Hol	Planuitwerking			
2.2a	Realiseren Ecologische verbindingen – N201	Planuitwerking			
2.2b	Realiseren Ecologische verbindingen - Faunapassages	Planuitwerking en realisatie			
2.3	Verbeteren waterkwaliteit	Planuitwerking en realisatie			
2.4.1	Nieuw habitat moerasvogels op privaat eigendom	Verkenning			
2.4.3a	Planuitwerking natuurmaatregelen voor moerasvogels	Planuitwerking			
2.4.3b	Quicksan Nieuwe Polderplas	Verkenning			
2.5.1	Plan van Aanpak populatiebeheer ganzen en ganzenvraat	Planuitwerking en realisatie			
2.5.3	Bestrijding exoten	Planuitwerking en realisatie			
Transformatie recreatiesector					
3.1	Gebiedsloods	Realisatie			
3.2a	Transitieteam Recreatie en Toerisme	Realisatie			
3.2b	Toekomstbeeld Recreatie 2030	Planuitwerking			
3.4	Verkenning bedrijveninvesteringszone / investeringsfonds	Verkenning			
Organisatiekosten					
4.1	Organisatiekosten GA OVP	Niet fase gebonden			

 Project verloopt volgens meest actuele plan van aanpak, geen besluit stuurgroep vereist

 Project verloopt niet geheel volgens meest actuele plan van aanpak, geen besluit stuurgroep vereist

 Project verloopt niet volgens meest actuele plan van aanpak, besluit stuurgroep vereist




Afgeronde (deel)projecten uit het uitvoeringsprogramma

Projecten		Opmerkingen
1.1	Wandelbrug 's-Graveland	Opgeleverd in 2019.
1.1	Deelproject Kano-overstapplaats Wijde Blik-Vuntus	Officiële décharge vond plaats in 2021.
1.5b	Duurzame ontwikkeling Scheendijk (Stichtse Vecht)	De Toekomstvisie Scheendijk is opgeleverd en vastgesteld. De realisatie van dit plan valt buiten het gebiedsakkoord, de gemeente Stichtse Vecht gaat hiermee verder.
1.6	Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen	De prijsvraag is afgerond. We kijken samen met gebiedspartijen en binnen de projecten naar mogelijkheden voor realisatie van de ontwerpen van de prijswinnaars.
2.2	Deelproject Faunapassage Gele Brug	Bij het renoveren van de brug in Ankeveen is tegelijkertijd een faunapassage aangelegd
2.3	Defosfatering Bethuneoverschot	Door defosfatering van het Bethuneoverschot stroomt er schoner water in de Loosdrechtse Plassen.
2.5.2	(Nood)maatregelen Ganzenvraat t.b.v. de grote karekiet	Volledige budget is besteed. Het vervolg van de werkzaamheden wordt meegenomen in PvA populatiebeheer ganzen (project 2.5.1.) en deels bij de maatregelen voor moerasvogels (project 2.4.3a).
3.1	Fiets-voet-veer	Tot stand gekomen met inspanning van de gebiedsloosd.
3.3	Integreren recreatie en natuur: onderzoek samengaan natuur en waterrecreatie en onderzoek duurzaam varen	Onderzoeken zijn in 2020 afgerond. We zoeken naar financiering voor de follow-ups die uit deze onderzoeken voortkomen.

Pijler 1

Ontwikkelen vrijetijdslandschap





Project 1.1 Recreatieve verbindingen

Projecttrekker	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 2.621.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	11-07-2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De uitvoering loopt minder vlot dan verwacht. Belangrijkste reden is dat het overleg met particuliere grondbezitters over het beschikbaar stellen van grond voor de paden meer tijd vergt dan verwacht. Waar geen medewerking wordt verkregen, zoeken we naar alternatieve routes wat meer tijd en extra overleg vraagt. Vanwege coronamaatregelen was het bovendien ingewikkelder om de benodigde gesprekken te voeren. Daarnaast is er vanwege beperkte capaciteit en specifieke omstandigheden (corona en ontwikkelingen RMN/Plassenschap) minder inzet gepleegd op de realisatie van recreatieve verbindingen.		
Betrokken partijen	Gemeente Hilversum, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Natuurmonumenten, Waternet/AGV, Plassenschap Loosdrecht e.o. en private partijen.		
Samenhang overige projecten	Het project is erop gericht de bereikbaarheid, de ontsluiting en beleving van het gebied te verbeteren door bij te dragen aan een aaneengesloten wandel- en/of fietsnetwerk. Dit project raakt aan diverse natuurrealisatieprojecten (project 2.1), de herontwikkeling van de dorpslinten (project 1.5) en/of de aanleg van nieuwe vaarverbindingen (project 1.3), verbeteren waterrecreatie (project 1.2) en de ontwikkeling van de Nieuwe Polderplas (project 2.4.3). Verder is er een duidelijke relatie met de transformatie van de recreatiesector, waarin gewerkt wordt aan een breder en meer divers aanbod aan recreatieve en toeristische mogelijkheden.		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

- De afsluiting en decharge van het project kano oversteekplaats door de stuurgroep.
- PvA voor het Zoddepad en het Vuntuspad zijn goedgekeurd, de routes zijn definitief bekend en er is een start gemaakt met het realiseren van voorzieningen zoals bruggetjes, hekwerk en bewegwijzering.
- De route van het pad 'Ster van Loosdrecht' is bekend.
- PvA voor het Korremofpad is goedgekeurd en de route is grotendeels bekend.
- De route van het Groenewoudpad wordt meegenomen bij het opstellen van het NNN-inrichtingsplan Kortenhoef-Oost.
- Voor het project Horstermeer is een goedgekeurd PvA in uitvoering.
- De verkenning voor het legakkerpad Kievitsbuurten is gestart.
- Het project Nieuwe Polderplas heeft duidelijkheid gecreëerd over het trekpad Loenderveenseplas óf over alternatieven die verder kunnen worden uitgewerkt.



Progressie op hoofdlijnen in 2021

- **Project kano oversteekplaats**

Het project kano oversteekplaats is gerealiseerd en afgesloten. De stuurgroep heeft decharge verleend. De komende 5 jaar voorziet Natuurmonumenten in het onderhoud van de steigers.

- **Zoddepad en het Vuntuspad**

Er zijn nog geen PvA's voor het Zoddepad en het Vuntuspad. Voor het Zoddepad is een voorstel in ontwikkeling voor het integraal aanpakken van de entree van het pad bij de NH kerk. Ook worden gesprekken gevoerd met particulieren om een aansluiting op de Kanaaldijk te realiseren. Deze zaken nemen we mee in het nog op te stellen PvA. De route van het pad en de medewerking van grondeigenaren is nagenoeg rond. Voor wat betreft het Vuntuspad zijn de gesprekken met grondeigenaren gaande. De route van het pad en de medewerking van grondeigenaren is nagenoeg rond. Gesprekken over de aansluiting van het Vuntuspad op de Kromme Rade en de Oud-Loosdrechtsdijk starten in het voorjaar van 2022. De ligging van het pad wordt verwerkt in het NNN-inrichtingsplan voor het Vuntusgebied.

- **Wandelpad Ster van Loosdrecht**

De Vereniging Ster van Loosdrecht is bezig met het ontwikkelen van een tweetal rondjes om te wandelen in het Ster-gebied: één met een vertrekpunt nabij Sypesteijn en één met een vertrekpunt nabij de Buitenhof in Nieuw-Loosdrecht. Op genoemde routes zijn veel bruggetjes nodig, hetgeen de ontwikkeling complex maakt.

- **Korremofpad**

Voor het Korremofpad zijn de eigenaren van de percelen bekend en hebben er verkennende gesprekken plaatsgevonden met buurtbewoners. De grondeigenaren moeten nog worden benaderd.

- **Groenewoudpad**

De routing van het Groenewoudpad wordt meegenomen bij het opstellen van het NNN-inrichtingsplan voor Kortenhoef-Oost. We leggen die werkzaamheden neer bij de projectgroep die het inrichtingsplan opstelt.

- **Groenewoudpad - wandelbruggetje bij 's-Graveland**

Het wandelbruggetje bij 's-Graveland maakt onderdeel uit van het Groenewoudpad dat al eerder is gerealiseerd.

- **Project Horstermeer Zuid**

Dit project omvat een route op de ringdijk Zuid, het NERA-ommetje, de fietsdoorsteek Horstermeerpolder en het traject Horstermeer-fort Kijkuit-Hilversumskanaalpad (noordoever). Met dit project is nog geen start gemaakt. In 2021 was extra capaciteit nodig om - vanwege coronamaatregelen - de drukte in het gebied te reguleren. Ook de ontmanteling van RMN vroeg extra capaciteit. Wel zijn voorbereidingen getroffen zodat we in 2022 vlot met dit project van start kunnen.

- **Legakkerpad Kievitsbuurten**

De verkenning voor het legakkerpad Kievitsbuurten is nog niet van start. Gewacht wordt op duidelijkheid over de beschikbaarheid van middelen voor het realiseren van dit pad.

- **Trekpad Loenderveenseplas**

Over dit trekpad of eventuele alternatieven is nog geen duidelijkheid. Realisatie van het trekpad was ondergebracht binnen het project Nieuwe Polderplas. Dit project is ligt echter stil: er is onduidelijkheid over mogelijkheden om in de Nieuwe Polderplas bagger uit de plassen toe te passen en over de meerwaarde die dit zou hebben voor moerasvogels. In 2022 wordt een voorstel gedaan hoe verder om te gaan met de uitvoering van het project Nieuwe Polderplas.



Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 170.000	€ 2.621.000	€ 20.000 voor kano overstapplaats € 75.000 voor Korremofpad € 25.000 voor Vuntuspad € 50.000 voor uitvoering Horstermeer Zuid
Herzien projectbudget		-	€ 2.541.000	€ 80.000 overgeheveld naar capaciteit, een en ander t.b.v. inhuur projectleiding Horstermeer Zuid
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 18.928	€ 18.298	
	in 2021	-	-	
	Totaal	€ 18.928	€ 18.928	
Resterend budget		€ 151.072	€ 2.522.072	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- PvA voor het Zodepad en het Vuntuspad zijn goedgekeurd. De routes zijn definitief bekend en de voorbereiding voor het realiseren van voorzieningen (zoals bruggetjes, hekwerk en bewegwijzering) is gestart.
- De vereniging Ster van Loosdrecht heeft een plan voorgelegd voor het realiseren van twee wandelroutes in het Ster-gebied.
- Voor het Korremofpad is een PvA goedgekeurd en de route is - na gesprekken met de grondeigenaren - grotendeels bekend.
- De route van het Groenewoudpad heeft een plaats gekregen binnen het opstellen van het NNN-inrichtingsplan Kortenhoef-Oost.
- Voor het project Horstermeer Zuid is een PvA goedgekeurd en in uitvoering.
- Voor het Legakkerpad Kievitsbuurten is duidelijkheid verkregen over de financiering. Binnen de mogelijkheden wordt een PvA opgesteld.
- Er is duidelijkheid over mogelijkheden voor het uitwerken van een trekpad binnen het project Nieuwe Polderplas. Lukt dit niet dan dient de realisatie van het trekpad (of een alternatief) separaat opgepakt te worden. Dit zal niet in 2022 plaatsvinden.

Risico's scope, planning, financiën

- De routes lopen veelal over particulier terrein. Realisatie is dus afhankelijk van de medewerking van particuliere grondeigenaren.
- Als grondeigenaren niet mee willen werken, wordt gezocht naar alternatieve routes. Dit kost tijd en vraagt extra overleg met andere, mogelijk ook weer particuliere grondeigenaren.
- In bepaalde gevallen moet grond worden aangekocht. Tot op heden zijn voldoende middelen beschikbaar. Eventueel kan er gecombineerd worden met grondaankopen die plaatsvinden in het kader van NNN-trajecten.
- De routes vormen samen een netwerk omdat zij op elkaar aansluiten. Het verdient aanbeveling de scope van het geheel te verbreden en te werken aan digitale bewegwijzering (bijvoorbeeld een app) zodat de paden voor recreanten bekend en vindbaar worden.
- Bij de raming in het uitvoeringsprogramma is geen rekening gehouden met een mogelijk BTW risico. Er is een risico omdat werkzaamheden uitgevoerd worden op percelen van derden.



Project 1.2 Waterrecreatie 's-Graveland/Kortenhoeft

Projecttrekker	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 5.750.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	02-09-2020		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het project heeft (na de scopewijziging in 2019) vanwege beperkte capaciteit en prioriteit die moest worden gegeven aan project 1.3 Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal, nog geen doorstart gekregen. Ook moet een nieuwe projectleider worden aangetrokken. De scopewijziging betekent dat de bevaarbaarheid van de 's Gravelandsevaart één van de te onderzoeken mogelijkheden is voor het verbreden van de waterrecreatie in 's Graveland en Kortenhoeft.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Gemeente Hilversum, Regio Gooi en Vechtstreek, Natuurmonumenten, Plassenschap Loosdrecht e.o., Hiswa-Recron, Toeristische Kanobond Nederland, Watersportverbond, Stichting behoud erfgoed 's-Gravelandsevaart, Bewonersfederatie OVP, (vertegenwoordiging van) ondernemers en specialisten op het gebied van bijvoorbeeld ecologie, civiele techniek, recreatie, stedenbouw, landschap.		
Samenhang overige projecten	Nader te bepalen bij de doorstart.		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

Er is onderzoek gedaan naar alternatieven waarmee het aanbod voor waterrecreatie kan worden vergroot: het bevaarbaar maken van de 's-Gravelandsevaart is daarbij één van de te onderzoeken varianten. De stuurgroep besluit binnenkort over het nader uitwerken van één of meerdere van die alternatieven.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

Er is nog geen uitvoering gegeven aan het PvA. De projectleider leidde ook het project 1.3 Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal dat prioriteit kreeg en extra capaciteit vroeg. Genoemde projectleider nam bovendien in de zomer van 2021 afscheid. In verband met de herziening van het programma op inhoud en organisatie (besluit begin 2022), is gewacht met het aantrekken van een nieuwe projectleider.



Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 203.000	€ 5.750.000	
Herzien projectbudget		-	€ 5.505.000	€ 245.000 overgeheveld naar communicatie en capaciteit Wijdmeren
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 109.061	€ 109.061	
	in 2021	€ 1.089	€ 1.089	
	Totaal	€ 110.150	€ 110.150	
Resterend budget		€ 92.850	€ 5.394.850	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- Er is een projectleider geworven.
- Indien nodig is het PvA geactualiseerd. De aanpak is afgestemd op de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van project 1.3 met de gewijzigde scope: het onderzoek naar de alternatieven voor de waterrecreatie.
- Er is een start gemaakt met het uitvoeren van het geactualiseerde PvA.

Risico's scope, planning, financiën

Na het vervallen van het onderzoek naar de vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal wordt nu onderzoek gedaan naar alternatieven om de waterrecreatie een impuls te geven. Dit onderzoek moet goed aansluiten bij het project waterrecreatie in 's-Graveland en Kortenhoef.



Project 1.3 Alternatieven waterrecreatie (vaarverbinding LPHK)

Projecttrekker	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 5.700.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	18-07-2018 en 15-12-2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	In 2021 is besloten het onderzoek naar de haalbaarheid van deze vaarverbinding te stoppen. De focus richt zich nu op andere manieren om de waterrecreatie in het gebied een impuls te geven. Hiermee is de scope van het project wezenlijk veranderd. Er zijn maar liefst 12 alternatieven aangedragen voor de waterrecreatie. Het beschikbare budget zal niet toereikend zijn voor alle aangedragen alternatieven. Er is nog geen selectie en ook nog geen nieuwe planning.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Gemeente Stichtse Vecht, Gemeente Hilversum, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, ondernemers, Watersportverbond, Hiswa-Recron, Bewonersfederatie OVP, Natuurmonumenten, Vechtplassencommissie, Waternet/AGV en Toeristische Kanobond Nederland.		
Samenhang overige projecten	Afhankelijk van (vervolg)onderzoek.		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

De stuurgroep heeft geadviseerd over de vraag of er een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal komt of dat er wordt uitgekeken naar andere opties om een vergelijkbaar belang te dienen. De gemeenteraad heeft in het kader van de MER de zienswijzen beantwoord. In het verlengde van die besluiten is gestart met vervolgonderzoeken die voortvloeien uit de gekozen richting.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

Na een intensief en zorgvuldig beoordelingsproces heeft de stuurgroep besloten het onderzoek naar de vaarverbinding te staken en de binnen het project beschikbare middelen in te zetten voor alternatieve maatregelen waarmee de waterrecreatie in het gebied versterkt kan worden. Besloten is ook dat wordt gezocht naar additionele middelen voor de uitvoering van deze alternatieven. De stuurgroep heeft de raad van Wijdmeren hierover in december geïnformeerd. De gemeente Wijdmeren kan de zienswijzen die in het kader van de MER waren ingediend, in 2022 afhandelen.

Er is een lijst met 12 alternatieven voor de waterrecreatie opgesteld. Voorbereidingen zijn gestart om de haalbaarheid van deze alternatieven te onderzoeken.



Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 680.000	€ 5.700.000	
Herzien projectbudget		-	€ 2.850.000	€ 100.000 overgeheveld t.b.v. communicatie en € 2.750.000 is ongedekt
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 536.978	€ 536.978	
	in 2021	€ 56.287	€ 56.287	
	Totaal	€ 593.265	€ 593.265	
Resterend budget		€ 86.736	€ 2.256.736	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

De verkenning van de haalbaarheid van de 12 alternatieven is afgerond en heeft geresulteerd in een aantal scenario's van alternatieven. De stuurgroep heeft een besluit genomen over het verder uit te werken en te onderzoeken scenario. Er is een aanvang gemaakt met het uitwerken en concretiseren van de alternatieven in dit scenario.

Risico's scope, planning, financiën

Reeds bij het sluiten van het gebiedsakkoord was bekend dat het budget voor de realisatie van de vaarverbinding nog aanvulling behoeft: de dekking was niet volledig. Het budget zal ook niet toereikend zijn voor het realiseren van alle 12 te onderzoeken alternatieven. De zoektocht naar verdere financiering maakt onderdeel uit van het project en kan een risico vormen voor de uitvoerbaarheid.



Project 1.4 Onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid

Projecttrekker	Gemeente Wijdmeren / Gemeente Stichtse vecht		
Projectraming volgens UVP	€ 40.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	18-07-2018 en 30-6-2021 (intake)		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Dit project heeft qua planning achterstand opgelopen. Belangrijkste reden is dat vanwege de vele projecten in het uitvoeringsprogramma, een forse capaciteitsvraag op beide gemeenten is afgekomen. Gezien de beperkte formatie zijn keuzes gemaakt en kregen andere projecten prioriteit. Nu door corona mensen meer in eigen land recreëren, is de noodzaak en wens om dit project op te pakken groter geworden.		
Betrokken partijen	Provincie Utrecht, Provincie Noord-Holland, Hiswa-Recon, Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek, Watersportverbond, Platform recreatie en toerisme Wijdmeren, ANWB, Regio Gooi en Vechtstreek, Bewonersfederatie OVP, Toeristische Kanobond Nederland, Natuurmonumenten, Waternet/AGV, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang overige projecten	Dit project moet mensen betere mogelijkheden bieden om dit versterkte vrijetijdslandschap in te trekken. Het gaat om bereikbaar maken en houden. Er is dan ook een relatie met projecten die gericht zijn op het realiseren van dit zogenoemde vrijetijdslandschap. Het gaat om: recreatieve verbindingen (project 1.1), vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal (project 1.3), vergroting aanbod waterrecreatie 's-Graveland/Kortenhoeve (project 1.2), van dorpslint naar recreatieboulevard (project 1.5), icoon van Loosdrecht (project 1.6), baggeren (project 1.7), herstel & duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten (project 1.8) en de Nieuwe Polderplas (project 2.4.3). Verder is er een duidelijke relatie met de transformatie van de recreatiesector, waarin gewerkt wordt aan een verbreed en divers aanbod aan recreatieve en toeristische mogelijkheden.		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

- Er zijn gezamenlijke keuzes gemaakt ten aanzien van de uit te voeren onderzoeken.
- De onderzoeken zijn uitgevoerd en hebben geresulteerd in concrete uitvoeringsgerichte aanbevelingen.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

De opdracht voor het onderzoeken en in kaart brengen van mogelijkheden om het Oostelijke Vechtplassen-gebied beter te ontsluiten en toegankelijk te maken, faciliteiten te realiseren die als uitvalsbasis kunnen dienen om het gebied in te gaan én de herinrichting van de Scheendijk is gegund. Het onderzoek zal naar verwachting medio 2022 gereed zijn.



Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 35.000	€ 40.000	
Herzien projectbudget		-	€ 35.000	€ 5.000 is overgeheveld naar capaciteit Wijdemeren voor projecten recreatie en NNN
Totaal besteed:	t/m 2020	-	-	
	in 2021	€ 10.070	€ 10.070	
	Totaal	€ 10.070	€ 10.070	Kosten lopen via WM
Resterend budget		€ 24.930	€ 24.930	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

Onderzoeken zijn uitgevoerd en hebben geresulteerd in concrete uitvoeringsgerichte aanbevelingen.

Risico's scope, planning, financiën

- De beschreven scope van het onderzoek is breed. Het gaat om zaken als: ontoereikende OV, ontbreken van passantenligplaatsen, bereikbaarheid Scheendijk, verkeersdrukte Vechtbrug in Breukelen, afvangen van bezoekers op alternatieve plekken, parkeerfaciliteiten, arrangementen vanaf stations, ligplaatsen voor kort verblijf, (toilet)faciliteiten langs (vaar)routes, bebording en (digitale) vindbaarheid. Gezien het beperkte budget moeten er waarschijnlijk keuzes gemaakt worden ten aanzien van de inhoud van het onderzoek.
- Er zijn middelen beschikbaar voor het onderzoek, niet voor het uitvoeren van daaruit voortvloeiende aanbevelingen. Om vervolg te kunnen geven aan de uitkomsten van het onderzoek zullen aanvullende middelen beschikbaar moeten komen.



Project 1.5a Van dorpslint naar recreatieboulevard

Projecttrekker	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 60.000 voor totaal project 1.5 waarvan € 45.000 voor onderdeel gemeente Wijdmeren		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	N.v.t.		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Er is qua planning vertraging opgelopen. Dit hangt samen met de uitgestelde reconstructie van de Nieuw Loosdrechtsedijk. Het onderdeel Boomhoek, waar dit project betrekking op heeft, hangt met deze reconstructie samen. In dit project worden de mogelijkheden verkend (en zo mogelijk uitgewerkt) voor het realiseren van een passende aansluiting van de belendende (particuliere) percelen op de gereconstrueerde weg in het gebied Boomhoek. De recreatieboulevard beslaat meerdere delen van het 'hoefijzer' in Oud- en Nieuw-Loosdrecht. Meerdere delen van de weg zijn en worden gereconstrueerd. Uitvoering vindt plaats buiten het gebiedsakkoord en binnen de gemeente Wijdmeren: - deelproject 'tussen de rotondes' is uitgevoerd - deelproject Boomhoek-Muyeveld is uitgesteld. Uitvoering vindt plaats in 2022 tot en met 2024 en bestaat uit 2 fasen: eind 2022-begin 2023 en eind 2023-2024. Het deelproject voor Oud-Loosdrecht omvat ook de planvorming voor de Porseleinhaven. Reconstructie van de weg is pas in de eindfase aan de orde zijn en daarom nog niet gepland.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, recreatiesector, Vereniging verenigde bedrijven Boomhoek, bewoners en eigenaren belendende percelen.		
Samenhang overige projecten	De samenhang met andere projecten zit met name in de betrokkenheid van bewoners, al dan niet vertegenwoordigd in belangengroepen. Dezelfde bewoners hebben ook te maken met de NNN-realisatie in Weersloot en in De Ster van Loosdrecht (project 2.1) en met maatregelen ten behoeve van de moerasvogels (project 2.4). Deze mensen worden vanuit diverse projecten benaderd en het is belangrijk de samenhang tussen de projecten te benadrukken. Verder hangt het project samen met de transitie van de recreatiesector. De realisatie van de recreatieboulevard draagt bij aan een aantrekkelijke omgeving om te recreëren: te voet, op de fiets, in de auto of anderszins. Het heeft verder een relatie met het project Onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid (project 1.4) en waar mogelijk wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor de aanleg van fauna-passages (project 2.2).		



Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

- Herinrichting van de openbare ruimte in Boomhoek is uitgevoerd.
- De mogelijkheden zijn verkend om met (een deel van de) eigenaren van belendende percelen een plan te maken voor een passende aansluiting van de percelen op de nieuw ingerichte openbare ruimte. Indien haalbaar en mogelijk wordt dat plan ook opgesteld.
- Voor Oud Loosdrecht is er meer zicht op de scope van waaruit herinrichting kan worden opgepakt. Daar zijn ook eerste stappen in gezet.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

De stuurgroep heeft ingestemd (besluit 31-03-2021) de middelen beschikbaar te maken voor het opstellen van een PvA voor het onderdeel belendende percelen Boomhoek. Daar de reconstructie van de weg is uitgesteld, is er ook nog geen PvA. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de laatste ontwikkelingen, wachten we tot 2022.

In 2021 gaf de gemeenteraad van Wijdmeren groen licht voor de reconstructie van de weg: de werkzaamheden (fase 1) staan gepland voor eind 2022-begin 2023. Omwille van de effectiviteit wachten we met de gesprekken met grondeigenaren van belendende percelen tot medio/eind 2022: we kunnen dan direct verbinding leggen met de reconstructie. We gaan op zoek naar een nieuwe projectleider.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 30.000	€ 45.000	Deel Wijdmeren
Herzien projectbudget		-	€ 30.000	€ 15.000 is overgeheveld naar capaciteit
Totaal besteed:	t/m 2020	-	-	
	in 2021	-	-	
	Totaal	-	-	
Resterend budget		€ 30.000	€ 30.000	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- Het PvA is vastgesteld door de stuurgroep en is in uitvoering.
- De uitvoering is in handen van een nieuwe aangetrokken projectleider.
- Uit een verkenning is gebleken of er een plan kan worden gemaakt voor een passende aansluiting van de belendende percelen op de (gereconstrueerde) openbare weg.

Risico's scope, planning, financiën

- Als eigenaren van belendende percelen niet mee willen werken aan het plan voor een passende aansluiting van percelen op de nieuw ingerichte openbare ruimte, dan moet de scope van het project veranderd worden: de aanpassingen beperken zich dan tot de reconstructie van de openbare ruimte. We zullen dan op zoek moeten naar andere manieren om de gewenste 'recreatieboulevard' tot stand te brengen.
- Voor het opstellen en realiseren van het plan is maar een zeer beperkt budget beschikbaar. Dit kan de animo om deel te nemen beperken.



Project 1.7.1a Baggeropgave fase 1

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 6.276.315		
Fase project	Realisatie		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	26-02-2020		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Waternet/AGV, baggerplatform, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang overige projecten	Met Baggeren Fase 2 (project 1.7.1b) en verder met het legakkerherstel in de Kievitsbuurten (project 1.8) Zwevend slib en waterplanten (project 1.7.2) en het bestrijden van exoten (project 2.6).		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

Het bouwteam is actief en bereidt samen met een aannemer de realisatie voor, start de voorbereidingsfase en voert aanvullende onderzoeken uit.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

We hebben de bouwteam-opdracht gegund aan Beens Dredging. De voorbereidingswerkzaamheden in het bouwteam zijn gestart. Het op tijd starten met de fysieke werkzaamheden heeft voorrang gekregen boven het emissieloos werken. Ook de aanvullende onderzoeken zijn afgerond. Het projectteam verwacht in de tweede helft van 2022 te starten met de fysieke uitvoeringswerkzaamheden.

Overige bijzonderheden

Zettingen, duurzaam baggeren en klanteisen vormen de aandachtspunten. Deze worden uitgewerkt en geïntegreerd in de definitief te maken baggerscope.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PVA SG / volgens UVP		€ 30.000	€ 45.000	
Herzien projectbudget		-	-	
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 104.443	€ 104.443	
	in 2021	€ 398.672	€ 398.672	
	Totaal	€ 503.115	€ 503.115	
Resterend budget		€ 5.772.885	€ 5.772.885	



Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- Het bouwteam rondt werkzaamheden af en opdracht uitvoering is gegund.
- Er is gecommuniceerd over fasering en werkwijze.
- De fysieke realisatie is gestart (met onder meer aanleg depot en eerste bagger uit de plas).

Risico's scope, planning, financiën

Het projectteam verwacht dat de projectscope binnen het huidige budget gerealiseerd kan worden.

De volgende risico's kunnen het uiteindelijke projectresultaat beïnvloeden:

- depot locatie (Mijnden) kan onverhoopt niet worden gerealiseerd;
- zettingen ondergrond ter plaatse van het depot wijken te veel af van de prognose;
- bagger in depot is meer vervuild dan uit de onderzoeken is gebleken;
- aanbidding aannemer past niet binnen taakstellend budget.



Project 1.7.1b Aanpak baggerproblematiek (exclusief fase 1)

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 13.500.000 Opgebouwd als volgt: € 24.800.000 - € 2.100.000 Legakkerherstel Kievitsbuurten - € 5.600.000 Natuureilanden - € 3.600.000 private bijdrage en incl. fase 1 van € 6.300.000.		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	30-06-2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Overleg met eigenaren van jachthavens verloopt omzichtig. Het verkennen van mogelijkheden voor het baggeren in de Stille Plas en Vuntus is gestagneerd door onzekerheid over mogelijke locaties voor het toepassen van vrijgekomen bagger. Wat betreft de financiën is het onzeker of ondernemers willen meebetalen aan het baggeren van de jachthavens. Daarnaast kan mogelijk niet alle BTW bij de baggerwerkzaamheden worden verrekend.		
Betrokken partijen	provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, Waternet/AGV, gemeente Wijdmeren, gemeente Stichtse Vecht, gemeente Hilversum, diverse jachthavens en watersportverenigingen, baggerplatform.		
Samenhang overige projecten	Zwevend slib en Waterplanten (project 1.7.2), Legakkerherstel Kievitsbuurten (project 1.8), Natuurontwikkeling (project 2.1), Maatregelen voor Moerasvogels (project 2.4), Nieuwe Polderplas (project 2.4.2).		

Resultaatbereik 2021

In de Aanpak Oostelijke Vechtplassen is het project 1.7.1 Aanpak baggerproblematiek opgenomen. In de uitwerking is dit project opgedeeld in drie fases:

- **fase 1:** baggeren van de Loosdrechtse plassen
- **fase 2:** baggeren van de jachthavens
- **fase 3:** verkenning baggeren Stille Plas en Vuntus

Fase 1 is reeds overgedragen aan de afdeling Beheer en uitvoering (BU) van de provincie Noord-Holland. Momenteel is de focus vooral gericht op het voorbereiden van fase 2 en 3.

Beoogd resultaat op 31 december 2021

- **fase 2:** er is een geschikte locatie in zicht voor het verwerken van baggerspecie uit de jachthavens. En daarnaast zijn de uitgangspunten voor marktconforme tariefstelling duidelijk.
- **fase 3:** gezamenlijk gebiedsproces vastgelegd.



Progressie op hoofdlijnen in 2021

Fase 2

Er zijn kleine stappen gezet. De natuurtoets in relatie tot een baggerdepot is uitgevoerd. Er is afstemming gezocht met de omgevingsdienst en met de afdeling Ruimtelijke ordening van de gemeente Wijdmeren. We hebben verder onderzoek ten behoeve van vergunning/ontheffing inzake de Wet natuurbeheer in gang gezet. Wat betreft het tijdpad maken we een voorbehoud.

Fase 3

We voerden gesprekken met Natuurmonumenten en Waternet over de mogelijkheden voor een depot in de Stille Plas. We hebben deze fase vervolgens geparkeerd tot er meer duidelijkheid is over de toepassingsmogelijkheden van bagger in water.

Overige bijzonderheden

Het oprichten van een depot in N2000 of NNN-gebied conflicteert met andere belangen binnen het gebiedsakkoord. Ook verwachten we weerstand vanuit de omgeving. Het is lastig uitleggen dat doelen voor baggerverwerking in de Oostelijke Vechtplassen verenigbaar zijn met natuurdoelen.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.545.000 € 200.000 € 500.000	€ 13.500.000	Voor 1.7.1 inclusief fase 1.
Herzien projectbudget		-	€ 7.014.000	Herzien door: € 6.276.000 voor fase 1, € 180.000 voor bureaunkosten (voorlopig) en € 30.000 voor Nieuwe Polderplas.
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 1.293.616	€ 1.293.616	
	in 2021	€ 392.081	€ 392.081	
	Totaal	€ 1.685.697	€ 1.685.697	
Resterend budget		€ 559.303	€ 5.328.303	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten 31 december 2022

Fase 2: keuze gemaakt voor verwerkingslocatie voor bagger uit jachthavens/watersportverenigingen.

Fase 3: inzicht in scope baggeropgave (inclusief mogelijkheden voor toepassing) in Stille Plas en Vuntus.

Risico's scope, planning, financiën

Fase 2:

- Lang tijdpad voor het oprichten van een depot in N2000 of NNN-gebied.
- Eisen uit vergunningen werken kostenverhogend (waterbehandeling, emissiebeheersing, mitigerende maatregelen wet Natuurbeheer).
- De beheerorganisatie voor het depot niet efficiënt: erg kostbaar vanwege looptijd van 10 jaar.

Fase 3:

- Toepassingslocatie voor vrijkomende bagger niet voorhanden. Verspreiden op de kant of onder water te ingrijpend en te kostbaar om een project mogelijk te maken.



Project 1.7.2 Aanpak zwevend slib en waterplanten

Projecttrekker	Waternet/AGV		
Projectraming volgens UVP	€ 6.050.000 + p.m.		
Fase project	Verkenning en planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	30-06-2021 (luwtemaatregelen) 12-07-2019 (overige maatregelen)		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De voortgang is circa 3 maanden vertraagd omdat het verwerken en analyseren van gegevens meer tijd kostte dan geraamd.		
Betrokken partijen	Waternet/AGV, Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang overige projecten	Baggeropgave (project 1.7.1), verbeteren waterkwaliteit (project 2.3), herstel legakkers (project 1.8), bestrijding exoten (project 2.5.3), maatregelen voor moerasvogels (project 2.4).		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

- Veldmetingen afronden in het voorjaar.
- Het dynamische slibmodel op basis van veldmetingen valideren en toepassen voor maatregelenscenario's.
- Planvorming voor het met luwtemaatregelen verlagen van de concentratie zwevend slib gestart.
- De praktijkexperimenten gericht op ontwikkeling van waterplanten en het vasthouden van zwevend slib zijn voorbereid en gestart.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

De veldmetingen zijn volgens planning in mei afgerond. Het verwerken en analyseren van de gegevens, voordat deze gebruikt konden worden voor de ijking van het slibmodel, bleek tijdrovend. De ijking van het slibmodel is daardoor vertraagd en in januari 2022 afgerond. De fase van planuitwerking voor de te nemen luwtemaatregelen en de voorbereiding van praktijkexperimenten is doorgeschoven naar 2022.

Overige bijzonderheden

Het projectbudget bestaat uit 3 onderdelen:

- defosfateringsmaatregelen (€ 2.400.000)
- luwtemaatregelen (€ 3.500.000)
- overige maatregelen (€ 150.000)

Omdat de uitvoering van de KRW-defosfateringsmaatregelen geheel bij het waterschap AGV ligt en er per maatregel subsidie wordt aangevraagd, is afgesproken om de financiën van deze maatregelen bij AGV te laten in plaats van via de gezamenlijke rekening bij het groenfonds.



Projectcijfers per fase

Luwte- en overige maatregelen		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.050.000	€ 3.650.000	
Herzien projectbudget		-	-	
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 259.116	€ 259.116	
	in 2021	€ 152.524	€ 152.524	
	Totaal	€ 411.640	€ 411.640	
Resterend budget		€ 638.360	€ 3.238.360	

Extra tabel

Defosfatering		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	AGV besluit intern over besteding van dit budget; voortgang wordt wel aan SG gerapporteerd.
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.050.000	€ 3.650.000	
Herzien projectbudget		-	-	
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 537.029	€ 537.029	
	in 2021	€ 154.436	€ 154.436	
	Totaal	€ 691.465	€ 691.465	
Resterend budget		€ 1.708.535	€ 1.708.535	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022:

- Het verwachte effect van luwtemaatregelen (om opwerveling van slib te beperken) is in beeld gebracht. Het projectplan voor uitvoering van de maatregelen is opgesteld.
- De praktijkexperimenten gericht op ontwikkeling van waterplanten en het vasthouden van zwevend slib zijn voorbereid en gestart.

Risico's scope, planning, financiën

Luwtemaatregelen kunnen op verschillende manieren worden aangelegd. Een natuurlijke inpassing in het landschap (bijvoorbeeld rietstroken) draagt bij aan doelen op het gebied van waterkwaliteit (KRW) en natuur. Er is een risico dat de realisatie van deze luwtemaatregelen duurder zal zijn dan het beschikbare budget.



Project 1.8 Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap kievitsbuurten

Projecttrekker	Gemeente Stichtse Vecht		
Projectraming volgens UVP	€ 2.100.000 incl. stimuleringsregeling		
Fase project	Realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	20-11-2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Gezien de markt zit er langere levertijd op het benodigde materieel. Hierdoor zijn we later gestart dan gepland en is de kans vrij groot dat niet alle werkzaamheden voor 15 maart 2022 zijn afgerond.		
Betrokken partijen	We gaan nu met bevoegde gezagen in gesprek om akkoord te krijgen dat bepaalde werkzaamheden na 15 maart uitgevoerd mogen worden.		
Samenhang overige projecten	Gemeente Stichtse Vecht, Waternet/AGV, Vereniging Kievitsbuurten, Plassenschap Loosdrecht e.o.		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

- Uitvoeringsontwerp en bestek incl. begroting gereed en opgesteld in overleg met Plassenschap Loosdrecht, omgeving en de vereniging Kievitsbuurten.
- Benodigde vergunningen op orde.
- Er is een monitoringsplan opgesteld in overleg met Waternet.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

- In zomer 2021 zijn de schetsontwerpen uitgewerkt tot uitvoeringsontwerp en is een bestek incl. begroting opgesteld. Alles in overleg met en goedkeuring van het Plassenschap Loosdrecht, de omgeving en de vereniging Kievitsbuurten.
- Alle benodigde vergunningen (waaronder omgevingsvergunning, Wet Natuurbeheer, waterwet vergunning) zijn aangevraagd en verleend.
- In overleg met Waternet is een monitoringsplan opgesteld, dat vanaf start uitvoering in werking treedt.
- Begin december 2021 zijn de werkzaamheden van start gegaan. De wethouders van Stichtse Vecht en Wijdmeren hebben bij wijze van startmoment op 9 december 2021 een bouwboard onthuld.



Projectcijfers per fase

Luwte- en overige maatregelen		Fase	Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	Uitvoerings- fase	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 200.000	€ 2.100.000	€ 2.100.000	€ 900.000 stimuleringsregeling
Herzien projectbudget		-		-	
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 99.703		€ 99.703	Dit betreft een correctie op cijfers 2018/19
	in 2021	€ 76.696	€ 115.087	€ 191.783	
	Totaal	€ 176.399	€ 115.087	€ 291.486	
Resterend budget		€ 23.601	€ 884.913	€ 908.514	€ 900.000 stimuleringsregeling

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- Alle pilots zijn aangelegd en worden al een half jaar gemonitord.
- Uit de monitoringsresultaten blijkt hoe elke vooroever zich ontwikkeld waardoor inzicht is verkregen welke factoren met name van belang zijn voor de ontwikkeling van riet.

Risico's scope, planning, financiën

- Scope: we testen in hoeverre verschillende typen beschoeiing en methodieken achter de beschoeiing (wel geen bagger ingebracht, hooibalen, drijvende constructies) de groei van (met name) riet stimuleren. Zoals het er nu naar uitziet zullen de verschillende pilots overeenkomstig de ontwerpen uitgevoerd worden.
- Financieel: volgens berekening is het mogelijk om de pilots uit te voeren met het vastgestelde plafondbedrag. Er zijn wel extra kosten omdat er zes in plaats van vijf pilots worden uitgevoerd. Het is nog niet geheel duidelijk hoe hoog deze extra kosten zijn.
- Monitoring: het nauwkeurig volgen van ontwikkelingen (riet, eilanden) is van belang voor de pilots maar ook voor andere of vervolgprojecten. Voor de monitoring is extra materieel aangeschaft waardoor kosten hoger zijn dan oorspronkelijk begroot. Mochten er nog meer kosten komen dan zijn additionele middelen nodig.
- Planning: door het later aanleveren van materieel is de uitvoering later van start gegaan dan verwacht en gepland. Het is zeer waarschijnlijk dat niet alle werkzaamheden voor 15 maart zijn afgerond. In overleg met bevoegde gaan we kijken of en hoe welke werkzaamheden na 15 maart mogen worden uitgevoerd. Mocht dan op problemen stuiten, dan zullen de nog uit te voeren werkzaamheden in het najaar afgerond moeten worden. Dat heeft ook effect op de kosten: er moet opnieuw materiaal aan- en afgevoerd worden.

Pijler 2

Versterken ecologische waarden





Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Kortenhoef Oost

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.950.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	Vaststelling scopewijziging 04-10-2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Scope: de verwachting is dat individuele gesprekken met grondeigenaren door projectleider nodig zijn en veel tijd in beslag zullen nemen. Planning: planning is uitgelopen door toezegging second opinion en daaruit volgend veldonderzoek. Uitkomsten in vorm van kansencarta natuurwaarden mei 2022.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, Afvalzorg, VLEK, BAKEN.		
Samenhang overige projecten	Gelegen naast andere NNN-projectgebieden Ankeveen en Kortenhoef West ten noorden van de N201.		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

- Uitkomsten vervolgonderzoek.
- Nadere uitwerking ecologische visie.
- Bouwsteen recreatieve routes (in afstemming met project 1.1).
- Uitwerking uitplaatsingsplan en herontwikkeling enkele erven Emmaweg.
- Saneringsplan Groenewoud (incl. planuitwerking waterwoningen en nieuwe natuur).
- Goedkeuring plannen door SG.
- Eerste ontwerp integraal inrichtingsplan.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

De uitkomsten van het vervolg (veld) onderzoek zijn bekend, deze worden nu verwerkt naar een kansencarta natuurwaarden. De bouwsteen recreatieve routes dient in 2022 verder te worden uitgewerkt. Het eerste (concept) ontwerp integraal inrichtingsplan is nog niet gereed gekomen in 2021, wel zijn belangrijke stappen in die richting gezet. Groenewoud is in oktober door de nieuwe projectleider Kortenhoef Oost overgenomen. Het saneringsplan en uitplaatsingsplan zijn nog niet gereed.

Overige bijzonderheden

Vuilstort Groenewoud ligt in Kortenhoef Oost en heeft invloed op de water- en grondkwaliteit in het gebied en dus de mogelijke te realiseren natuurwaarden. Besluiten die de Provincie Noord-Holland in dit kader moet nemen, worden in 2022 voorgelegd en besloten.



Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 474.180	€ 1.950.000	
Herzien projectbudget		-	-	
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 52.661	€ 52.661	
	in 2021	€ 117.860	€ 117.860	
	Totaal	€ 170.521	€ 170.521	
Resterend budget		€ 303.659	€ 1.779.479	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- Afronden concept inrichtingsplan en kansenkaart.
- Opstarten gesprekken met grondeigenaren, naar verwachting eerst in het zuidelijke deel van het gebied.
- Eerste kosteninschatting realisatie gewenste natuurdoelen.
- Start invulling van het definitieve inrichtingsplan. Naar verwachting gaat dit in meerdere fases plaatsvinden, afhankelijk van wat in welk deel van het gebied wanneer mogelijk is.

Risico's scope, planning, financiën

- Als provincie Noord-Holland geen besluit neemt over de aanpak voor sanering van Groenewoud, dan dreigen partijen Afvalzorg en VLEK af te haken. Bij een beslissing om niet in de plannen mee te gaan staat de provincie Noord-Holland zelf aan de lat voor de sanering en het onderhoud daarvan.
- Pas als het concept inrichtingsplan gereed is en er zicht is op de benodigde werkzaamheden om natuurdoelen te realiseren, kunnen we meer melden over de financiële druk op het project. Dan weten we of met het (resterende) budget de scope bereikt kan worden.
- Onvoldoende draagvlak voor de plannen (bestuurlijk en/of politiek).
- Milieutechnisch (indien dit mocht blijken uit aanvullend onderzoek).
- Beschikbare kennis en capaciteit bij betrokken partijen.



Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Kortenhoef West

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 588.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	Vaststelling intakeformulier 04-10-2022		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Aangezien het project nog in de voorbereidende fase zit, is de voortgang op dit moment groen op alle vlakken.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, BAKEN.		
Samenhang overige projecten	Gelegen naast NNN-projectgebieden Ankeveen en Kortenhoef Oost ten noorden van de N201.		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

Geen, dit is eerste voortgangsrapportage voor dit project.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

Eerste kaartfoutenanalyse is afgerond, hieruit voortkomende kaartverbeteringen worden in de ambitiekaart aangepast. Voorbereidend werk voor PvA is gedaan.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 50.000	€ 588.000	
Herzien projectbudget		€ 50.000	€ 588.000	
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 5.507	€ 5.507	
	in 2021	-	-	
	Totaal	€ 5.507	€ 5.507	
Resterend budget		€ 44.493	€ 582.493	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- Goedkeuring PvA in eerste kwartaal 2022.
- Starten verkenningsfase in het tweede kwartaal 2022.
- Opstart projectgroep Kortenhoef West in tweede kwartaal 2022.

Risico's scope, planning, financiën

- Onvoldoende draagvlak voor de plannen (bestuurlijk en/of politiek).
- Milieutechnisch (indien dit mocht blijken uit aanvullend onderzoek).
- Beschikbare kennis en capaciteit bij betrokken partijen.



Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Ankeveen (HAP/SAP)

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.270.500		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	04-10-2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De afgelopen twee jaar is minder voortgang geboekt dan gewenst. Corona en wisseling van projectleider binnen de Provincie zijn hier o.a. debet aan.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, BAKEN		
Samenhang overige projecten	Gelegen naast NNN-projectgebieden Kortenhoef Oost en Kortenhoef West ten noorden van de N201		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

Geen, dit is eerste voortgangsrapportage voor dit project.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

PvA is goedgekeurd, de projectgroep is opgestart. De projectgroep heeft haar goedkeuring gegeven over de inhoud van de uitvraag die uitgezet gaat worden naar een extern bureau, met als resultaat een ecologische visie voor het gebied.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 300.000	2.691.000	
Herzien projectbudget			€ 2.361.000	
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 101.562	€ 101.562	
	in 2021	€ 31.624	€ 52.172	
	Totaal	€ 133.186	€ 133.186	
Resterend budget		€ 166.815	€ 2.227.815	



Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- Geaccordeerd schetsplan met 'gebiedsaanbod' van Vereniging Ster van Loosdrecht, als (mogelijke) basis voor een geactualiseerde collectieve overeenkomst voor natuurrealisatie en -beheer met de vereniging over haar gronden.
- Afstemming op KRW-maatregelen en Natura2000-beheerplan.
- Afronding van de verkenningsfase en PvA voor de fase van planvoorbereiding.

Risico's scope, planning, financiën

- Het schetsplan (gebiedsaanbod) van Vereniging Ster van Loosdrecht draagt niet of onvoldoende bij aan de doelen voor NNN, recreatie en waterkwaliteit en/of leidt tot discussie over de financiële gevolgen.



Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Weersloot

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.385.500		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	04-10-2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De planning loopt uit door: - toezegging aan Vereniging de Weersloot zelf een pilotschetsplan voor het gebied te maken en het traject om overeenstemming te krijgen over de uitgangspunten (ca. 6 maanden). - het bekendmaken van de voorkeurlocatie van een baggerdepot in Egelshoek, aan de rand van NNN Weersloot. Dat leidde tot weerstand in het gebied Weersloot, ook tegen de NNN-plannen. De pilot lag hierdoor een tijdje stil. Inmiddels is het weer voorzichtig op gang gekomen. Verdere voortgang hangt mede af van de definitieve keuze van de locatie van het baggerdepot - door de uitlopende planning gaan ook de kosten omhoog. De proceskosten lopen namelijk door.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, Vereniging de Weersloot		
Samenhang overige projecten	Samenhang met Recreatieve routes (project 1.1) en Faunapassages (project 2.3).		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

- Schetsplan met 'gebiedsaanbod' van Vereniging de Weersloot, naar verwachting is dit een (mogelijke) basis voor een collectieve overeenkomst voor natuurrealisatie en -beheer met de vereniging over haar gronden.
- Besluitvorming over dit 'gebiedsaanbod'.
- Plan en overeenkomst voor een (nieuwe) ecologische verbindingszone Egelshoek van Weersloot naar Eindegooi.
- Resultaten van aanvullend bodem en geohydrologisch veldonderzoek.
- Afspraken over tracé(s) wandel- en ruiterroutes (relatie met project 1.1. recreatieve routes).
- Afsluiting van de verkenningfase en start planuitwerking.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

- Het schetsplan van de Vereniging de Weersloot was eind 2021 in concept gereed en wordt begin 2022 aangeboden aan de provincie. Beoordeling en besluitvorming over dit gebiedsaanbod heeft daarom (nog) niet plaatsgevonden. Evenals het sluiten van (collectieve) overeenkomsten met de vereniging.
- Voor de ecologische verbindingszone Egelshoek zijn afspraken gemaakt met betrokken grondeigenaren, die in 2022 verder vorm krijgen (o.a. begrenzing NNN en invulling van (een groot deel van) de verbindingszone door particulier natuurbeheer).

Overige bijzonderheden

Het besluit om af te zien van het baggerdepot Egelshoek heeft er aan bijgedragen dat het proces weer is vervolgd.



Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 400.000	€ 2.385.000	
Herzien projectbudget		€ 400.000	€ 2.385.000	
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 136.687	€ 136.687	
	in 2021	€ 116.067	€ 116.067	
	Totaal	€ 252.754	€ 252.754	
Resterend budget		€ 147.247	€ 2.132.247	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- Schetsplan met 'gebiedsaanbod' van Vereniging de Weersloot is (mogelijke) basis voor een collectieve overeenkomst voor natuurrealisatie en -beheer met de Vereniging over haar gronden.
- Besluitvorming over dit 'gebiedsaanbod'.
- Visie voor de vormgeving en inrichting van de ecologische verbindingszone Egelshoek.
- Afsluiting van de verkenningsfase en PvA voor de fase planuitwerking.

Risico's scope, planning, financiën

Het schetsplan (gebiedsaanbod) van Vereniging de Weersloot draagt niet of onvoldoende bij aan de doelen voor NNN, recreatie en waterkwaliteit en/of leidt tot discussie over de financiële gevolgen.



Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Ster van Loosdrecht

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.691.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	04-10-2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De voortgang vertraagd. De vereniging heeft meer tijd nodig gehad om het gebiedsaanbod te actualiseren. Aanvullend onderzoek is daardoor ook nog niet gestart. Daarmee lopen de proceskosten voor deze fase langer door.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, Vereniging Ster van Loosdrecht		
Samenhang overige projecten	Samenhang met Recreatieve routes (project 1.1) en Fauna-passages (project 2.3) .		

Resultaatbereik 2021

Beoogde resultaat op 31 december 2021

- Schetsplan met 'gebiedsaanbod' van Vereniging Ster van Loosdrecht, als (mogelijke) basis voor een geactualiseerde collectieve overeenkomst voor natuurrealisatie en -beheer met de vereniging over haar gronden.
- Besluitvorming over dit 'gebiedsaanbod'.
- Resultaten van mogelijk aanvullend bodem en geohydrologisch veldonderzoek.
- Afspraken over tracé(s) wandel- en ruiterroutes (relatie met project 1.1 Recreatieve routes).

Progressie op hoofdlijnen in 2021

Het jaar 2021 stond vooral in het teken van de voorbereiding van het gebiedsaanbod. In oktober 2021 is het gebiedsaanbod van Vereniging Ster van Loosdrecht aangeboden. Het laatste kwartaal van 2021 is gebruikt om dit aanbod te beoordelen. De voortgang is daarmee achtergebleven ten opzichte van de planning.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 300.000	€ 2.691.000	
Herzien projectbudget			€ 2.361.000	
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 101.562	€ 101.562	
	in 2021	€ 31.624	€ 52.172	
	Totaal	€ 133.186	€ 133.186	
Resterend budget		€ 166.815	€ 2.227.815	



Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- Geaccordeerd schetsplan met 'gebiedsaanbod' van Vereniging Ster van Loosdrecht, als (mogelijke) basis voor een geactualiseerde collectieve overeenkomst voor natuurrealisatie en -beheer met de vereniging over haar gronden.
- Afstemming op KRW-maatregelen en Natura2000-beheerplan.
- Afronding van de verkenningfase en PvA voor de fase van planvoorbereiding.

Risico's scope, planning, financiën

Het schetsplan (gebiedsaanbod) van Vereniging Ster van Loosdrecht draagt niet of onvoldoende bij aan de doelen voor NNN, recreatie en waterkwaliteit en/of leidt tot discussie over de financiële gevolgen.



Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Vuntus

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 599.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	04-10-2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Er was onvoldoende capaciteit beschikbaar om de beoogde doelen voor 2021 te behalen. Deze capaciteit wordt momenteel gezocht.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, VONA		
Samenhang overige projecten	Samenhang met Recreatieve routes (project 1.1) en Fauna-passages (project 2.3)		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaten per 31 december 2021:

- 'Menukaart ecologische meerwaarde' tuinen VONA-terrein + een PvE/schets natuurverbindingen en maatregelen directe omgeving.
- Besluitvorming over 'Menukaart ecologische meerwaarde'.
- Diverse overeenkomsten particulier natuurbeheer met individuele grondeigenaren.
- Inrichtingsschetsen en implementatie eerste afspraken met tuineigenaren VONA.
- Uitgewerkt maatregel-/inrichtingsplan wandeldoorsteek Vuntus – Kromme Rade (relatie met 1.1 recreatieve routes), daarin ook verwerkt aanloopgebied faunapassage Oud-Loosdrechtsedijk.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

De menukaart 'ecologische meerwaarde' voor het VONA-terrein is afgerond en er is een eerste inventarisatie gemaakt voor mogelijke ecologische verbindingen over het terrein. Er zijn afspraken gemaakt met individuele grondeigenaren over particulier natuurbeheer.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning en realisatie	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 170.000	€ 599.000	
Herzien projectbudget		-	€ 599.000	
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 73.878	€ 73.878	
	in 2021	€ 62.253	€ 62.253	
	Totaal	€ 136.131	€ 136.131	
Resterend budget		€ 33.869	€ 442.869	



Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- Uitgewerkt voorstel voor meerdere ecologische verbindingen over het VONA-terrein.
- Definitieve afspraken met tuineigenaren VONA over toepassing van de menukaart 'ecologische meerwaarde', vastgelegd in een overeenkomst.
- Afronding van de verkenningsfase voor de overige delen van Vuntus, inclusief een visie op de inrichting van het gebied en bijbehorende afstemming met stakeholders en grondeigenaren.

Risico's scope, planning, financiën

In 2021 is er minder bereikt dan vooraf gedacht. Dit komt met name door de beschikbare capaciteit (zowel intern als extern). Dit is ook een risico voor 2022.



Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Het Hol

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 900.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	18-07-2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De scope van het project omvat zowel realisatie nieuwe NNN, als kwaliteitsverbetering N2000 en KRW-doelen. Het concept inrichtings- en herstelplan is vastgesteld in de stuurgroep van 30 juni 2021. Om het project te kunnen realiseren is een scherpere afbakening van de scope nodig. Er is extra geld aangevraagd vanuit de budgetten voor N2000-herstelmaatregelen en Programma natuur (SPUK). De raming is echter hoger dan het totaal aangevraagde budget, zodat alsnog keuzes nodig zijn. In afwachting hiervan loopt ook de planning uit.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Waternet/AGV, Natuurmonumenten.		
Samenhang overige projecten	Het project is onderdeel van 2.1 realiseren natuurnetwerk.		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

- Vastgesteld inrichtings- en herstelplan voor het Hol.
- Geactualiseerde scope vastgesteld door de stuurgroep.
- Vastgestelde raming voor voorbereidings- en uitvoeringsfase.
- Financieringsvoorstel.
- Projectvoorstel voor de vervolgfases van het project.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

Het inrichtings- en herstelplan is als concept vastgesteld in de stuurgroep van 30-06-2021. Op basis van de nieuwe scope wordt de raming bijgesteld. Er is in 2021 financiering aangevraagd vanuit de budgetten voor N2000-herstelmaatregelen en Programma natuur (SPUK).



Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 900.000	€ 900.000	Voor de waterdoelen is € 250.000 beschikbaar bovenop het project-budget.
Herzien projectbudget		-	-	Het projectbudget moet herzien worden.
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 343.491	€ 343.491	
	in 2021	€ 50.142	€ 50.142	
	Totaal	€ 393.633	€ 393.633	
Resterend budget		€ 506.367	€ 506.367	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- Besluitvorming over de uitwerking en financiering van het inrichtings- en herstelplan.
- Vastleggen van de afspraken tussen de deelnemende organisaties.
- Starten met de uitwerking van de onderdelen van het plan tot een definitief ontwerp.

Risico's scope, planning, financiën

De scope van het project is nog niet vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor de planning van het project.



Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Horstermeerpolder

Dit project valt grotendeels buiten het uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen. De financiering is geregeld via de Groene Uitweg. Vanwege de raakvlakken worden hieronder wel de hoofdlijnen geschetst.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

Voor de natuurontwikkeling Horstermeerpolder Zuid is in 2021 gezocht naar een nieuwe projectleider om het proces weer vlot te trekken. De projectleider is gevonden, een herstart is gemaakt.

Voor het gebiedsproces Horstermeerpolder Noord zijn met de deelnemers aan de kavelruil flinke stappen gezet. Er wordt gewerkt aan grondruilingen- en verkopen.

Verwachte resultaten per 31 december 2022

Voor de natuurontwikkeling Horstermeerpolder Zuid wordt toegewerkt naar een gedragen inrichtingsplan.

Dit plan zal eind 2022 gereed zijn. Ten aanzien van het gebiedsproces is de verwachting dat met een aantal deelnemers tot een ruiling en verkoop wordt gekomen.



Project 2.2a Ecologische verbindingen - N201

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.071.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	Dit project is voor 2017 gestart en gefinancierd, dus buiten de SG om.		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	In 2021 heeft herijking van het project (faunamaatregelen, vervanging bruggen, onderhoud, en overige maatregelen) plaatsgevonden om de scope en integraliteit van de maatregelen helder te krijgen. De nieuwe scope is vastgelegd in een projectwijziging en vastgesteld in het opdrachtenloket. Op basis van de herijking is ook de planning bijgesteld.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Gemeente Hilversum, Regio Gooi en Vechtstreek, Waternet/AGV, gebiedsaannemer, ingenieursbureau, particuliere grondeigenaren en ondernemers.		
Samenhang overige projecten	Het aanbrengen van de faunapassages valt onder een trajectbenaderingsproject: dit betekent dat de uitvoering van de faunapassages is gekoppeld aan onderhoudswerkzaamheden en het vervangen van 2 bruggen van de N201. Elk infra- en natuurontwikkelingsproject in het gebied, waaronder 't Hol, aanpassingen Zuwe, aansluiting Utrechts deel N201.		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

- Herijking van het trajectbenaderingsproject is vastgesteld.
- De nieuwe scope was de basis voor een uitvraag aan een ingenieursbureau om het project in bouwteamverband voor te bereiden op de uitvoering.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

Afronding van de herijking van de scope, incl. beeld van een planning, raming en risico's. De nieuwe scope is vastgesteld.



Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerking Realisatie	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 2.071.000	€ 2.071.000	
Herzien projectbudget		-	-	
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 19.443	€ 19.443	
	in 2021	€ 30.827	€ 30.827	
	Totaal	€ 50.270	€ 50.270	
Resterend budget		€ 2.020.730	€ 2.020.730	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- Start planfase; in bouwteamverband bereiden de gebiedsaannemer, het ingenieursbureau en de provincie het project voor op de uitvoering.
- Contractdocumenten gereed, inclusief ontwerp.
- Mogelijkheden voor IFD bouwen, duurzaamheid uitgewerkt en opgenomen in de scope.
- Start uitvoeringsfase gebiedsaannemer, waaronder DO/UO.
- Planning uitvoering is 2023/2024.

Risico's scope, planning, financiën

De wijze van aanleg van de faunapassages wordt nog uitgewerkt. Mogelijkheden zijn de een bredere aanleg van de brug en het toepassen van loopplanken. Ook is het boren in de tunnelwand een optie. In de bouwteamsamenwerking met de aannemer, het IB en de provincie zal dit uitgewerkt worden. Ook het eventuele conflict met K&L en de oplossingen en kosten wordt dan inzichtelijk. De verwachting is dat rond half 2022 een goed beeld is van het ontwerp en de kosten. Uit de herijking van het project is gebleken dat er voldoende budget lijkt te zijn om risico's voor de faunamaatregelen af te kunnen dekken.

Ander risico is vertragingen in de planning i.v.m. het doorlopen van planprocedures, jaar rondonderzoeken, verleggen K&L. In de planfase zal duidelijk worden of deze risico's vervallen op optreden.



Project 2.2b Ecologische verbindingen - Faunapassages

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.800.000		
Fase project	Planuitwerking en realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	12-07-2019 (gele brug-Ankeveen) 20-11-2019 (PvA)		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Voortgang wacht op indienen en vaststellen van nieuwe PvA inclusief nieuwe planning.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Regio Gooi en Vechtstreek, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, particuliere grondeigenaren en ondernemers.		
Samenhang overige projecten	Alle infra- en/of natuurontwikkelingsproject in het gebied.		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

- Overleg gevoerd met gemeente Wijdmeren over gepland onderhoud en de daarbij te combineren faunapassages.
- Voor overige passages plan en planning opgesteld.
- Opdrachten voor beoogde faunapassages zijn verstrekt.
- Afspraken gemaakt met 'IPM-gebied 7' over opname van faunapassages in gebiedscontract van de provincie Noord-Holland.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

- Voor alle voorgestelde locaties zijn specificaties opgesteld en besproken met betrokken partijen. Op twee locaties (VII Oud-Loosdrechtsedijk en IX Nieuw-Loosdrechtsedijk) is samen met grondeigenaren ook een Kwalitatieve verplichting (overeenkomst) opgesteld, waardoor de toeloop naar de te plaatsen passage is veiliggesteld.
- Er is contact gelegd met projectleider van de gemeente Wijdmeren met betrekking tot de reconstructie van de Nieuw Loosdrechtsedijk. Er wordt samen onderzocht of passage IX met de reconstructie kan worden meegenomen. De passage ligt net buiten het gebied, maar gekeken wordt naar een mogelijkheid om slechts één maal de weg af te sluiten.
- Door interne problemen (bijvoorbeeld het verkrijgen van de juiste codes om tijd te kunnen schrijven door de afdeling ingenieursdiensten van de provincie) zijn de beoogde resultaten verder nog niet behaald.



Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerking Realisatie		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 165.000	€ 1.800.000	
Herzien projectbudget		-	-	
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 98.742	€ 98.742	Uitgaven realisatie Gele Brug door WM
	in 2021	-	-	
	Totaal	€ 98.742	€ 98.742	
Resterend budget		€ 66.758	€ 1.701.258	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- We leggen vernieuwd PvA voor inclusief voorstel tot nieuwe/te schrappen locaties. Deze nieuwe versie is geschreven naar aanleiding van de wisseling van projectleider en het nieuwe zicht op het vervolg in het proces/de planning.
- Ecologisch adviesbureau betrekken voor meer exacte uitwerking van faunapassages op vastgestelde locaties.
- Overleg met gemeente Wijdmeren over gepland onderhoud en daarbij te combineren faunapassages.

Risico's scope, planning, financiën

Als blijkt dat slechts een klein deel van de passages bij andere projecten meegenomen kunnen worden, vallen de uitvoeringskosten voor de overige passages hoger uit. De kosten zitten niet zozeer in de aanleg van de faunabuizen/-planken als wel in de afrastering en de inrichting van de toegangen. Ook de aanwezigheid van kabels en leidingen vormt een risico (dat we mogelijk in de verdere uitwerking kunnen omzeilen). Vooralsnog lijkt het financieel goed mogelijk om het project binnen budget af te ronden. Uitwerking van de passages en de planning van het wegbeheer van de gemeente zorgen in de loop van 2022 voor een beter beeld.



Project 2.3 Verbeteren waterkwaliteit

Projecttrekker	Waternet/AVG		
Projectraming volgens UVP	€ 4.350.000		
Fase project	Planuitwerking en realisatie		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	12-12-2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	- Scope voor Spiegelplas is gewijzigd: het is effectiever om polderwater en inlaatwater via een fosfaatfilter te leiden dan om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. - Uitvoering van onderdelen van het project loopt vertraging op als gevolg van aanvullend onderzoek naar de meest effectieve methode voor defosfatering. - De kosten voor beperken fosfaatbelasting (defosfatering) zijn hoger dan in het verleden geraamd.		
Betrokken partijen	Waternet/AGV, Gemeente Wijdmeren, Gemeente Hilversum, Natuurmonumenten, diverse bewonersverenigingen		
Samenhang overige projecten	Samenhang met Zwevend slib en waterplanten (project 1.7.2), het legakkerherstel in de Kievitsbuurten (project 1.8) en NNN-realisatie (project 2.1)		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

- Besluit over de meest geschikte defosfateringstechniek voor de te bouwen installatie in Kortenhoef-west.
- Omleiden waterstroom vanuit achterland Hollands Ankeveense Plassen is eind 2021 in uitvoering.
- Besluit over inrichtingsplan voor NNN-realisatie de Ster met daarin opgenomen het polderdoorstroom-principe (en de locatie van de defosfateringsinstallatie van project 1.7.2).

Progressie op hoofdlijnen in 2021

- Een traditionele defosfateringsinstallatie blijkt meest geschikt voor de te bouwen installatie in Kortenhoef-west.
- Het omleiden waterstroom vanuit achterland Hollands Ankeveense Plassen is bijna afgerond.
- De planuitwerking voor NNN-realisatie de Ster met daarin opgenomen het polderdoorstroomprincipe loopt nog.

Overige bijzonderheden

Er worden meer maatregelen uitgevoerd voor de verbetering van de waterkwaliteit dan in het gebiedsakkoord zijn opgenomen. Voor de KRW-periode 2022-2027 zijn aanvullende maatregelen opgenomen in het stroom-gebiedbeheerplan; een groot deel van deze maatregelen draagt ook bij aan Natura2000-doelstellingen en zijn om die reden ook het in N2000-beheerplan voor de Oostelijke Vechtplassen opgenomen.



Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PVA SG / volgens UVP		€ 4.350.000		Omdat de uitvoering van de KRW-maatregelen geheel bij het waterschap AGV ligt en per maatregel subsidie wordt aangevraagd, is afgesproken om de financiën van deze maatregelen bij AGV te laten i.p.v. via de gezamenlijke rekening bij het groenfonds.
Herzien projectbudget		-		Toegezegd is € 420.000 van waterschap AGV en € 1.336.930 via beschikkingen LIFE/POP/PAS-subsidies. Overige subsidies ter waarde van € 1.793.070 zijn door de provincie Noord-Holland toegezegd vanuit het programma Natuur.
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 405.743	€ 405.743	
	in 2021	€ 302.566	€ 302.566	
	Totaal	€ 708.309	€ 708.309	
Resterend budget		€ 3.641.691	€ 3.641.691	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- Eind 2022 is de planuitwerking gereed voor de defosfateringsinstallaties bij de Spiegelpolder en de Kortenhoefse Plassen.
- Het onderzoek naar het beperken van de fosfaatbelasting in het Hilversums Kanaal is afgerond en er is een besluit genomen over het al dan niet realiseren van een defosfateringsinstallatie.
- De gewijzigde afvoer van polderwater uit de Spiegelpolder en het omleiden van de waterstroom vanuit het achterland Hollands Ankeveense Plassen zijn gerealiseerd.
- Er zijn afspraken gemaakt over de realisatie en financiering van het onderdeel herstel invloed kwelwater 't Hol en Suikerpot uit het Inrichtingsherstelplan 't Hol/Suikerpot.
- Het projectplan voor het instellen van het polderdoorstroomprincipe Weersloot is vastgesteld.
- Het instellen van het polderdoorstroomprincipe in de Ster is opgenomen in het inrichtingsplan voor de Ster.

Risico's scope, planning, financiën

Eind 2027 moeten KRW-doelen zijn gehaald. Voor die tijd moeten alle bijbehorende KRW-maatregelen zijn uitgevoerd. Omdat het over het algemeen enige tijd duurt voordat maatregelen effect hebben, moeten deze bij voorkeur ruim voor 2027 zijn uitgevoerd.



Project 2.4.1 Nieuw habitat moerasvogels op privaat eigendom

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 600.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	Geen		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	- Scope: Interesse is nog beperkt. Er zijn gegadigden om maatregelen te treffen, maar deze voldoen niet altijd aan de subsidievoorwaarden. Een subsidieaanvraag vergt een voorinvestering. Onderzocht wordt of en hoe het programmteam OVP vooraf meer inzicht kan geven in de kansrijkheid van een eventuele SKNL-subsidieaanvraag gezien het beoogde doel van project 2.4.1. - Planning (afrondding in 2024): haalbaarheid is afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland		
Samenhang overige projecten	Project hangt samen met NNN-realisatie (project 2.1), verbeteren waterkwaliteit (project 2.3), maatregelen voor moerasvogels (project 2.4.3), ganzenbeheer (project 2.5.1) en ganzenvraat (project 2.5.2).		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

Dit project beoogt circa 40 ha bestaand bos (uitgezonderd kwalificerend veenbos (H91D0) of een ander kwalificerend habitattype) om te vormen tot waardevol rietland waarvan het beheer duurzaam is geregeld, bijvoorbeeld door beheerafspraken met particulieren, vrijwilligers en in combinatie met verdienmodellen (ondernemers). Het budget van dit project (max. € 600.000) is gelabeld aan de Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland (SKNL). Subsidie is mogelijk voor twee onderdelen:

- **functieverandering:** compensatie voor de waardedaling aan grondeigenaren als de functie landbouwgrond definitief wordt omgezet in natuurground.
- **investering:** voor de volgende extra inrichtingsmaatregelen (vaak na functieverandering) om de gewenste natuur te kunnen krijgen:
 - realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond
 - verhogen van de natuurkwaliteit op een bestaand natuurterrein
 - omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

Interessepeiling is gedaan. Er hebben zich 6 particulieren gemeld met interesse voor maatregelen voor moerasvogels op hun eigendommen. Voor de percelen van de eigenaren die zich hebben gemeld, gaat het om investeringen om de natuurkwaliteit op bestaand natuurterrein te verhogen of om het omzetten naar een ander natuurbeheertype. Een deel van de percelen is momenteel geen bos maar water. Een ander deel is weliswaar bos, maar met een kwalificerend veenbos (H91D0) of een ander kwalificerend habitattype.

Om alsnog het doel te behalen (40 ha bos omvormen), zal komend jaar een aanvullende interessepeiling worden gedaan. Ondersteuning vanuit het provinciale Regiebureau is nodig om inzicht te geven in de kansrijkheid van een eventuele SKNL-subsidieaanvraag. Met particulieren die voldoen aan de eisen, wordt contact opgenomen om afspraken te maken over een subsidieaanvraag en over het beheer na inrichting.



Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 25.000	€ 600.000	
Herzien projectbudget			€ 600.000	
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 24.909	€2 4.909	
	in 2021		-	
	Totaal		-	
Resterend budget		€ 91	€ 575.091	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

Aanvullende interessepeiling.

Risico's scope, planning, financiën

Voornaamste risico is het ontbreken van interesse van de doelgroep onder de voorwaarden van de regeling. Beheermaatregel is het maken van afspraken met geïnteresseerde particulieren die bereid zijn bestaand bos (uitgezonderd kwalificerend veenbos (H91D0) of een ander kwalificerend habitatype) om te vormen tot waardevol rietland en dat duurzaam te beheren.



Project 2.4.3a Planuitwerking natuurmaatregelen voor moerasvogels

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 5.500.000 (na herschikking, oorspronkelijk € 5,6 mio. in raming baggeren)		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	04-10-2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	- Planning: paar maanden vertraging in de selectie van deelgebieden voor de periode 2022-2024. - Financiën: er is een taakstellend budget afgesproken. Tijdens de planuitwerking wordt gezien hoe dat budget het best besteed kan worden.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Natuurmonumenten, Waternet/AGV.		
Samenhang overige projecten	Project hangt samen met Baggeropgave (project 1.7), NNN-realisatie (project 2.1), verbeteren waterkwaliteit (project 2.3), nieuw habitat voor moerasvogels op privaat eigendom (project 2.4.1), verlanding (project 2.4.4), ganzenbeheer (project 2.5.1), ganzenvraat (project 2.5.2) en het bestrijden van exoten (project 2.6).		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

Uitwerking van kansrijke maatregelen gereed, start vergunningverlening kansrijke maatregelen, nieuwe aanvraag LIFE subsidie verkend/ingediend.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

Uitwerking van kansrijke maatregelen is gereed en er is een start gemaakt met de planuitwerking. De aanvraag voor LIFE subsidie is verkend en uitgesteld.



Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 422.500	€ 726.840 (initiatief, verkenning én planuitwerking) € 214.000 (aanschaf Nieuwe Polderplas) € 31.000 (onderzoek Nieuwe Polderplas) € 4.530.000 (realisatie)	
Herzien projectbudget		-	€ 5.255.000 (na aftrek kosten Nieuwe Polderplas)	
Totaal besteed:	t/m 2020	-	€ 216.917	
	in 2021	-	€ 85.551	
	Totaal	-	€ 302.468	
Resterend budget		€ 422.500	€ 4.952.532	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

Aanvullend onderzoek, inrichtings- en beheerplan, contractdossier, vergunningaanvragen maatregelen in de periode 2022-2024.

Risico's scope, planning, financiën

Intensiever beheer nodig

- Oorzaken: het resultaat van maatregelen is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de vegetatie na uitvoering van de maatregelen. En is waarschijnlijk intensiever beheer noodzakelijk.
- Gevolg: toename beheerkosten
- Beheermaatregel: kosten van de eerste jaren als nabehoor opnemen in de inrichtingskosten en in het bestek met de aannemer. Daarna extra beheer regelen via de volgende N2000-beheerplanperiode.

Strengere eisen aan de toepassing van gebiedseigen materialen

- Oorzaken: Waternet stelt strenge eisen aan de kwaliteit van toe te passen gebiedseigen materialen en structuur.
- Gevolg: toename kosten door de beperkte hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende materialen en de noodzaak van de levering van (gebiedsvreemde) materialen.
- Beheermaatregel: nader onderzoek naar de gevolgen van toepassing van gebiedseigen materialen op de waterkwaliteit.

Marktwerving

- Oorzaken: er worden op dit moment veel projecten in de markt gezet, er is minder concurrentie, grondstoffen worden duurder, oorspronkelijke ramingen hebben prijspeil 2021
- Gevolg: toename kosten maatregelen
- Beheermaatregel: nieuwe SSK-raming, taakstellend budget afspreken.



Project 2.4.3b Realiseren natuurwerk Nederland (NNN) - Nieuwe Polderplas

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	Niet geraamd		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	12-7-2019 en 11-09-2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Door het wijzigen van de uitgangspunten is de scope onduidelijk geworden. Op deze plek heeft de moerasnatuur namelijk relatief weinig meerwaarde voor moerasvogels. Daarnaast is er twijfel of bagger uit de plassen ook ter plaatse kan worden toegepast. Waternet/AGV ontwikkelt hier nu gebiedsgericht beleid op. De planning is vertraagd in afwachting van besluitvorming baggeropgave.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Waternet/AGV/Gemeente Amsterdam, Gemeente Wijdereen.		
Samenhang overige projecten	Samenhang met baggeropgave (project 1.7.1), maatregelen voor moerasvogels op privaat eigendom (project 2.4), recreatieve routes (project 1.1) en het realiseren van het icoon van Loosdrecht (project 1.6).		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

Besluitvorming stuurgroep over mogelijke doorstart en vervolg op verkenning van de ontwikkelmogelijkheden van de Nieuwe Polderplas. Waternet werkt aan de ontwikkeling van gebiedsgericht beleid voor de toepassingsmogelijkheden van bagger voor onder andere in de Nieuwe Polderplas.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

Er is in 2021 (nog) geen vervolg gegeven aan de verkenning die in 2020 is uitgevoerd, in afwachting van het gebiedsgericht beleid en de toepassingsmogelijkheden van bagger. Bewoners en betrokken partijen zijn in het najaar van 2021 geïnformeerd over de status van het project.



Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Initiatief	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 62.000	€ 62.000	Project staat niet opgenomen in het UVP; financiering komt voor 50-50% vanuit project bagger (1.7.1) en Verkenning maatregelen moerasvogels (2.4.3).
Herzien projectbudget		-	-	
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 23.800	€23.800	Excl. aanschafkosten van € 648.000
	in 2021	-	-	
	Totaal	€ 23.800	€ 23.800	
Resterend budget		€ 38.200	€ 38.200	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

Afronding van de initiatieffase met oplevering van de resultaten van de quick-scan. Besluit door stuurgroep over mogelijke doorstart en vervolg van de verkenning.

Risico's scope, planning, financiën

Verwachte resultaten 2022 zijn afhankelijk van het gebiedsgerichte beleid Waternet. Voortgang op dit project vergt duidelijkheid over de toepasbaarheid van baggerslib in de Nieuwe Polderplas.



Project 2.5.1 Plan van aanpak populatiebeheer ganzen

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.000.000 (€ 100.000/jaar)		
Fase project	Planuitwerking en realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	26-02-2020		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Waternet/AGV/Gemeente Amsterdam, Natuurmonumenten, Wildbeheereenheid Gooi en Vechtstreek, Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord, Faunabeheereenheid, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang overige projecten	Samenhang met project Ganzenvraat (project 2.5.2) en Maatregelen voor moerasvogels (project 2.4.3).		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

Ganzenbeheer

De gecoördineerde intensivering van het ganzenbeheer en bijbehorende maatregelen door de WBE Gooi en Vechtstreek wordt voortgezet, met naar verwachting een verdere afname van het aantal ganzen.

De ganzenwerkgroep OVP levert inhoudelijke input aan de Faunabeheereenheid voor de afronding van het Ganzenbeheerplan (2021-2027) en het N2000 beheerplan.

Ganzenvraat

De bestaande rasters krijgen een optimaliseringsslag. Er is een nieuw uitvoeringsprogramma voorzien en goedgekeurd voor de komende periode.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

Ganzenbeheer

- In 2021 zette de Wildbeheereenheid (WBE) extra in op gecoördineerde en geïntensiveerde uitvoering van ganzenbeheer in de Loosdrechtse plassen en op de gronden binnen en net buiten het Natura 2000-gebieden. Er is een koelcel aangeschaft. Coronamaatregelen en de vogelgriep vormden een belemmering in de uitvoering. De Rapportage gecoördineerde aanpak ganzenbestrijding in de Oostelijke Vechtplassen 2021 (door WBE) is opgeleverd. Afstemming over de uitvoering vond plaats in de ganzenwerkgroep OVP. Vanaf 2022 wordt genoemde constructie met de WBE niet meer toegepast en zetten we in op de gecoördineerde aanpak vanuit de Faunabeheereenheid (FBE).
- In 2021 is het Faunabeheerplan Ganzen Noord-Holland 2021-2024 (door FBE) vastgesteld waarvoor de ganzenwerkgroep OVP input geleverd heeft. De FBE heeft vervolgens voor de regio Gooi en Vecht een uitvoeringsplan opgesteld voor een gecoördineerde aanpak van ganzen.
- Uit de jaarlijkse vogeltellingen blijkt een dalende trend in het aantal grauwe ganzen in de Oostelijke Vechtplassen: 2019: 4.801, 2020: 4.439, 2021: 4.085. In de provincie als geheel was in diezelfde periode juist sprake van een lichte stijging.
- De ganzenwerkgroep OVP leverde input voor het Natura2000 beheerplan over de vast te leggen werkzaamheden voor het beheer van de ganzenpopulatie waardoor bij inwerkingtreding van het plan de noodzakelijke acties vergunning-vrij kunnen worden uitgevoerd. De opgestelde passende beoordeling geeft de spelregels/randvoorwaarden aan waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.



Ganzenvraat

- Voor het monitoren van de effectiviteit van de geplaatste 8 tot 10 km aan rasters heeft de stuurgroep besloten middelen beschikbaar te stellen. Zo kunnen we met een drone nut en noodzaak van ganzenrasters op de lange termijn bepalen. In het project Maatregelen voor moerasvogels is het plaatsen van nog eens 15 km aan rasters opgenomen.
- De aannemer heeft noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan de eerder geplaatste rasters. Het 3-jarig onderhoudscontract (einde 2021) wordt voor nog eens drie jaar verlengd.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 284.500	€ 100.000	€ 7.000 verschoven naar project 2.5.2 Noodmaatregel Ganzenvraat
Herzien projectbudget			€ 993.000	
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 162.489	€ 162.489	
	in 2021	€54.864	€ 54.864	
	Totaal	€ 217.353	€ 217.353	
Resterend budget		€67.147	€775.648	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

Ganzenbeheer

- Uitvoering van de gecoördineerde aanpak en opleveren jaarlijkse twee evaluaties FBE.
- Uitvoering van nulmeting middels broedpaartelling in maart/april.

Ganzenvraat

- Monitoring: uitvoeren van drone-inventarisatie van rietkragen rond mei 2022 met rapportage over effectiviteit rasters en voorstel voor vervolgaanpak. Nieuw onderhoudscontract voor het noodzakelijk onderhoud aan de geplaatste rasters.

Risico's scope, planning, financiën

- Een uitbraak van vogelgriep belemmert de werkzaamheden in het gebied en coronabeperkingen bemoeilijken de uitvoering van ganzenbeheer en rasteroptimalisatie. Met name de 1,5-meterregel heeft impact: een effectieve aanpak van de ganzenpopulatie is dan niet mogelijk met natuurschade als gevolg (waterkwaliteit en rietkragen). Beheermaatregel: geen.
- Vaststelling van het Natura2000 Beheerplan voor de Oostelijke Vechtplassen is nodig voor het verruimen van de maatregelen die genomen kunnen worden in het ganzenbeheer. Beheermaatregel: bij vertraagde vaststelling kan een reguliere vergunning aangevraagd worden (met minder beheermogelijkheden). Vanwege de lange proceduretijd moet deze tijd worden aangevraagd.



Project 2.5.3 Bestrijding exoten

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.000.000 (waarvan 50% cofinanciering)		
Fase project	Planuitwerking en realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	15-12-2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Door personeelwisseling en een afgeketste aanbesteding heeft het opstellen van het beheerplan Aanpak cabomba vertraging opgelopen.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Natuurmonumenten, Vereniging samen cabomba aanpakken (VSCA), Waternet/AGV, Watersportverbond, Hiswa-Recron, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang overige projecten	Project hangt samen met baggeropgave (project 1.7), NNN-realisatie (project 2.1), maatregelen voor moerasvogels (2.4.3) en mesotrofe verlanding (project 2.4.4).		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

Cabomba

De driejarige functiegerichte aanpak van cabomba in de Oostelijke Vechtplassen loopt dit jaar af. Het kernteam stelt een evaluatierapport op over de bereikte resultaten en geeft advies over een vervolg. Er worden losse pilots ingezet om verdere verspreiding tegen te gaan. Ook wordt verkend hoe een structurele aanpak kan worden ingericht (inzet, investeringen middelen en calamiteitenfonds).

Kreeften

Door het participeren in het kreeftenonderzoeksproject Molenpolder weten we eind 2021 meer over het gedrag van de kreeften en hebben we beter inzicht welke vangtuigen geschikt zijn in ruimte en tijd. In 2021 kan vanuit het kernteam (onder regie van de gemeente) een vervolg gegeven worden aan het kreeftenfestival.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

- Evaluatierapport aanpak exoten OVP 2018-2020 is opgesteld en gedeeld met regie- en stuurgroep in mei/juni 2021.
- Met subsidie vanuit de oude PAS-regeling van € 90.000 is een herverdeling van de budgetten voor het bestrijden van cabomba en kreeften doorgevoerd. In de stuurgroep van december 2021 is een realistisch budget voor de opgaven in de resterende maanden vastgesteld.

Cabomba

- Opdracht voor het opstellen van het beheerplan aanpak cabomba is aanbesteed, geformuleerd en wordt begin 2022 getekend.
- De evaluatie van de functiegerichte aanpak is uitgevoerd. Deze evaluatie vormt de basis voor het nieuwe beheerplan.
- De pilot in 't Hol is gestart waarbij we 't Hol met rasters hebben afgesloten van het Moleneind. Deze rasters moeten cabomba tegenhouden terwijl de vissen er onderdoor kunnen zwemmen.



- Ten noorden van het Hilversums Kanaal is de aanwezigheid van cabomba en ongelijkbladig vederkruid geïnventariseerd.
- Over het tegengaan van het verspreiden van cabomba is breed gecommuniceerd in het gebied (bewonersbrief). Op strategische plekken in het gebied (havenkantoor porseleinhaven, diverse sluizen) zijn folders en stickers met instructies en achtergrondinfo afgeleverd om toeristen te informeren en hun medewerking te vragen.
- Monitoringsrapport 2021 is opgeleverd.

Kreeften

Het habitat onderzoek in de Molenpolder naar natuurherstel door het beheersen van de kreeftenpopulatie loopt nog. De tussentijdse resultaten zijn teruggekoppeld. Het onderzoek is uitgebreid met een Environmental DNA (eDNA) component. Dit is een nieuwe methode waarbij de aanwezigheid van soorten in water kan worden aangetoond zonder dat de soort zelf gevangen hoeft te worden.

Projectcijfers per fase

	Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase	Planuitwerking Realisatie	-	
Budget Cabomba goedgekeurd PvA SG / volgens UVP	€ 332.000	€ 250.000	50% van € 500.000, excl. cofinanciering
Budget Kreeft goedgekeurd PvA SG / volgens UVP	€ 168.000	€ 250.000	50% van € 500.000, excl. cofinanciering
Herzien projectbudget Cabomba		€ 332.000	Na herverdeling SG-besluit december 2021
Herzien projectbudget Kreeften		€ 168.000	
Totaal besteed: t/m 2020			
Cabomba	€ 246.717	€ 246.717	
Kreeften	€ 79.450	€ 79.450	
t/m 2021			
Cabomba	€ 16.977	€ 16.977	
Kreeften	€ 15.000	€ 15.000	
Totaal			
Cabomba	€ 263.694	€ 263.694	
Kreeften	€ 94.450	€ 94.450	
Resterend budget			
Cabomba	€ 68.306	€ 68.306	
Kreeften	€ 73.550	€ 73.550	
Totaal exoten	€ 141.856	€ 141.856	Excl. verplichtingen



Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

Cabomba

- Een gedragen en ondertekend beheerplan Aanpak cabomba met bijbehorende financiële dekking waarmee start van de uitvoering kan worden opgepakt.
- Nieuwe haarden in beeld en in de kiem gesmoord.
- Resultaten van de pilot 't Hol bekend.
- Jaarlijkse monitoring uitgevoerd.

Kreeften

- Verdere resultaten van het onderzoek in de Molenpolder gedeeld.
- Georganiseerde eenmalige activiteit omtrent het vermarkten van gevangen rivierkreeft.

Risico's scope, planning, financiën

Cabomba

- Er komen onvoldoende middelen beschikbaar voor structurele aanpak en inzet van gebiedseigen materieel bij de realisatie van het beheerplan. De aanpak van de cabomba vraagt om oneindig doorlopend beheer in de functiegerichte aanpak waar structureel budget en inzet voor gevonden moet worden. Lukt dit niet dan zal de recreatiesector grote hinder ondervinden. Beheersmaatregel: zoektocht naar financiële middelen intensiveren en druk uitoefenen op partners en financierende instanties (incl. het Rijk) om bij te dragen.
- Er dient actief ingezet te worden om nieuwe haarden op de grens en net buiten het gebied aan te pakken om verdere verspreiding te voorkomen. De laatste monitoringsgegevens laten zien dat cabomba zich inmiddels aan het verspreiden is tot boven het Hilversums kanaal. Niet snel aanpakken van nieuwe haarden vraagt op den duur voor een grotere inzet (en dus meer financiën) voor een effectieve aanpak. Beheersmaatregel: monitoren en waar mogelijk proactief ingrijpen.

Kreeften

Het lopende onderzoek in de Molenpolder zal waarschijnlijk meer informatie opleveren om te komen tot een gedegen aanpak van de kreeften in de Oostelijke Vechtplassen. Om op termijn de aanpak uit te kunnen voeren is geen budget beschikbaar. Net als bij cabomba is het beheer continu en waarschijnlijk oneindig. Kreeften richten grote schade aan de natuurwaarden in het gebied en heeft als gevolg dat Natura 2000 doelen niet gehaald zullen worden. Er zal dus structureel beheerbudget gevonden moeten worden.

Pijler 3

Transformatie recreatiesector





Project 3.1 Gebiedsloods

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 320.000		
Fase project	Realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	18-07-2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het transitieteam heeft geconstateerd dat voor het realiseren van de transformatie van de recreatiesector het noodzakelijk is de scope van de aanpak te verbreden. De scope, die was gericht op de ondernemers in het gebied, is uitgebreid naar het gerichter aantrekken van externe investeerders en concepten die zich elders bewezen hebben. De stuurgroep heeft medio 2021 ingestemd met de verbrede scope. De gebiedsloods/projectleider transitie is continu beschikbaar voor ondersteuning bij en stimuleren van gewenste initiatieven. De inzet daarbij is conform planning. Wel is duidelijk geworden dat meer kan worden bereikt met de inzet wanneer er meer juridische kaders zouden zijn (duidelijkheid voor investeerders) en meer financiën en capaciteit voor het verbeteren van de beeldkwaliteit. Ook is sprake van beperkingen vanuit regels (NNN- en N2000 regimes). Dit, samen met de verbrede scope, is aanleiding om de gebiedsloods langer in te zetten dan de geplande 4 jaar, met ook nieuwe taken. Het uurtarief van de gebiedsloods is hoger dan geraamd. De oorspronkelijk geraamde financiën zijn daardoor niet toereikend zijn om de gebiedsloods voor de volle 4 jaar in te zetten. De stuurgroep heeft besloten aanvullende middelen te zoeken voor de inzet van de gebiedsloods, ook na deze 4 jaar.		
Betrokken partijen	Transitieteam, Gemeente Wijdmeren, Gemeente Stichtse Vecht, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, recreatiesector, Hiswa-Recron, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang overige projecten	De inzet van de gebiedsloods is erop gericht de recreatiesector in brede zin te steunen in de ontwikkeling van de transformatie. De inzet loopt via het Transitieteam (project 3.2). De inzet van de gebiedsloods heeft relatie met het traject Recreatie 2030 dat voortvloeit uit project Integreren recreatie en natuur (project 3.3). Ook brengt de gebiedsloods de belangen van recreatie en toerisme in bij projecten als de vaarverbindingen (project 1.2 en 1.3), Nieuwe Polderplas (project 2.1), Maatregelen voor moerasvogels (project 2.4), Icoon van Loosdrecht (project 1.6).		



Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

- Duurzaamheids- en opvolgingswebinar/seminar georganiseerd.
- Kansenskaart kwaliteitsimpuls Wijde Blik afgemaakt, in samenwerking met Natuurmonumenten, ondernemers en een vogelexpert.
- Follow-up knelpuntenkaart huidige recreatieve voorzieningen is ingericht.
- project 'Aanpak recreatie 2030' is afgerond.
- Gespreksronde verblijfsrecreatie en horeca: o.a. inzicht in opvolgingsissues en/of innovatiewensen afgerond.
- Monitoringstool transformatie is afgerond.
- Lopende projecten integratie natuur en recreatie verder gebracht (nu via verkenning).
- Aantal actiepunten uit het uitvoeringsprogramma verder gebracht (knelpunten wegnemen).

Progressie op hoofdlijnen in 2021

- Vanwege coronamaatregelen zijn er geen duurzaamheids- en opvolgingswebinars/seminars georganiseerd. Het blijkt dat ondernemers voorkeur geven aan fysieke bijeenkomsten.
- De kansenskaart kwaliteitsimpuls Wijde Blik is gereed.
- Er is een werkgroep in het leven geroepen die de follow-up van de knelpuntenkaart verder brengt.
- Het gezamenlijke toekomstbeeld dat onderdeel is van de 'Aanpak recreatie 2030' is gereed.
- De gespreksronde verblijfsrecreatie en horeca is niet uitgevoerd. Vanwege coronamaatregelen konden de bedrijfsbezoeken niet worden uitgevoerd.
- De monitoringstool voor de transformatie is gereed.
- Er is een bijdrage geleverd aan diverse projecten gericht op de integratie van natuur en recreatie.
- Wat betreft de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma zijn knelpunten in beeld gebracht. Ook is het visiedocument 'Op weg naar een volwaardige vakantiebestemming' door de stuurgroep vastgesteld, waarna besloten is de scope van de transitie-aanpak te verbreden en de gebiedsloots/projectleider transitie aanvullende taken te geven. Tenslotte heeft de stuurgroep besloten de gebiedsloots/projectleider transitie langer in te willen zetten en hiervoor middelen te zoeken.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Realisatie	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 320.000	€ 320.000	
Herzien projectbudget		-	€ 320.000	
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 230.988	€ 230.988	
	in 2021	€ 87.351	€ 87.351	
	Totaal	€ 318.339	€ 318.339	
Resterend budget		€ 1.661	€ 1.661	



Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- Opstellen van een ontwikkel/toetsingskader voor de gemeente Wijdmeren en voor de gemeente Stichtse Vecht dat helderheid biedt aan potentiële investeerders over de mogelijkheden en wat waar wel en niet kan.
- Individuele support bij ca. 15 initiatieven (bv ecolodges, iconisch eiland, watersportinitiatieven en andere initiatieven waarmee het recreatief aanbod wordt verbreed.) Ondernemers die daar behoefte aan hebben, worden ondersteund bij het realiseren van hun plannen.
- Uitvoeren van een 'inventarisatie perspectief verblijfsrecreatiebedrijven' waarbij wensen van ondernemers in het gebied worden opgehaald en de manier zij wensen willen realiseren.
- Het inventariseren van investeerders die geïnteresseerd zijn in het Oostelijke Vechtplassengebied.
- Verkenning buitenplaatsen: inventariseren van de kansen die buitenplaatsen bieden om het toeristisch product te versterken.
- Het organiseren en trekken van gezamenlijke conceptontwikkeling van twee of drie boekbare arrangementen.
- Een kader voor het mogelijk maken van ecolodges in bepaalde delen van het Oostelijke Vechtplassengebied.

Risico's scope, planning, financiën

- Er is geen uitvoeringsbudget voor recreatie en toerisme. Dit remt innovatie, kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en veelbelovende initiatieven die het recreatief aanbod en het recreatief seizoen verbreden.
- Een kader voor ontwikkeling en integrale visie op recreatie en toerisme ontbreekt. Dit remt de transitie. In 2022 wordt gewerkt aan een dergelijk kader. Het is van belang alle aspecten te borgen van het 'ecosysteem' om een vitale sector mogelijk te maken en om daarbinnen passende ondernemers te betrekken. Dit in plaats van het realiseren van losse doelen. Risico is dat de uitkomsten onvoldoende geborgd worden in toetsingskaders van de bevoegde gezagen.
- In het gebied gelden regimes en regelgeving die beperkingen aan ontwikkelingen kunnen opleggen.
- Bij de integratie van natuur en recreatie is sprake van koudwatervrees. Er zijn *best practices* nodig om te laten zien dat het kan. Daar moet ruimte voor gevonden worden. Verblijfsrecreatie in de natuur ter verbetering van de omliggende natuurwaarden zou hieraan bij kunnen dragen.



Project 3.2a Transitieteam recreatie en toerisme

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 320.000		
Fase project	Realisatie		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	18-07-2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De transformatie van de recreatiesector komt maar langzaam op gang. Daarom is op advies van het transitieteam de scope verbreed. In plaats van ons enkel te richten op de ondernemers in het gebied, is de scope uitgebreid naar het gerichter aantrekken van externe investeerders en concepten die zich elders bewezen hebben. Ook is de realisatie van de benodigde ontwikkel/toetsingskaders onderdeel geworden van de transitie. Dit naast het verbeteren van de beeldkwaliteit. De uitvoering wordt bemoeilijkt doordat het transitieteam geen uitvoeringsbudget (meer) heeft voor het ondersteunen, verder brengen of uitvoeren van acties die de transformatie tot stand kunnen brengen. De realiteit is dat het op dit moment veelal blijft bij plannen en wensen en er veel tijd, energie en creativiteit gaat zitten in het vinden van middelen.		
Betrokken partijen	Transitieteam, Gemeente Wijdmeren, Gemeente Stichtse Vecht, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, recreatieondernemers/Hiswa-Recron, Regio Gooi en Vechtstreek, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang overige projecten	Het transitieteam heeft een belangrijke rol bij de 'Aanpak Recreatie 2030' (onderdeel project 3.3 Integreren recreatie en natuur). De projecten die zijn gericht op het versterken van het vrijetijdlandschap zijn belangrijk voor de transitie van de recreatiesector. Het gaat dan om de projecten: recreatieve verbindingen (project 1.1), alternatieven waterrecreatie (project 1.3, voorheen vaarverbinding LPHK), vergroten aanbod waterrecreatie 's-Graveland/Kortenhoef (project 1.2, voorheen vaarverbinding 's-Gravelandsevaart), Icoon van Loosdrecht (project 1.6), de baggeropgave (project 1.7.1), herstel legakkerlandschap Kievitsbuurten (project 1.8) en Nieuwe Polderplas (project 2.4.3). Ook de projecten ontsluiting en toegankelijkheid (project 1.4) en Van dorpslint naar recreatieboulevard (project 1.5) zijn van belang, omdat goede bereikbaarheid, ontsluiting en aantrekkelijkheid van het gebied relevant zijn om de gewenste transitie te realiseren.		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

- De visie op de scope en taken van het transitieteam is vastgesteld en er is gestart met het uitwerken en uitvoeren van acties om er uitvoering aan te geven.
- Het project Aanpak recreatie 2030 is afgerond, waarbij een concrete uitvoeringsagenda is opgeleverd.



- Een PvA voor opname van De Gouden Greep in het uitvoeringsprogramma is vastgesteld. Uitvoeringsscenario's zijn uitgewerkt zodat benodigde (ruimtelijke en wettelijke) procedures kunnen worden doorlopen. Benodigde middelen zijn bijeengebracht/beschikbaar.
- De pilot ecolodges is afgerond.
- Organiseren van een seminar Toekomststrategie voor ondernemers om bestaande en stoppende ondernemers te helpen aan te sluiten bij sterke merken in de vakantiemarkt. Dit gebeurt in samenwerking met professionals in de recreatieve makelaardij en specialisten in de herontwikkeling van vakantiebedrijven. Daarnaast gaan we op zoek naar bedrijven die hun formule willen veranderen en open staan voor effectieve constructies.
- Organiseren van inspiratiebijeenkomsten (kennis en data) voor lokale ondernemers op het gebied van onder meer toekomststrategie, toeristische marketing en webbased verhuur.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

- De visie op de scope en taken van het transitieteam is uitgewerkt en vastgesteld door de stuurgroep. De scope is uitgebreid: we richten ons nu ook op het aantrekken van externe investeerders en concepten die zich elders bewezen hebben. Het realiseren van de nodige ontwikkel/toetsingskaders zijn nu ook onderdeel van de transitie. Dit naast de verbetering van de beeldkwaliteit. Rol en taken van het transitieteam zijn op deze manier beter uitgekristalliseerd. Na de zomer is bovendien een nieuwe gebiedsloots aangetrokken, die een breder takenpakket heeft gekregen, aansluitend bij de nieuwe scope.
- Aanpak Recreatie 2030 is nog niet geheel afgerond. Het toekomstbeeld recreatie 2030 is gereed maar er is nog geen uitvoeringsagenda. De stuurgroep heeft provincie Utrecht bereid gevonden als projecttrekker het toekomstbeeld recreatie 2030 te vertalen naar een actieplan. De provincie Utrecht is eind 2021 begonnen met de eerste voorbereidingen. Knelpunt is het ontbreken van uitvoeringsbudget.
- Voor het opstellen van een PvA voor De Gouden Greep en het uitvoeren van een verkenning naar de haalbaarheid en mogelijkheden zijn financiële middelen nodig. De subsidieaanvraag bij de Groene Uitweg is afgewezen omdat De Gouden Greep net buiten het Groene Uitweg gebied ligt. Natuurmonumenten, de gemeente Wijdmeren en de gebiedsloots gaan nu samen op zoek naar budget en capaciteit om het plan toch verder te brengen. Daarbij zijn ook gesprekken gevoerd met ondernemers die mogelijk zouden willen investeren in het plan.
- Het toestaan van een pilot met ecolodges bleek niet eenvoudig. De gemeenten Stichtse Vecht en Wijdmeren zijn daarom in 2021 in overleg met de gebiedsloots gestart met het ontwikkelen van een kader waarmee ecolodges mogelijk kunnen worden gemaakt. Idee is enkele plekken aan te wijzen waar, onder voorwaarden, ecolodges mogen worden gerealiseerd.
- Het seminar Toekomststrategie voor ondernemers werd niet georganiseerd vanwege het ontbreken van budget en de beperkende coronamaatregelen (uit gesprekken bleek dat ondernemers voorkeur geven aan fysieke bijeenkomsten). Voor wat betreft het benodigde budget zal actief moeten worden gezocht naar sponsors of subsidies: binnen het gebiedsakkoord is hiervoor geen budget beschikbaar.
- Ook de inspiratiesessies voor lokale ondernemers zijn niet doorgegaan vanwege het ontbreken van budget en de beperkende coronamaatregelen (uit gesprekken bleek dat ondernemers voorkeur geven aan fysieke bijeenkomsten). Ook het vertrek van de toenmalige gebiedsloots, die deze bijeenkomst zou organiseren met inbreng vanuit haar netwerk, speelde een rol. Voor wat betreft het benodigde budget zal actief moeten worden gezocht naar sponsors of subsidies.
- In 2021 is een aanvraag gedaan voor subsidie uit de Groene Uitweg gelden voor de recreatieve ontsluiting rond buitenplaats Trompenburgh in 's-Graveland. Er is € 300.000 subsidie toegekend die kan worden ingezet ten behoeve van wandel- en fietspaden, kanoroutes of andere recreatieve voorzieningen. Inzet van de middelen wordt in 2022 verder uitgewerkt.
- De provinciale omgevingsverordening (POV) die eind 2020 van kracht werd legt beperkingen op voor de transitie van de recreatiesector, één van de drie pijlers onder het gebiedsakkoord. Provincie Noord-Holland en de gemeente Wijdmeren zijn daarom samen - op verzoek van de stuurgroep - een verkenning gestart naar mogelijke oplossingen voor situaties waar belemmeringen optreden. Eind 2021 is de rapportage opgeleverd. Mogelijke oplossing is het toevoegen van een artikel aan de POV, waarmee een uitzondering wordt gemaakt voor recreatieve ontwikkelingen in het Oostelijke Vechtplassengebied die passen binnen de doelen en ambities van het gebiedsakkoord, gedurende de looptijd van het akkoord. In 2022 besluit de provincie Noord-Holland over het al dan niet toevoegen van een dergelijk artikel aan de POV.



Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Realisatie	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 131.500	€ 131.500	Budget project 3.4 is toegevoegd aan budget project 3.2.
Herzien projectbudget		€ 126.500	€ 126.500	restant project 3.3. van € 26.500 is overgeheveld t.b.v. Aanpak recreatie 2030. € 5.000 van project 3.4 is overgeheveld naar capaciteit.
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 26.950	€ 26.950	
	in 2021	€ 70.110	€ 70.110	Uitgaven zijn gedaan door de provincie Noord-Holland. Geen uitgaven in Wijdmeren.
	Totaal	€ 97.060	€ 97.060	
Resterend budget		€ 29.440	€ 29.440	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- Er is voor de transitie de komende jaren een planmatige aanpak met acties opgesteld en in uitvoering, die aansluit bij de vastgestelde verbrede scope én bij de uitkomsten van de 'Aanpak recreatie 2030'. Beoordeeld wordt of in deze aanpak het seminar Toekomststrategie en de inspiratiesessies voor lokale ondernemers weer een plek krijgen.
- Het actieplan voor de 'Aanpak recreatie 2030' is gereed. Dit plan is opgesteld gecombineerd óf in samenhang met de planmatige aanpak voor de transitie van de recreatie.
- Voor een PvA en een verkenning naar De Gouden Greep zijn middelen gevonden en het plan is ook opgesteld.
- Binnen de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdmeren zijn kaders voor het toestaan van ecolodges vastgesteld.
- Er zijn plannen uitgewerkt voor de recreatieve ontsluiting rond Trompenburgh in 's-Graveland die in uitvoering kunnen worden genomen.
- Het aanvullen van de POV met een uitzonderingsartikel voor recreatieve ontwikkelingen in het Oostelijke Vechtplassengebied, passend binnen het gebiedsakkoord gedurende de looptijd van het akkoord, is afgerond.

Risico's scope, planning, financiën

- Er is geen uitvoeringsbudget voor recreatie en toerisme, hetgeen remmend werkt op de innovatie en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en op veelbelovende initiatieven die het recreatief aanbod en het recreatief seizoen verbreden. Het transitieteam is creatief. In 2021 is de externe voorzitter bekostigd door de inzet van de voorzitter te combineren met een opdracht voor het project 'Verkenning BIZ' (project 3.4). De extern voorzitter bood advies bij het in beeld krijgen van wat nodig was om de stagnerende transitie verder te brengen en gaf ondersteuning bij het in beeld brengen en verwoorden van de verbrede scope. Zonder deze combinatie was bekostiging van de voorzitter niet mogelijk geweest.
- Het transitieteam is ook betrokken bij realisatie van het plan van één van de winnaars van de prijsvraag 'Icoon van Loosdrecht' (project 1.6). Er zijn echter (nog) geen middelen voor een goede verkenning. Het risico bestaat dat de betreffende winnaar teleurgesteld afhaakt, ondanks het mooie plan.
- De transitie wordt afgeremd door het ontbreken van een kader voor ontwikkeling en integrale visie op recreatie en toerisme. De gebiedsloids heeft opdracht gekregen de meerwaarde en randvoorwaarden voor



zo'n kader in beeld te brengen. Het streven is daarbij alle aspecten van het 'ecosysteem' te borgen om een vitale sector mogelijk te maken en om passende ondernemers daarbinnen te betrekken. Risico is dat de aanbevelingen van de gebiedsloots in een dergelijk kader uiteindelijk niet worden gevolgd in de toetsingskaders van de bevoegde gezagen.

- In het gebied gelden regimes en regelgeving die beperkingen aan ontwikkelingen kunnen opleggen.
- Bij de integratie van natuur en recreatie is sprake van koudwatervrees. Er zijn *best practices* nodig om te laten zien dat het kan. Daar moet ruimte voor gevonden worden. Verblijfsrecreatie in de natuur ter verbetering van de omliggende natuurwaarden kan hieraan bijdragen.
- In het gebied gelden regimes en regelgeving die beperkingen aan ontwikkelingen kunnen opleggen.
- Bij de integratie van natuur en recreatie is sprake van koudwatervrees. Er zijn *best practices* nodig om te laten zien dat het kan. Daar moet ruimte voor gevonden worden. Verblijfsrecreatie in de natuur ter verbetering van de omliggende natuurwaarden zou hieraan bij kunnen dragen.



Project 3.2b Aanpak recreatie 2030

Projecttrekker	Provincie Utrecht		
Projectraming volgens UVP	Geen		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	30-06-2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De visie “Toekomstbeeld recreatie 2030” is vastgesteld door de stuurgroep. De provincie Utrecht heeft iemand ingehuurd om een startdocument te maken, om te komen tot een aanzet van een Actieplan. Momenteel zijn hier nog geen middelen voor.		
Betrokken partijen	Provincie Utrecht, Gemeente Wijdmeren, Gemeente Stichtse Vecht, Provincie Noord-Holland, recreatiesector, Natuurmonumenten, Waternet/AGV, Bureau Buhrs, Plassenschap Loosdrecht e.o		
Samenhang overige projecten	Het project hangt samen met de inzet van de gebiedsloots (project 3.1) en het Transitieteam Recreatie en Toerisme (project 3.2)		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

Afronding van het project Recreatie 2030 inclusief concrete uitvoeringsagenda.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

De visie ‘Toekomstbeeld recreatie 2030’ is opgeleverd en vastgesteld. De stuurgroep heeft ook besloten de visie uit te werken tot een actieplan. Het project Recreatie 2030 is daarmee niet afgerond, maar er is wel een belangrijke mijlpaal bereikt. Verder is er een eerste stap gezet om te komen tot het actieplan.

Projectcijfers per fase

Er is geen toegekend budget in 2021, en er zijn ook geen kosten gemaakt.

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

We verwachten in 2022 een actieplan Recreatie 2030 op te leveren, waarbij duidelijk wordt welke eerste acties door wie kunnen worden ondernomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘quick wins’ en plannen voor de iets langere termijn.

Risico's scope, planning, financiën

Het risico is dat er verschillende beelden zijn voor de inhoud van het op te stellen actieplan en de prioritering (en budgettering) ervan.

toekomstbeeld 2030 • oostelijke vechtplassen

bewust genieten in een uitnodigend vrijetijdlandschap

Comfortabel genieten

Op of aan het water genieten van een drankje en hapje, watersporters om je heen en uitzicht op de prachtige natuur.

De unieke natuur, het verfrissende water en het gastvrije, innovatieve ondernemerschap maken het Loosdrechts Plassengebied tot een uitnodigende plek voor een op en top vakantiegevoel.

Verborgen parels ontdekken

Ontdek met je kano of sup de beschutte baaitjes, oevers en eilanden, ga zwemmen of spelen en kom helemaal tot rust.



Beleven, bewegen en leren in de natuur

Wandel of fiets langs de plassen, leer bijzondere dieren en planten kennen en ervaar deze natuur van wereldklasse.

Kernkwaliteiten

- Hoge natuurwaarden
- Recreatie en toerisme, wonen, water en natuur in harmonie
- Breed recreatief aanbod op water en land met focus op sport en kwalitatieve horeca
- Beleefbaar (cultuurhistorisch) landschap
- Sterk gelegen ten opzichte van de omgeving: in de Randstad en aan de Vecht

Merkwaarden

- Bewust • harmonieus • weloverwogen
- Smaakvol • stijlvol • comfort
- Uitnodigend • gastvrij • vakantiegevoel • toegankelijk
- Verfrissend • vernieuwend • bruisend • actief • vrijheid

Cultuur snuiven

Bezoek de forten en buitenplaatsen, struin door het 'echt Hollandse' cultuurlandschap en leer over de historie van legakkers, petgaten en molens.

Dit toekomstbeeld is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de partners binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen en een aantal beeldbepalende lokale én betrokken ondernemers. Deskresearch, interviews, een online enquête en diverse bijeenkomsten hebben de inhoudelijke basis gelegd voor een gezamenlijk beeld. Het helpt om individuele projecten met concrete doelstellingen ondersteunend te laten zijn aan het geheel: een uitnodigend vrijetijdlandschap om bewust van te genieten.



Project 3.4 Verkenning bedrijveninvesteringszone / investeringsfonds

Projecttrekker	Transitieteam / Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 60.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	04-10-21		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De stuurgroep heeft besloten de scope van het project te verleggen naar een verkenning van een investeringsfonds. Dit op voorstel van het transitieteam dat na onderzoek concludeerde dat een BIZ geen goed passend instrument is voor toepassing in het gebied van de Oostelijke Vechtplassen. Voor wat betreft de planning zijn de achterstanden ingehaald. De verkenning is eind 2021 afgerond. Het transitieteam beraadt zich in 2022 over een vervolg.		
Betrokken partijen	Transitieteam, Gemeente Wijdmeren, Gemeente Stichtse Vecht, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Natuurmonumenten, Waternet/AGV, recreatieondernemers, Hiswa-Recron, Plassenschap Loosdrecht e.o		
Samenhang overige projecten	Project hangt samen met de transitie van de recreatiesector (project 3.2) en dus met activiteiten van het transitieteam en de gebiedsloods (project 3.1). Het fonds moet bijdragen aan een breed en aantrekkelijk recreatief aanbod en aan het verbeteren en ontwikkelen van een vrijetijdslandschap. Hierdoor heeft het ook relatie met de projecten recreatieve verbindingen (project 1.1), vergroten aanbod waterrecreatie 's-Graveland en Kortenhoeft (project 1.2, voorheen vaarverbinding 's-Gravelandsevaart), alternatieven waterrecreatie (project 1.3, voorheen vaarverbinding LPHK), van dorpslint naar recreatieboulevard/duurzame ontwikkeling Scheendijk (project 1.5), Icoon van Loosdrecht (project 1.6), de baggeropgave (project 1.7.1), herstel legakkerlandschap Kievitsbuurten (project 1.8) en Nieuwe Polderplas (project 2.4.3).		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

Er is een advies/voorstel gereed omtrent de haalbaarheid van een BIZ of investeringsfonds (opgesteld door het transitieteam, binnen project 3.2).

Progressie op hoofdlijnen in 2021

De visie 'Toekomstbeeld recreatie 2030' is opgeleverd en vastgesteld. De stuurgroep heeft ook besloten de mogelijkheden van een BIZ zijn in beeld gebracht. Conclusie: een BIZ past minder goed bij de breedte van het Oostelijke Vechtplassengebied en bij de aard van het uitvoeringsprogramma van het gebiedsakkoord. Een BIZ kan niet gebiedsbreed worden ingezet, biedt enkel ruimte tot deelname aan ondernemers/eigenaren en is alleen gericht op aanpassingen in de openbare ruimte.



Daarnaast is er bij ondernemers weinig draagvlak voor een BIZ. Een investeringsfonds past beter: het kan wel gebiedsbreed worden toegepast, belangengroepen en bewoners kunnen deelnemen en het biedt de mogelijkheid om initiatieven te steunen die gericht zijn op behoud en ontwikkeling van recreatief aanbod, cultuur, erfgoed en natuur. De stuurgroep is voorgesteld om de scope van het project te verleggen naar een verkenning van een investeringsfonds. Het PvA daarvoor is opgesteld en vastgesteld door de stuurgroep en vervolgens ook uitgevoerd. De rapportage wordt in het eerste overleg van het transitieteam in 2022 besproken.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		-	-	Budgetten zijn overgeheveld naar project 3.2.
Herzien projectbudget		-	-	
Totaal besteed:	t/m 2020	-	-	
	in 2021	-	-	Kosten via project 3.2. Uitgaven door provincie Noord-Holland.
	Totaal	-	-	
Resterend budget		-	-	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- De definitieve rapportage van de verkenning is gereed en vastgesteld door de stuurgroep.
- Het transitieteam heeft voorstellen geformuleerd over een vervolg op de verkenning en voorgelegd aan de stuurgroep.
- Een eventueel vervolg op de verkenning is in uitvoering.

Risico's scope, planning, financiën

- Daadwerkelijke realisatie van het fonds valt buiten de reikwijdte van dit project, maar zal als vervolgproject moeten worden opgepakt door betrokken partijen.
- Een investeringsfonds wordt grotendeels gevuld door bijdragen vanuit het bedrijfsleven of maatschappij. De uitkomsten van de verkenning worden dan ook voor een groot deel beïnvloed door draagvlak daarvoor bij marktpartijen en betrokkenheid van de omgeving.
- Er zijn slechts middelen voor de verkenning. Voor realisatie van het fonds moeten te zijner tijd middelen worden gevonden.

5

Organisatiekosten





Project 4.1 Organisatiekosten Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Projecttrekker	- Provincie Noord-Holland (bureaunkosten) - Gemeente Wijdmeren (communicatie OVP breed) - Gemeente Wijdmeren (extra capaciteitskosten)		
Projectraming volgens UVP	Geen raming opgenomen in het uitvoeringsprogramma: - Bureaunkosten: € 600.000 (10 Jaar) - Communicatie OVP breed: € 400.000 (3 jaar) - Extra capaciteitskosten WM: € 380.000 (3 jaar)		
Fase project	N.v.t.		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	- SG-besluit bureaunkosten 12-12-2018 (vastgelegd in partnerovereenkomst) - SG-besluit communicatie en capaciteit 20-11-2019 (notitie) en 30-6-2021 (intakeformulier)		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De financiën voor communicatie staan onder druk, omdat de bekostiging van de programmacommunicatie nog niet structureel is ingeregeld. Eind 2021 zijn hierover voorstellen gedaan aan de stuurgroep, die daarover begin 2022 besluit.		
Betrokken partijen	Alle OVP-partners		
Samenhang overige projecten	De regiegroep heeft in 2019 besloten dat de algemene <i>bureaunkosten</i> ten laste van de investeringsbudgetten komen. De dekking voor budget communicatie komt uit verschuivingen van budgetten voor de vaarverbindingen (project 1.2 en 1.3) en NNN (project 2.1). De dekking voor de extra capaciteit Wijdmeren komt met name uit budget voor recreatieve verbindingen (project 1.1) t.b.v. inhuur van een projectleider voor het project Horstermeer Zuid waarvoor geen van de partijen trekker was en uit verschuivingen van budgetten voor de vaarverbindingen (project 1.2 en 1.3), NNN (project 2.1) en Proces en Onderzoek (project 1.4 en 1.5).		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

Een afgeronde tussenevaluatie van het programma met realistische verbetervoorstellen voor de toekomst. Het doorvoeren van aanpassingen op het gebied van programma aansturing om zo beter aan te sluiten op de huidige fase van het programma.

Progressie op hoofdlijnen in 2021

Adviesbureau Arcadis heeft in 2021 een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Centrale vraag daarbij was: hoe staat het programma er procesmatig voor, zijn er aanpassingen nodig en zo ja, welke dan? De evaluatie leverde 17 aanbevelingen op die betrekking hebben op het programmamanagement, communicatie- en omgevingsmanagement, governance in relatie tot de Mutual Gains Approach (MGA) en de financiën. Het evaluatierapport inclusief de aanbevelingen zijn besproken in de regiegroep (RG) van 10-6-2021 en in de stuurgroep (SG) van 30-06-2021.



De uitvoering van de nieuwe communicatiestrategie is ter hand genomen.

- Er is een nieuwe werknaam gekozen (Aanpak Oostelijke Vechtplassen) en er is een logo ontwikkeld.
 - De bijbehorende huisstijl is ontworpen en geïmplementeerd.
 - Er is een website gebouwd die begin 2022 live gaat.
 - De communicatie is proactiever van aard, meer gericht op de ontvanger.
 - Er is een algemene informatiemarkt georganiseerd met een nieuwe, meer open opzet. Vanwege de coronabeperkingen hebben we ons in 2021 tot één programmabrede bijeenkomst moeten beperken.
 - Er zijn 6 reguliere nieuwsbrieven uitgegaan over ontwikkelingen binnen het gebiedsakkoord.
- Op 31 december 2021 telden we 715 abonnees.

De capaciteit voor de projectleiding van het project Horstermeer Zuid is nog niet ingezet. Start van de uitvoering van dit project is doorgeschoven naar 2022. Er is capaciteit ingezet voor werkzaamheden voortvloeiend uit de diverse NNN-trajecten. Vanuit de grondverwerving en wat daaromheen speelt, komen veel (ruimtelijke, vergunningtechnische en vastgoedgerelateerde) vraagstukken en onderzoekwerk bij de gemeente binnen. Vanwege corona was dit werk minder omvangrijk dan eerdere jaren. De overige capaciteit is ingezet ten gunste van de recreatieve projecten, omdat middelen daar deels ook uit zijn vrijgemaakt: zoals de ondersteuning van het transitieteam, organisatie Aanpak Recreatie 2030 en het realiseren van recreatieve verbindingen.

Projectcijfers per fase

	Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase	N.v.t.	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP	N.v.t.	Geen	
Herzien projectbudget		Bureaunkosten: € 600.000 (10 jaar) Communicatie: € 400.000 Extra capaciteit: € 380.000	Stuurgroep 12-12-2018 en 16-12-2020 Stuurgroep 20-11-2019 Stuurgroep 12-07-2019, 20-11-2019 en 30-06-21
Totaal besteed:	t/m 2020	€ 346.315	
	in 2021	€ 427.761	Prognose 2021 extra capaciteit was 205K
	Totaal	Bureaunkosten: € 189.574 Communicatiecapaciteit: € 200.183 Communicatiemiddelen: € 29.887 Extra capaciteit Wijdmeren: € 354.432 (prognose)	Incl. PNH betaalde kosten
Resterend budget		Bureaunkosten: € 410.426 Communicatiecapaciteit: € 99.817 Communicatiemiddelen: € 70.113 Extra capaciteit: € 25.568	



Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

Het programmamanagement is op sterkte en er is een uitvoeringsprogramma 2.0 opgesteld.

Op het gebied van communicatie:

- website is gelanceerd en de huisstijl is verder uitgebouwd;
- reguliere nieuwsbrieven zijn verzonden;
- er is tenminste één programmabrede inloopbijeenkomst georganiseerd;
- middelen voor communicatie gedurende de looptijd van het programma zijn structureel geborgd;
- capaciteit Wijdemeren ingezet conform afspraken (t.b.v. NNN, recreatie en Horstermeer Zuid).

Risico's scope, planning, financiën

- De benodigde kosten voor communicatie zijn in het gebiedsakkoord niet structureel geborgd. Voorstellen voor dekking zijn eind 2021 aan de stuurgroep gedaan. Begin 2022 zal de stuurgroep hierover besluiten.
- Als de voorstellen tot versterking van het programmamanagement niet worden aangenomen, dan kan dat leiden tot ernstige vertraging in de uitvoering van het akkoord en tot onuitvoerbare projecten door communicatieproblemen. Ook de beeldvorming rondom het programma kan onder druk komen te staan.
- Voor deels ongedekte projecten en voor nieuwe initiatieven moet nieuwe financiering worden gezocht, hetgeen mogelijk kan leiden tot aanpassing van de scope van deelprojecten.
- Door coronamaatregelen hebben de NNN-projecten qua grondverwerving minder voortgang gehad. Mogelijk heeft de toestroom aan vraagstukken en het zoekwerk ten gevolge van de grondverwerving daardoor een langere doorlooptijd. Als de beschikbare middelen hierdoor onvoldoende toereikend zijn, kan er vertraging optreden in het afwikkelen van afwikkeling van dergelijke vraagstukken en/of het zoekwerk.

Bijlage

Mutaties Nationaal Groenfonds rekening 2021

Onderstaande tabel laat de declaraties (ook wel: opnames uit Groenfonds), stortingen aan het Groenfonds, kosten en correcties zien.



DATUM	TYPE	CODE	PROJECT	BEDRAG	PNH/GU	UTR	WM	SV	HILV	G&V	AGV/WN	PS	PRIVAAT
			Beginsaldo 1-1-2021	3.540.993	-1.167.433	1.358.000	1.695.621	-409.292	250.000	38.800	1.699.274	70.914	5.110
26 jan	Correctie	P3.2	Van dorpslint naar recreatieboulevard	150.000				150.000					
26 jan	Correctie	P3.2	Van dorpslint naar recreatieboulevard	-150.000				-150.000					
26 jan	Storting 2020	P6.4	BIZ	1.000				1.000					
26 jan	Storting 2020	P6.1	Gebiedsloods	2.000				2.000					
26 jan	Storting 2020	P3.4	Visie ontwikkeling Kivietsbuurt	1.500				1.500					
26 jan	Storting 2020	P3.2	Van dorpslint naar recreatieboulevard	1.500				1.500					
26 jan	Storting 2020	P3.1	Onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid	2.000				2.000					
26 jan	Storting 2020	P2.1	Baggeren	133.000				133.000					
26 jan	Storting 2020	P1.1	Verbindingen op land	9.000				9.000					
24 mrt	Storting 2020	P2.1	Baggeren	70.914								70.914	
26-apr	Declaratie	P2.1	Baggeren	-700.000	-700.000								
26 apr	Declaratie	P5.1	Populatiebeheer ganzen	-57.000	-57.000								
26 apr	Declaratie	P2.3	Legakkerherstel Kievitsbuurten	-525.000				-525.000					
26 apr	Declaratie	P4.4	Moerasvogels (natuureilanden)	-770.000	-770.000								
26 apr	Declaratie	P8.2	Extra capaciteitskosten	-213.000			-213.000						
26 apr	Declaratie	P8.1	Communicatie OVP breed	-125.000			-125.000						
26 apr	Declaratie	P6.1	Gebiedsloods	-55.000			-55.000						
26 apr	Declaratie	P2.1	Baggeren	-105.000			-105.000						
26 apr	Declaratie	P8.0	Bureaukosten	-60.000	-60.000								
23 apr	Storting 2021	P4.4	Moerasvogels (natuureilanden)	350.000	350.000								
23 apr	Storting 2021	P4.2	Realiseren NNN - inrichting nieuwe natuur	330.000	330.000								
23 apr	Storting 2021	P4.3	Kwaliteitsimpuls best. natuur/biodiversiteit	135.000	135.000								
23 apr	Storting 2021	P1.1	Verbindingen op land	185.000	185.000								
23 apr	Storting 2021	P2.2	Zwevend slib	650.000	650.000								
23 apr	Storting 2021	P4.1	Ontsnipperingsmaatr./faunapassages/ec verb.	500.000	500.000								
23 apr	Storting 2021	P2.1	Baggeren	674.000	674.000								
23 apr	Storting 2021	P1.3	Vaarverbinding Loosdrechtse plassen – HK	314.000	314.000								
23 apr	Storting 2021	P1.2	’s Gravenlandse Vaart	636.000	636.000								
23 apr	Storting 2020	P1.1	Verbindingen op land	163.000	163.000								
23 apr	Storting 2020	P4.4	Moerasvogels (natuureilanden)	281.000	281.000								
23 apr	Storting 2020	P8.0	Bureaukosten	20.000	20.000								
23 apr	Storting 2020	P6.3	Integratie recr. en natuur/verduurz. sector	33.500	33.500								
23 apr	Storting 2020	P4.1	Ontsnipperingsmaatr./faunapassages/ec verb.	421.000	421.000								
23 apr	Storting 2020	P6.1	Gebiedsloods	80.000	80.000								
23 apr	Storting 2020	P5.3	Bestrijding exoten - Cabomba en Kreeften	200.000	200.000								
23 apr	Storting 2020	P6.2	Transitie recreatie & toerisme	26.500	26.500								
30 apr	Storting 2020	P4.4	Natuureilanden	1.260.000	1.260.000								
30 apr	Storting 2020	P1.3	Vaarverbinding Loosdrechtse plassen – HK	181.000	181.000								
30 apr	Storting 2020	P4.3	Kwaliteitsimpuls best. natuur/biodiversiteit	339.000	339.000								
23 aug	Verrekening	P3.2	Van dorpslint naar recreatieboulevard	34.395				34.395					
10 sep	Storting extra	P6.2	Transitie recreatie & toerisme	10.000							10.000		
14 sep	Storting 2021	P6.4	BIZ	1.000				1.000					
14 sep	Storting 2021	P6.1	Gebiedsloods	2.000				2.000					
14 sep	Storting 2021	P3.4	Visie ontwikkeling Kivietsbuurt	1.500				1.500					
14 sep	Storting 2021	P3.2	Van dorpslint naar recreatieboulevard	1.500				1.500					
14 sep	Storting 2021	P3.1	Onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid	2.000				2.000					
14 sep	Storting 2021	P2.1	Baggeren	133.000				133.000					
14 sep	Storting 2021	P1.1	Verbindingen op land	9.000				9.000					
8 nov	Correctie	corr	Correctie	-1.573.180	-1.573.180								
8 nov	Declaratie	P2.3	Legakkerherstel Kievitsbuurten	-5.103				-5.103					
8 nov	Correctie	corr	Correctie	-340.000			-340.000						
8 nov	Correctie	corr	Correctie	1.573.180	1.573.180								
8 nov	Correctie	corr	Correctie	340.000			340.000						
8 nov	Declaratie	P2.1	Baggeren	-700.000	-700.000								
8 nov	Declaratie	P5.1	Populatiebeheer ganzen	-47.000	-47.000								
8 nov	Declaratie	P4.2	Inrichting nieuwe natuur	-826.180	-826.180								
8 nov	Declaratie	P8.1	Communicatie OVP breed	-175.000			-175.000						
8 nov	Declaratie	P1.1	Verbindingen op land	-150.000			-150.000						
8 nov	Declaratie	P1.3	Vaarverbinding Loosdrechtse plassen – HK	-15.000			-15.000						
31 dec	kosten GRF	P8.0	Bureaukosten	-10.000	-10.000								
			Eindsaldo 31-12-2021	6.197.019	2.441.387	1.358.000	857.621	-605.000	250.000	38.800	1.709.274	141.828	5.110



COLOFON

De voortgangsrapportage is een jaarlijks terugkerende uitgave verzorgd door het programmabureau Oostelijke Vechtplassen in nauwe samenwerking met de diverse projecttrekkers. De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft dit rapport op 30 maart 2022 vastgesteld.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

p/a secretariaat OVP
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

T: 023-5143098

E: secretariaat_OVP@noord-holland.nl

Partners:

provincie Noord-Holland | provincie Utrecht |
gemeente Wijdmeren | gemeente Stichtse Vecht |
gemeente Hilversum | Waternet | Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht | Plassenschap Loosdrecht e.o. |
Regio Gooi en Vechtstreek | Natuurmonumenten |
LTO Noord | HISWA-Recron | Koninklijk Nederlands
Watersportverbond | Verenigde bedrijven Boomhoek |
Vechtplassencommissie | Platform Recreatie en Toerisme
Wijdmeren | Toeristische Kano Bond Nederland |
Vereniging Kievitsbuurten | ANWB | Bewonersfederatie OVP

Vormgeving:

Pier 19 Grafisch ontwerpers Utrecht

Fotografie:

www.vdmarel.com (cover, 2, 6, 9, 10, 14, 17 en 72)
[@eenkwestievanfotografie](#) (20, 40 en 83)
programmabureau OVP (3 en 13)

Illustraties:

www.schetsontwerp.com / Bureau Buhrs (81)
