

Eerste programmarapportage Uitvoeringsprogramma Baggeren 2025

1 januari t/m 30 april 2025



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier



Auteur

P. Groen

Registratienummer

25.0389133

Datum

1 januari t/m 30 april

Status

Definitief

Afdeling

Watersystemen

Foto's afgelopen periode

Op de voorpagina staat een foto van baggerwerk nabij de zeedijk Assendelft.

Ransdorp



Westwoud



Zwaag



Samenvatting

Van de 5800 km watergangen die HHNK middels baggeren op diepte houdt, wordt jaarlijks circa 700 km gepeild en vervolgens getoetst aan de normafmetingen. Begin 2024 is bepaald dat hiervan in 2025, 303 km moet worden gebaggerd. Vanwege verschuivingen in de planning is de huidige prognose dat er in 2025, 332 km waterloop wordt gebaggerd. Landelijk baggerwerk heeft in 2024 vertraging opgelopen en wordt in 2025 ingehaald en het stedelijk baggerwerk van 2025 is al deels in 2024 uitgevoerd.

In de begroting 2025 is rekening gehouden met het realiseren van een slibvangput in het Oosterdelgebied. Dit is een van de maatregelen vanuit het project Toekomstbestendig Oosterdel met als doel in het water zwevende slibdeeltjes te laten bezinken wat bijdraagt aan de helderwaterdoelstelling. De besluitvorming over de uitvoering van het project heeft later plaatsgevonden dan aanvankelijk gepland. Deze maatregel schuift daarom door naar 2026. Verder verwachten we de werkzaamheden uit te voeren zoals gepland.

Om schommelingen in kosten op te vangen is een baggervoorziening ingericht waaraan in 2025 € 4,6 miljoen wordt toegevoegd. In 2025 wordt € 5,7 miljoen aan de voorziening onttrokken.

Programma Baggeren

Algemeen

Ons watersysteem voldoet (indien mogelijk) aan de leggerafmetingen en, indien van toepassing, aan het brede kijk- en/of vaarwegprofiel. De waterbodems vormen geen belemmering voor het behalen van de waterkwaliteitsdoelen.

Het Uitvoeringsprogramma Baggeren draagt bij aan het behalen van deze doelen en daarmee aan de effecten Voldoende water, Gezond water en Veilige vaarwegen. Vanwege het zwaartepunt wordt gerapporteerd bij het effect Voldoende water.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is verantwoordelijk voor het op de juiste diepte houden van 5800 km watergangen.

Het kader voor het op de juiste diepte houden van de waterbodems is het in februari 2012 door het algemeen bestuur vastgestelde Beleidsplan Waterbodems (11.0041019). De baggerplicht van HHNK en de vereiste waterloopafmetingen voor de aan- en afvoer van water volgt uit de Legger Wateren.

Het op orde houden van de watergangen vindt plaats door alle watergangen cyclisch te meten, te toetsen aan de legger en andere normafmetingen en indien nodig te baggeren. Daarnaast worden er ingrepen in de waterbodem gedaan als maatregel vanuit de Kaderrichtlijn Water ter verbetering van de waterkwaliteit. De kosten per kilometer baggerwerk kunnen, afhankelijk van de locatie (landelijk, stedelijk of boezem), periode van uitvoering en de kwaliteit van de baggerspecie, sterk uiteenlopen. Om schommelingen in kosten op te vangen is de voorziening baggeren ingericht waaraan in 2025 € 4,6 miljoen wordt toegevoegd volgens de vastgestelde meerjarenraming Baggeren (24.1126816).

Resultaten en financiën 2025

Realisatie

Van de 5800 km watergangen die HHNK middels baggeren op diepte houdt, wordt jaarlijks circa 700 km gepeild en vervolgens getoetst aan de normafmetingen. Begin 2024 is bepaald dat hiervan in 2025, 303 km moet worden gebaggerd.


Onderstaand is de realisatie weergegeven qua uitgevoerde werken in km waterloop en m³ bagger (tabel 1) en de bijbehorende financiën (grafiek 1 en tabel 2). De toename ligt met name aan het inhalen van het landelijk baggerwerk 2024, gezien eind 2024 hierbij vertraging is opgetreden vanwege het opstellen van Veiligheids- en gezondheidsplannen.

In de aangehechte bijlage is op een kaart weergegeven waar in 2025 wordt en is gebaggerd en voor welke gebieden baggerwerken zijn of worden voorbereid.

	Begroting	Prognose T1
km waterloop te baggeren	303	332
m ³ te baggeren x 1.000	410	461

Tabel 1: Realisatie 2025

Financiën

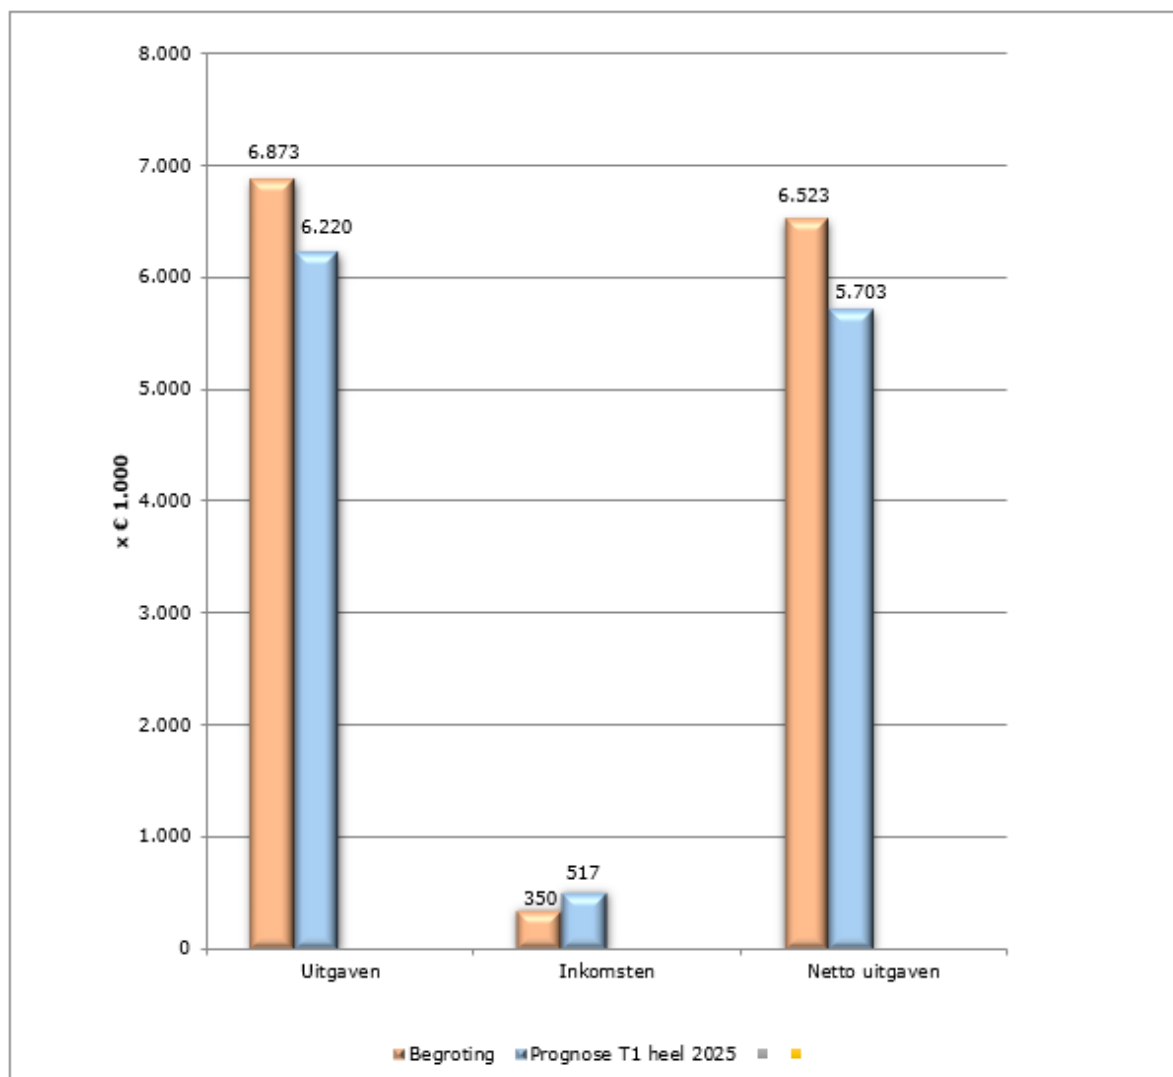

Grafiek 1: De prognose 2025 ten opzichte van de geplande onttrekking voor de begroting 2025 (bedragen x € 1.000)

Uitgaven (bruto)	De prognose van de (bruto) uitgaven is € 0,65 miljoen lager dan de begroting. De oorzaken daarvan zijn: • De realisatie van slibvangput Oosterdel schuift door naar 2026 vanwege latere besluitvorming over de uitvoeringsovereenkomst Toekomstbestendig Oosterdel. • Stedelijk baggerwerk 2024-2025 is voor een lager bedrag aanbesteed dan onze raming en verloopt voorspoedig, een deel van 2025 is al in 2024 uitgevoerd. • Voorbereidingskosten van baggerwerken zijn hoger vanwege prijsstijgingen en extra onderzoeken naar de afmetingen van greppels en monitoring van de bagger aangroei in de polder Wieringerwaard. Daarnaast zijn er ook meerkosten om vertraagd landelijk baggerwerk uit te voeren.
Inkomsten	De verwachte inkomsten zijn € 0,17 miljoen hoger dan de begroting. De oorzaak hiervan zijn afkoopsommen van gemeenten vanwege de overname van stedelijk water die aanvankelijk in 2024 zouden worden betaald.
Uitgaven (netto)	De prognose voor de netto-uitgaven zijn € 0,82 miljoen lager dan de begroting.

Tabel 2: Toelichting financiën

Bijlage: Statusoverzicht baggerwerken

