



Memo – Ter kennisname

Aan: VV

Van: J.J.J. Langeslag

Onderwerp: Voortgangsrapportage N3MP

Datum: 20 november 2019

Corsanr.: 19.077189

Waarom moet u dit weten

Zoals afgesproken, wordt aan de Commissie VW regelmatig een stand van zaken gepresenteerd voor het project Nieuwe Driemanspolder. In dat kader ontvangt u bijgevoegde voortgangsrapportage. Gelet op de belangstelling die het onderwerp geniet wordt de memo daarnaast bijgevoegd aan de commissie VW als TKN-stuk.

Kernboodschap

De afgelopen zomer is de kade van de piekberging afgerond en zijn de kades van de aanvoerroute nagenoeg gereed. Voor dit najaar en komend jaar ligt de focus vooral op de bouw van de kunstwerken, aanleg van de fiets-, wandel- en ruitersporen en de aanplant van het gebied. De planning voor oplevering eind 2020 is reëel.


Context

Het project Nieuwe Driemanspolder heeft als opdracht:
het realiseren van een piekberging in de regio Stompwijk met een inhoud van circa 2.000.000 m³ water inclusief de aanvoerroute;
het realiseren van een natuurfunctie;
het realiseren van een recreatiefunctie.

De voortgang van deze opdracht wordt in de bijgevoegde rapportage samengevat.

Vervolg

De volgende rapportage zal voorgelegd worden in de commissievergadering in januari 2020.





Hoogheemraadschap van
Rijnland

Foto's:




Verbreiden Ringsloot



Uitgraven "vingers" zuidelijk gebied.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

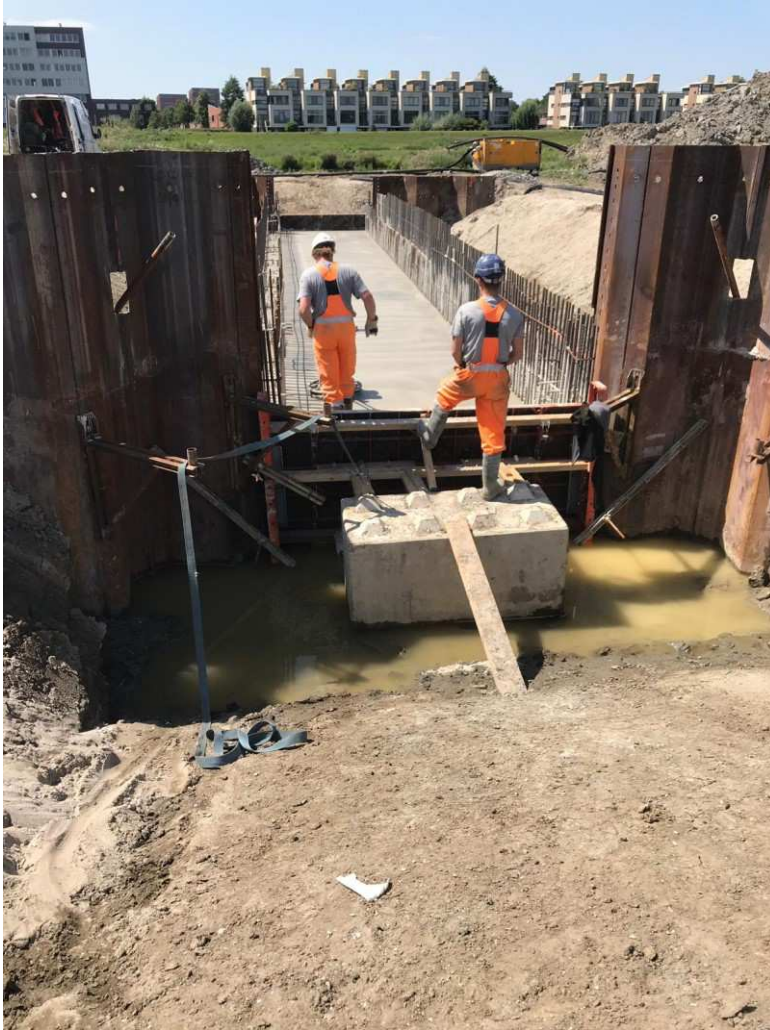

Uitlaat N9 in aanbouw



Inlaat Limietsloot





Hoogheemraadschap van
Rijnland

