

Stand van zaken Grenscorridor N69

Gemeenteraad Waalre

13 september 2016

Cees van den Boer

Gebiedsopgave Grenscorridor N69

Een gebied met grote landschappelijke, natuur en recreatieve betekenis voor de regio.

**Meer dan het
aanleggen van een
nieuwe weg:
gebiedsontwikkeling!**

**Een belangrijke internationale
verbinding**



Hoe?

Gebiedsakkoord juni 2012; via 3 onderdelen:

1. Nieuwe N69 (aanleg van een nieuwe weg)

2. Lokale (nulplus)maatregelen

3. Gebiedsimpuls: investeringen in natuur, landschap, water, landbouw en recreatie.

Nieuwe N69: procedure vaststelling PIP

Provinciale Staten stelt PIP vast 31 oktober 2014

Raad van State schakelt Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) in; voorjaar 2015

Raad van State zitting 16/17 nov. 2015, 15 appellanten

Nieuwe N69: procedure vaststelling PIP

Tussenuitspraak Raad van State 20 april 2016:
betogen appellanten falen bijna allemaal, bestuurlijke lus met 11 punten

Provinciale Staten stelt rapportage vast op 9 sept. 2016 en stuurt deze naar Raad van State en betrokken appellanten.


Uitspraak Raad van State ??? Hopelijk voor einde van het jaar

1e Herziening PIP: januari 2017 in PS, daarna inspraak en mogelijk RvS.

Bij groen licht Raad van State: start aanbesteding (medio 2017)

Start bouw eind 2017, bouw Nieuwe N69 duurt 1,5 - 2 jaar

Aansluiting op Kempenbaan in Veldhoven en A67

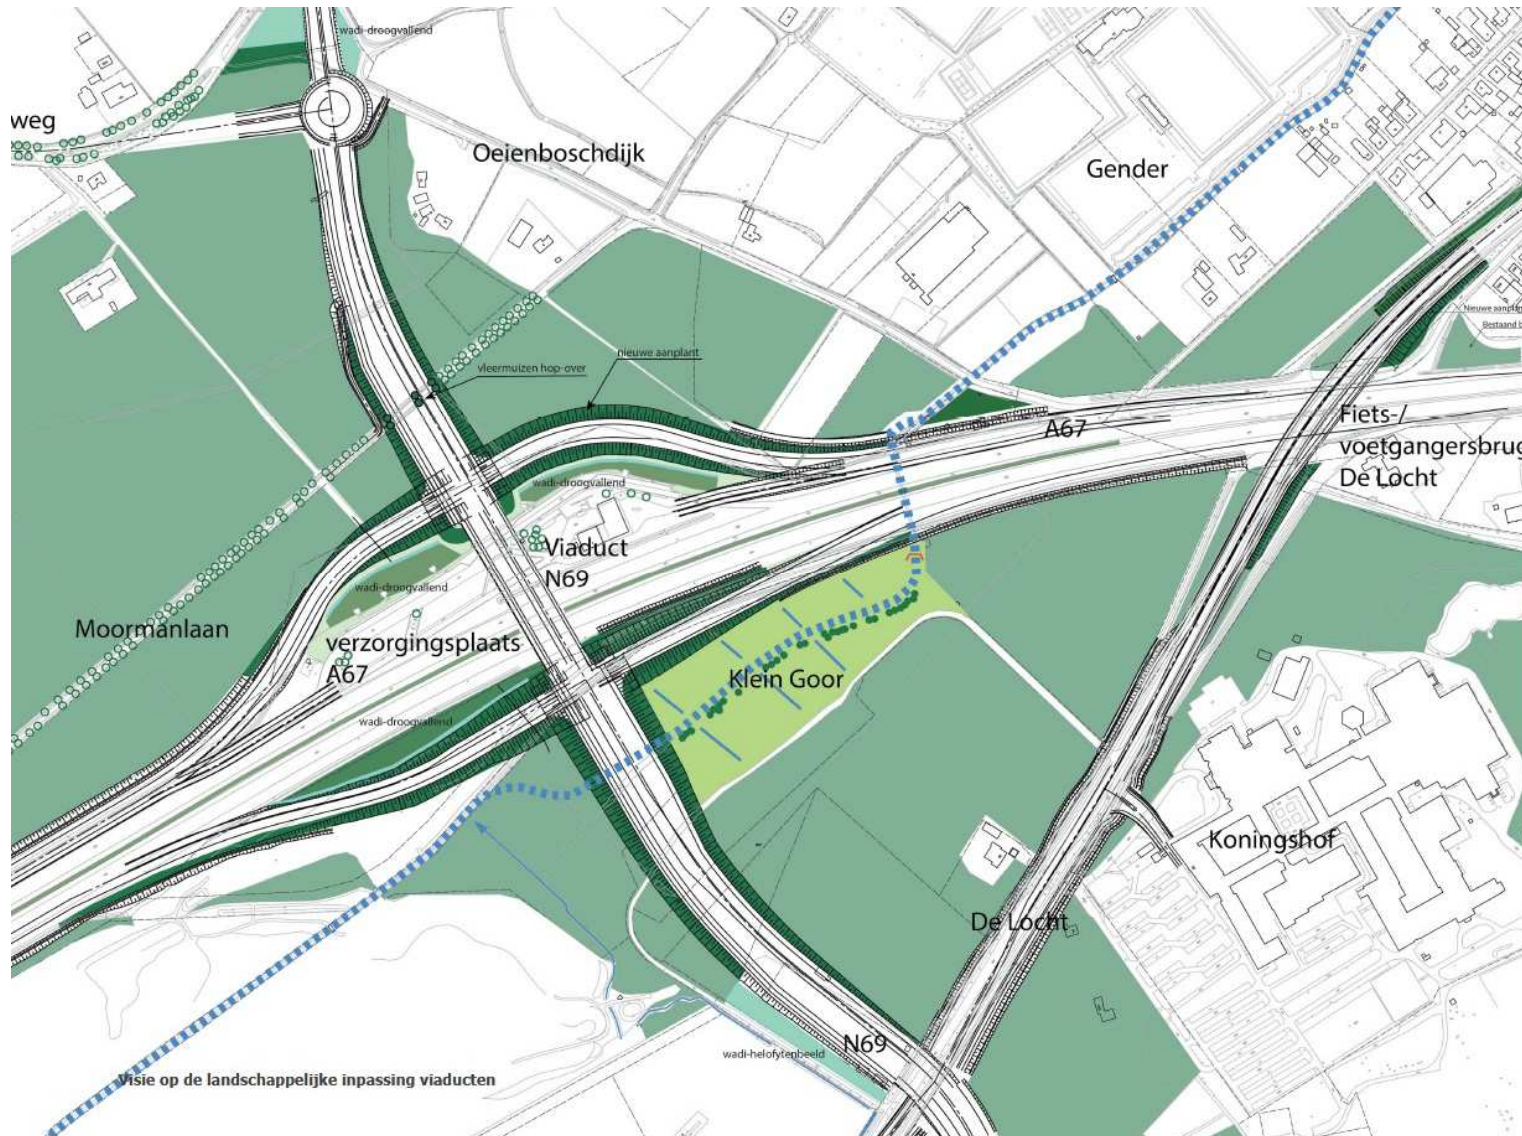

Lokale maatregelen (Nulplus)

- Lokale maatregelen dienen in 2020 totaal te zijn afgerond.
- Voor Waalre maatregelen afgerond, muv HOV

NULPLUSMAATREGELEN


Pakket Nulplusmaatregelen zorgt ervoor dat de doorstroming op de lokale wegen verbetert



Opening fietspad Waalre – Valkenswaard (14 april 2016)



HOV in relatie tot huidige N69??



Integraal Gebiedsplan



- Door de Bestuurlijke werkgroep Gebiedsimpuls op 3 juli 2014 als richtinggevend kader vastgesteld.
- Idem door de Stuurgroep Grenscorridor N69 op 8 juli 2014.

Integraal Gebiedsplan

- Locatiegebonden gebiedsimpulsmaatregelen inclusief landbouwkundige maatregelen;
- Realisatie 120 ha provinciale en 500 ha rijks-EHS;
- Wateropgaven;
- Innovatieve projecten;
- Trekker/coördinatie: Waterschap de Dommel.



Waar staan we met Integraal Gebiedsplan?

Afspraken gemaakt over alle deelprogramma's en trekkers:

- Beekdal Keersop; Waterschap de Dommel
- Beekdal de Run; Waterschap de Dommel
- Molenstraat – Einderheide; gemeente Bergeijk
- De Dommel; (onderdeel Dommeldal/de Hogt; gemeente Waalre.
- Elshouters 't Heike: gemeente Valkenswaard
- De Malpie en omgeving: ntb
- Landbouwmaatregelen: ZLTO
- Fiets-, wandel-, paardrijroute's/netwerk; gemeente Bergeijk

Subsidieregeling tbv 12 mln in voorbereiding.

Planning: eind 2016 inrichtingsvisie en begroting gereed.
Daarna (voorbereiding) uitvoering.

Leader

LAG (lokale actie groep) en LOS (lokale ontwikkel strategie) gereed

Vorbereiding eerste openstelling:

Uitdaging:

juiste projecten met balans tussen administratieve last en omvang projecten

Planning: najaar 2016 eerste openstelling.

Impuls - Uitvoeringsconvenant

- Oude akkoord blijft in tact
- Herbevestigen commitment
- Herijken organisatie voor uitvoeringsfase
- Opzet en bemensing Gebiedsbureau loopt
- Planning: oktober/november 2016 ondertekening





**DAT WAS
HET
ZIJN
ER NOG
VRAGEN?**
