



gemeente
Barneveld

Nr. 1068608

Projectvoorstel

Onderwerp:

Aanleg klompenpad Esvelderbeekzone

Gevraagde beslissing:

1. Instemmen met het informeren van de raad middels bijgevoegde memo over aanleg klompenpad nabij Esvelderbeekzone.

Raad

- ☒ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct: 312
☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Datum 30 januari 2018

Steller: E. Komdeur

Project Esvelderbeekzone

Aantal bijlagen

Projectleider *JK*

Directeur *12/18*

Openbaarheid

- Besluit (voorblad) openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :
Groentje openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :
Bijlagen openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, vermelden op bijlage

	Akkoord	Bespreken	Aantekeningen
Secretaris	<i>JK</i>		
Burgemeester			
Wethouder A. de Kruijf	<i>AK</i>		
Wethouder P.J.T. van Daalen	<i>JK</i>		
Wethouder G.J. van den Hengel		<i>JK</i>	
Wethouder D. J. Dorrestijn-Taal	<i>JK</i>		

Beslissing burgemeester en wethouders :

Nummer op besluitenlijst:

7/14

Memo

Datum:
15 februari 2018

Onderwerp: Tijdelijke wandelverbinding nabij Esvelderbeekzone

Ter attentie van: gemeenteraad

Afzender: Burgemeester en wethouders

In de vergadering van de commissie Samenleving van 17 januari jl. heeft de heer H. Buitenhuis (ChristenUnie) gevraagd waarom de wandelverbinding naar de Esvelderbeekzone nog steeds niet is aangelegd vijf jaar (2013) na toezegging. In deze memo zullen wij deze vraag beantwoorden en geven wij aan op welke termijn deze wandelverbinding zal worden gerealiseerd.

Herinrichting Esvelderbeekzone

Na de planvoorbereiding in de periode 2011-2013 voor de herinrichting van de Esvelderbeekzone is in 2014 gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van de waterberging t.b.v. Harselaar, hermeandering van de Esvelderbeek en inrichting tot ecologische verbindingszone, aanleg wandelpaden en fietspad, realisatie nieuwe natuur i.k.v. boscompensatie en de nieuwbouw van het Kinderhospice Binnenveld. Aansluitend is gestart met de planvorming voor de realisatie van negen woningen (verdeeld over twee woningclusters) in het gebied. De bouw- en woonrijpwerkzaamheden hiervoor waren begin 2016 afgerond, waarna de kavels zijn verkocht aan een marktpartij.

Daarnaast is in het aangrenzende gebied de aanleg van het particuliere landgoed De Wolfskamer in ontwikkeling genomen. Dit landgoed omvat de gefaseerde realisatie van vijf landgoedwoningen, aanleg van nieuwe natuur en wandelpaden (i.k.v. openstelling landgoed).


Vanwege de gefaseerde uitvoering van het totale project, waaronder de aanleg van de wandelpadenstructuur, wilden wij eerst de toegankelijkheid van de Esvelderbeekzone voor wandelaars afgerond hebben zowel richting de Esweg in zuidelijke richting als het Binnenveld in oostelijke richting.

Aanleg wandelverbinding

Gelet op het bovenstaande hebben wij gewacht met de aanleg van het wandelpad vanaf de Bloemendaallaan naar de Esweg als verbinding naar de Esvelderbeekzone. Ons voornemen is om in april het wandelpad aan te leggen langs de loop van de "Trammelantbeek" en vervolgens in noordelijke richting aan te laten takken op de Esweg als toegang naar de bestaande wandelpaden in de Esvelderbeekzone (zie tekening).


De pachter van onze gronden hebben wij inmiddels geïnformeerd over het vrijhouden van het tracé voor het wandelpad. Het pad zal worden voorzien van markeringspaaltjes. Het betreft een tijdelijke wandelverbinding omdat het nog onzeker is hoe de verdere planvorming voor de nieuwe woonwijk Bloemendal, waarbinnen dit wandelpad is gelegen, zal plaatsvinden.

Voordat de wandelverbinding in april wordt aangelegd, zal in de periode februari-maart in het gebied archeologisch onderzoek plaatsvinden in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Bloemendal.

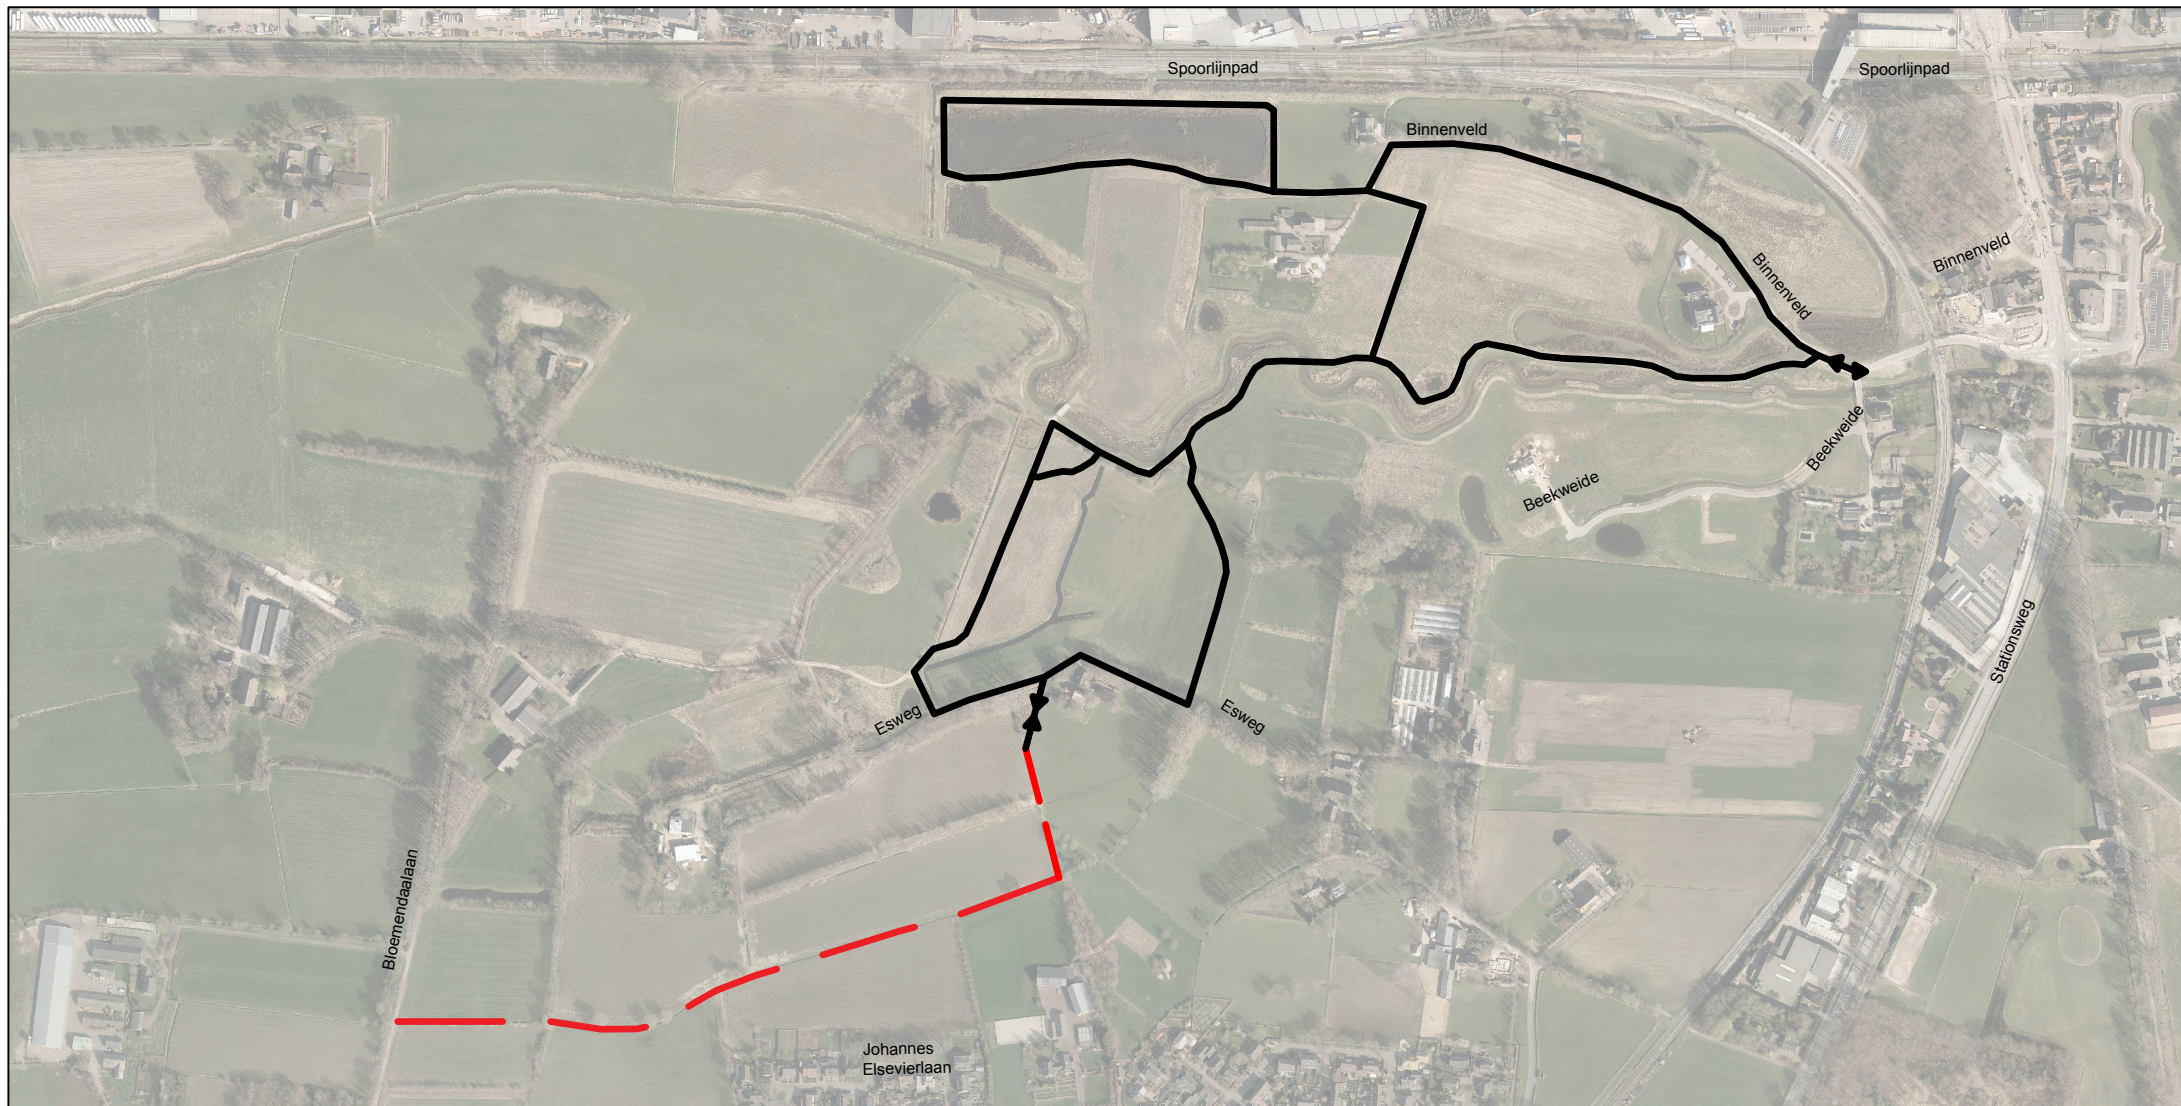

— Bestaande wandelroute

— Tijdelijke wandelverbinding



Tijdelijke wandelverbinding nabij Esvelderbeekzone

Getekend
Datum
Schaal
Tekeningnummer
Status
Filenaam

Team SPO
16-02-2018
nvt

-
Formaat
Luchtfoto wandelroute Esvelderbeekzone

A4
