



**gemeente
Haarlemmermeer**

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Marktlaan 124
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Faxnummer 023 563 95 50

Cluster Samenleving, Sport en Cultuur
Contactpersoon mevrouw Olivie Pijnenburg
Telefoon 0900 1852

Verzenddatum

28 JUNI 2022

Uw brief
Ons kenmerk 2022.0001382
Bijlage(n) Keuringsrapporten gemeentelijke gymzalen 2021
Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fracties van D66 en GroenLinks over de gymzalen

Geachte heer, mevrouw,

Op 22 mei 2022 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van D66 en GroenLinks over de gymzalen. Na een korte inleiding treft u onderstaand de beantwoording aan.

Inleiding

Het artikel op de website van NH nieuws "Duizenden kinderen sporten dagelijks in 'onveilige' gymzalen in Haarlemmermeer", is enkel gebaseerd op een intern onderzoek onder de vakleerkrachten.

Voor het bewegingsonderwijs aan de leerlingen van de scholen zijn wij vanuit onze zorgplicht verantwoordelijk dat er voldoende accommodaties beschikbaar zijn. De accommodatie kan juridisch eigendom zijn van de gemeente, het schoolbestuur of een derde. De gym- en sportaccommodaties die in eigendom zijn van onze gemeente worden beheerd en geëxploiteerd door Sportfondsen Haarlemmermeer BV (SFH). Deze verzorgt naast de exploitatie (huurdersonderhoud zoals schoonmaak, keuring materialen, storingen en dergelijke) van de gymzalen ook de inroosting van de lessen bewegingsonderwijs.

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vormt de basis voor het eigenaars- en huurdersonderhoud. Voor de gymzalen in eigendom van onze gemeente voeren wij het eigenarenonderhoud (buitenkant en grote vervangingsinvesteringen binnenkant) uit. Wij stellen jaarlijks budget beschikbaar aan SFH voor het huurdersonderhoud. Ook ontvangt SFH middelen voor de keuring van de aanwezige materialen. Deze worden eveneens cyclisch gekeurd en onderhouden.

Vraag 1

Vraag 1a Wat is de frequentie van de keuringen geweest in de gymzalen in Badhoevedorp, Vijfhuizen, Zwanenburg en Nieuw-Vennep over de afgelopen 5 jaar? Niet alleen voor de toestellen, maar ook de locatie, ventilatie, akoestiek etc.?

Antwoord:

De materialen in de gymzalen worden jaarlijks gekeurd. Het eigenaarsonderhoud en huurdersonderhoud van de gymzaal vindt plaats op basis van meerjarenonderhoudsplannen. Deze worden eens per vier jaar herijkt op basis van een conditiemeting waarbij het complete object wordt geschouwd door een externe partij. Hierbij wordt niet gekeken naar de akoestiek of ventilatie. Voor de eigenschappen van de ventilatie is het bouwjaar maatgevend.

Vraag 1b: Wat wordt er met de uitkomsten van deze keuringen gedaan?

Antwoord:

Per zaal komt er een plan van aanpak. Leveranciers of onderhoudsmedewerkers van Sportfondsen worden ingeschakeld om de reparaties en vervangingen uit te voeren. Geprobeerd wordt de reparaties buiten de schooltijden en in de vakanties uit te voeren. Dit is niet altijd mogelijk. Afgekeurde toestellen worden verwijderd.

Vraag 1c: Welke gebreken zijn er bij de laatste keuringen van de gymzalen (nog meer) geconstateerd? Hoe is hierop gehandeld?

Antwoord:

De uitkomsten van de keuringsrapporten verschillen per gymzaal. In elke gymzaal worden de materialen gekeurd. Daarbij wordt aangegeven of het betreffende materiaal voldoet, een herstelactie nodig heeft of wordt afgekeurd. In de bijlage treft u de keuringsrapporten van 2021 aan.
Per zaal komt er een plan van aanpak, waarbij de te ondernemen acties worden opgepakt of uitgezet. Zie antwoord op 1b.

Vraag 2: De wethouder geeft aan dat er sober en doelmatig is gehandeld op de eerder geconstateerde gebreken. In het filmpje zien wij echter ringen die buiten gebruik zijn gesteld, wat een tijdelijke oplossing geeft en het gevaar in de ruimte verhoogt. Waarom zijn afgekeurde toestellen niet verwijderd?

Antwoord:

Het toestel in het filmpje is niet buiten gebruik gesteld. De rode sticker is ook niet door de exploitant of inspecteur bevestigd. Deze rode sticker betekent dan ook niet dat de set is afgekeurd.

Vraag 3a: Kan met het buiten gebruik stellen van gymmaterialen het gymprogramma nog goed en veilig doorlopen worden?

Antwoord:

De uitvoering van het gymprogramma is aan de school en de leerkrachten. Wanneer materialen niet voldoen moet dit bij SFH gemeld worden, zodat zij hierop actie kunnen ondernemen. Als er materialen buiten gebruik zijn, zal het programma vanzelfsprekend iets aangepast moeten worden. Na reparatie kan dat gymonderdeel meestal alsnog later in dat schooljaar worden aangeboden.

Vraag 3b: Is er door het buiten gebruik stellen van gymmaterialen een effect te zien op de vaardigheden van de leerlingen?

Antwoord:

Dit is ons niet bekend. De vaardigheden worden beoordeeld door de leerkrachten.

Vraag 5: Gaat de wethouder in op dit verzoek, of zoekt de wethouder naar een andere manier om in contact te komen met deze gymdocenten?

Antwoord:

In het laatste bestuurlijke overleg onderwijshuisvesting, d.d. 22 juni 2022, tussen gemeente en schoolbesturen, was het onderwerp geagendeerd.

Hier is besproken op welke wijze de scholen, vakleerkrachten, medewerkers Sportfondsen en onze gemeente met elkaar in gesprek gaan. Ook is gesproken over het onderzoek dat onze gemeente gaat uitvoeren.

Vraag 6: Vanaf wanneer kan de raad de uitkomsten van het onderzoek verwachten?

Antwoord:

We verwachten dat de opdrachtnemer het onderzoek eind 2022 af heeft gerond, waarna de conclusies en een advies eerste kwartaal 2023 aan het college wordt voorgelegd.

Vraag 7: Kan het college ons informeren over wanneer het op de hoogte is gebracht van de slechte staat van onderhoud van de gymzalen? Is er een korte tijdslijn hiervan te schetsen?

Antwoord:

Vooropgesteld is ons uitgangspunt dat de gymzalen veilig en goed onderhouden zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat een groot deel van onze gymzalen uit de jaren '70 en '80 stammen en daarmee gedateerd zijn op een aantal vlakken zoals akoestiek, ventilatie, afmetingen en sanitair. Dit is één van de redenen dat wij eerdergenoemd onderzoek laten uitvoeren. Dit helpt ons een integraal beeld te vormen hoe we de Haarlemmermeerse gymzalen toekomstbestendig kunnen maken. Dit kan door middel van renovatie dan wel nieuwbouw. Het aspect verduurzaming speelt hierbij ook een grote rol.

Degenen aanwezig bij het sportdebat, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart 2022, hebben de vakleerkrachten gehoord die vanuit de zaal hun zorgen hebben geuit over de kwaliteit van de gymzalen.

Zoals wij al in de brief aan de leden van uw gemeenteraad van 23 mei 2022 hebben geschreven, hebben wij geen berichten ontvangen van Sportfondsen Haarlemmermeer, de schoolbesturen of anderszins over een slechte staat van het onderhoud van de gymzalen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris

Michiel Ruis

b/a
de burgemeester,

Marianne Schuurmans-Wijdeven

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 4

Datum inspectie 05-08-2021
Betreft Gymzaal Amazone
Adres Mathilde Wibautstraat 22, 2135 MC
Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Ringen Touwen	6		6		
Klimrek Handbediend 4V	2	1	1		
Springkast Multifunctioneel	1		1		
Basketbalinstallatie Gasveer	2	2			
Basketbalinstallatie Oefen	4	4			
Combiframe Piramidaal 2-delig	2	2			
Honkpaal 150 cm.	2	2			
Kleutermateriaal Combi brugligger	2	2			
Kleutermateriaal Combi oplegbankblad	2	2			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	2	2			
Korfbal Springstandaard	2	2			1
Korfbal Velgbalring	1	1			
Ladder Combi	1	1			
Landingsmat 300x200x30	2	2			
Lange mat 10 meter	1	1			1
Ringen Ophangframe	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Trapezestok	4	4			
Ringen Turnring	12	12			
Ringen Unitsysteem handbediend	6	6			
Sportvloer Polyurethaan	1	1			
Springplank Budapest	1	1			
Springplank Schoolmodel	2	2			
Springplank Training	1	1			
Trampoline Mini	1	1			
Transportwagen Materiaal	1	1			
Transportwagen Turnmat verticaal	1	1			
Turnbank 360 cm.	6	6			1
Turnbok L.O. model	1	1			
Turnmat 150x100	6	6			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 4

Datum inspectie	05-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Amazone	Opdracht via	-
Adres	Mathilde Wibautstraat 22, 2135 MC Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Turnmat 200x100	4	4			
Volleybal Muurstrip	4	4			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	3	3			
Totalen:	102	94	8	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 4

Datum inspectie 05-08-2021
Betreft Gymzaal Amazone
Adres Mathilde Wibautstraat 22, 2135 MC
Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen	Aantal	Stukprijs	Totaal
Korfbal Springstandaard: (0003387)			
- Lijnhouder springpaal alu	1,0	€ 12,60	€ 12,60
Springkast Multifunctioneel: (0003378)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0003365)			
- Turnbank rubber voet	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0003377)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.			€ 12,60

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 4

Datum inspectie 05-08-2021
Betreft Gymzaal Amazone
Adres Mathilde Wibautstraat 22, 2135 MC
Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Klimrek Handbediend 4V: (0003398) <u>Constatering:</u> Band. Ontbreekt. Opmerking: Opbergriem. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Laag. - 2x Klimrek opbergriem (4000558) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2025		€ 79,00 ☐ € 65,00 ☐
Ringen Touwen: (0003394) <u>Constatering:</u> Touw. Verouderd. Opmerking: Begint te pluizen. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 120x Unitsysteem koord 12 excl. montagekosten (7600028)	2022		€ 837,60 ☐
Springkast Multifunctioneel: (0003378) <u>Constatering:</u> Dop(pen). Ontbreekt. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 2x Springkast afdekdoop J&F (3133120)	2034		€ 30,00 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 4

Datum inspectie 06-08-2021
Betreft Gymzaal van den Berghlaan
Adres Van Den Berghlaan 130a, 2132 AV
Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Combiframe Laag-kort	2			2	
Rekstokinstallatie Flexaturn	1			1	
Klimrek Handbediend 4V	2	1	1		
Sportvloer	1		1		
Turnbank 360 cm.	6	5	1		
Basketbalinstallatie Oefen	1	1			
Basketbalinstallatie Uitval Met Iier	2	2			
Combiframe Trapezoide	2	2			
Doelen Mini	2	2			
Honkpaal 150 cm.	8	8			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	1	1			
Korfbal Springstandaard	2	2			
Ladder Combi	2	2			
Ladder Half/half	1	1			
Landingsmat 300x200x30	2	2			
Lange mat 10 meter	2	2			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Kettingzak	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Touwen	6	6			
Ringen Trapezestok	5	5			
Ringen Turning	12	12			
Springkast Hout	1	1			1
Springkast Hout Groen/Rood-Wit	1	1			1
Springplank Training	2	2			
Trampoline Mini	2	2			
Trampoline Mini openeind	1	1			
Transportwagen Landingsmat dubbel	1	1			
Transportwagen Lange mat wiegmodel	1	1			
Transportwagen Materiaal	1	1			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 4

Datum inspectie	06-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal van den Berghlaan	Opdracht via	-
Adres	Van Den Berghlaan 130a, 2132 AV Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Transportwagen Turnmat horizontaal	3	3			
Turnbok M.O. model	1	1			1
Turnbrug Maat 1	1	1			
Turnmat 150x100	12	12			
Turnmat 200x100	6	6			
Volleybal Tuipaal	2	2			
Totalen:	117	111	3	3	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 4

Datum inspectie 06-08-2021
Betreft Gymzaal van den Berghlaan
Adres Van Den Berghlaan 130a, 2132 AV
Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen		Aantal	Stukprijs	Totaal
Springkast Hout: (0002270)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Hout Groen/Rood-Wit: (0002271)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok M.O. model: (0002697)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Blokkeerbout		1,0	€ 25,50	€ 25,50
Totaal bedrag, exclusief BTW.				€ 25,50

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 4

Datum inspectie 06-08-2021
Betreft Gymzaal van den Berghlaan
Adres Van Den Berghlaan 130a, 2132 AV
Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Combiframe Laag-kort: (0002695) <u>Constatering:</u> Bescherming. Ontbreekt. Opmerking: ook klittenband strookjes ontbreken <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Laag.	2021	X	
- 2x Combiframe laag-kort (10000002)			€ 580,00 ☐
- 2x Combiframe afvoer (AFVOER15)			€ 40,00 ☐
Rekstokinstallatie Flexaturn: (0002172) <u>Constatering:</u> Metaalwerk. Verroest. Opmerking: De palen zijn vastgelopen. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Hoog.	2020	X	
- Reparatie / vervanging op aanvraag			☐
Klimrek Handbediend 4V: (0002153) <u>Constatering:</u> Vloervoorziening. Opmerking: Vloerautomaat is weggezakt in de vloer. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld.	2041		
- 1x Klimrek vloerautomaat (4000554)			€ 86,00 ☐
- 1x Montagekosten (MONTAGE)			€ 65,00 ☐
Sportvloer: (0002705) <u>Constatering:</u> Versleten. Opmerking: In de vloer zitten overal haarscheurtjes. Vloer repareren d.m.v. facelift. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog.	2020		
- Reparatie / vervanging op aanvraag			☐
Turnbank 360 cm.: (0002170) <u>Constatering:</u> Opmerking: Er staan nog 2 oude afgekeurde banken in de zaal. Deze afvoeren. Prioriteit: Laag.	2022		
- 2x Turnbank afvoer (AFVOER4)			€ 42,00 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 3

Datum inspectie	30-07-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Bornholm 1	Opdracht via	-
Adres	Skagerrak 186, 2133 DW Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Rekstokinstallatie Rekstok met gaffels	4	2	2		
Korfbal Springstandaard	2	1	1		
Landingsmat 300x200x30	3	2	1		
Basketbalinstallatie Gasveer	2	2			
Basketbalinstallatie Oefen	2	2			
Klimrek Handbediend 4V	2	2			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	2	2			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	2	2			
Klimwand Boulderwand	6	6			
Rekstokinstallatie Insteekpaal	1	1			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Kettingzak	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Touwen	6	6			
Ringen Trapezestok	3	3			
Ringen Turnring	12	12			
Springplank Training	1	1			
Transportwagen Landingsmat enkel	1	1			
Turnbank 360 cm.	6	6			3
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	3	3			
Totalen:	79	75	4	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 3

Datum inspectie 30-07-2021
Betreft Gymzaal Bornholm 1
Adres Skagerrak 186, 2133 DW Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen		Aantal	Stukprijs	Totaal
Springkast Hout: (0003180)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Multifunctioneel: (0003179)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Trampoline Mini: (0003191)				
- Minitramp stalen veer		1,0	€ 7,95	€ 7,95
Turnbank 360 cm.: (0003356)				
- Turnbank rubber voet		3,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0003182)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0003183)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok M.O. model: (0003181)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.				€ 7,95

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 3

Datum inspectie	30-07-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Bornholm 1	Opdracht via	-
Adres	Skagerrak 186, 2133 DW Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Korfbal Springstandaard: (0003176) 2028 <u>Constatering:</u> Delen. Ontbreekt. Opmerking: opzetbuis <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Laag. - 1x Korfbalspringstandaard opzetbuis (4001006)			€ 85,00 ☐
Landingsmat 300x200x30: (0003345) 2018 <u>Constatering:</u> Vulling/demping. Zacht. <u>Constatering:</u> Band. Gescheurd. Opmerking: Muurbevestiging voor 2 matten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. - 1x Landingsmat opbergriem (4400020) - 1x Montagekosten (MONTAGE) - 1x Landingsmat 300x200x30 (4400015) - 1x Landingsmat afvoer (AFVOER3)			€ 49,50 ☐ € 16,25 ☐ € 1463,00 ☐ € 75,00 ☐
Rekstokinstallatie Rekstok met gaffels: (0003172) 2027 <u>Constatering:</u> Opmerking: Gaffelpennen ontbreken. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Laag. - 1x Reparatiewerk: 2 gaffelpennen type Rogym monteren (REPARATIE)			in regie ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 5

Datum inspectie 02-08-2021
Betreft Gymzaal Bornholm 2
Adres Skagerrak 186, 2133 DW Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Klimrek Handbediend 4V	2		2		
Trampoline Mini openeind	2		2		
Combiframe Trapezoïde	1		1		
Korfbal Springstandaard	4	3	1		
Landingsmat 300x200x20	1		1		
Rekstokinstallatie	1		1		
Sportvloer Polyurethaan	1		1		
Transportwagen Lange mat wiegmodel	1		1		
Turnbrug Maat 1 Sv pax	1		1		
Badminton Badmintonnet	1	1			
Basketbalinstallatie Gasveer	2	2			
Basketbalinstallatie Oefen	2	2			
Honkpaal 150 cm.	7	7			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	2	2			
Klimwand Boulderwand	6	6			
Landingsmat 300x200x30	2	2			
Lange mat 5 meter	2	2			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Kettingzak	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Touwen	6	6			
Ringen Trapezestok	2	2			
Ringen Turning	12	12			
Springkast Hout	1	1			1
Springkast Multifunctioneel	1	1			1
Springplank Training	1	1			
Stokkenbak Verrolbaar	1	1			
Trampoline Mini	1	1			
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			
Turnbank 360 cm.	6	6			4
Turnbok M.O. model	1	1			1

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 5

Datum inspectie	02-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Bornholm 2	Opdracht via	-
Adres	Skagerrak 186, 2133 DW Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Turnbrug Maat 1	1	1			
Turnmat 150x100	10	10			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	4	4			
Volleybal Paal aluminium	2	2			
Totalen:	110	99	11	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 5

Datum inspectie 02-08-2021
Betreft Gymzaal Bornholm 2
Adres Skagerrak 186, 2133 DW Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen		Aantal	Stukprijs	Totaal
Springkast Hout: (0003331)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Multifunctioneel: (0003332)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0003305)				
- Dop, inslag voor buis/koker		2,0	€ 0,00	€ 0,00
- Turnbank rubber voet		4,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0003304)				
- Turnbank rubber voet		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0003303)				
- Turnbank rubber voet		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0003301)				
- Turnbank rubber voet		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok M.O. model: (0003319)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.				€ 0,00

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 5

Datum inspectie	02-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Bornholm 2	Opdracht via	-
Adres	Skagerrak 186, 2133 DW Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Combiframe Trapezoïde: (0003328) <u>Constatering:</u> Bescherming. Versleten. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - 9x Combiframe vloerbescherming JF (7220019) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2020		€ 157,50 ☐ € 48,75 ☐
Klimrek Handbediend 4V: (0003339) <u>Constatering:</u> Delen. Ontbreekt. Opmerking: slinger <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Laag. - 1x Lierslinger (4401011)	2036		€ 38,50 ☐
Klimrek Handbediend 4V: (0003340) <u>Constatering:</u> Delen. Ontbreekt. Opmerking: slingers <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Laag. - 1x Lierslinger (4401011)	2036		€ 38,50 ☐
Korfbal Springstandaard: (0003312) <u>Constatering:</u> Lijnhouder. Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Laag. - 1x Lijnhouder springpaal alu (4001114)	2029		€ 12,60 ☐
Landingsmat 300x200x20: (0003298) <u>Constatering:</u> Band. Beschadigd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Landingsmat opbergriem (4400020) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2024		€ 49,50 ☐ € 16,25 ☐
Rekstokinstallatie: (0003336) <u>Constatering:</u> Delen. Ontbreekt. Opmerking: gaffelpennen <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Laag. - 1x Reparatiewerk: 3 gaffelpennen monteren (REPARATIE)	2022		in regie ☐
Sportvloer Polyurethaan: (0003290) <u>Constatering:</u> Opmerking: Diverse vloerautomaten zijn overbodig en niet afsluitbaar. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 12x Reparatiewerk: 9 vloerautomaten verwijderen en vloer aanhalen (REPARATIE)	2029		in regie ☐
Trampoline Mini openeind: (0003308) <u>Constatering:</u> Dek. Versleten. Opmerking: springdek <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Minitramp springdek openeind (4800054) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2029		€ 201,50 ☐ € 48,75 ☐

Onderhoudsrapport

Pagina 5 van 5

Datum inspectie	02-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Bornholm 2	Opdracht via	-
Adres	Skagerrak 186, 2133 DW Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Trampoline Mini openeind: (0003307)	2024		
<u>Constatering:</u> Dek. Versleten. Opmerking: springdek			
<u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog.			
- 1x Minitramp springdek openeind (4800054)			€ 201,50 ☐
- 1x Montagekosten (MONTAGE)			€ 48,75 ☐
Transportwagen Lange mat wiegmodel: (0003292)	2022		
<u>Constatering:</u> Verouderd.			
<u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Laag.			
- 1x Lange mat wagen wiegmodel (4400210)			€ 240,00 ☐
- 1x Materiaalwagen afvoer (AFVOER16)			€ 20,00 ☐
Turnbrug Maat 1 Sv pax: (0003325)	2028		
<u>Constatering:</u> Hoogteverstelling. Werkt niet. Opmerking: wasknijperveer			
<u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog.			
- 1x Reparatiewerk: wasknijperveer vervangen (REPARATIE)			in regie ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever	Sportfondsen Haarlemmermeer BV	Ordernummer	25140
Klantnummer	C103895	Contractnummer	11341
Contracttype	Inspectie & onderhoud toestellen bewegingsonderwijs en	Datum uitvoering	14/04/2021
Locatie	Deltaweg 107 2134XS HOOFFDORP		
Hal	11341	Bredeschool Floriande Midden	
Toestellen set	11341	Bredeschool Floriande Midden [11341]	
Zaaltype	Sporthal (3 velden)		
Bouwjaar	2005		
Zaalhoogte (m)	7.45		

Algemene opmerking:

Rapport besproken met dhr. Hans Dusseljee

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.


Door de samenstelling van roest kunnen bacteriën zich eenvoudig aan roestige oppervlaktes binden. Wanneer iemand zich verwondt aan een roestig voorwerp kan dit gezondheidsklachten opleveren. Door roest kunnen bijvoorbeeld scherpe vlakken ontstaan, waaraan gebruikers zich kunnen verwonden. Dit zorgt voor een direct gezondheidsrisico, wat er weer voor zorgt dat het toestel wordt afgekeurd. Wanneer het risico op verwonding weg wordt genomen, kan het toestel weer worden goedgekeurd.

Inspectie uitgevoerd door:

Edwin Geels

Rapport besproken met:

Dhr. Hans Dusseljee



Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Zaal algemeen								
<i>Overzicht foto's zaal en berging zijn afgedrukt onder T-Spec inspectie algemeen -</i>								
	1	T-Spec algemeen				2005	Toestellen voorzien van een T-Spec identificatienummer zijn geïnspecteerd, voor een veilig gebruik, conform de T-Spec inspectiemethodiek. De afgekeurde toestellen zijn gemarkeerd met een afkeursticker en zo mogelijk buiten werking gesteld.	
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	2	Klim- en touwladder installatie - Bocht 12 touwen, Gevlochten				2005	De klimtouwswagens zijn gesleten. Actie: deze op aangegeven termijn vervangen	
		00.005.338; 00.005.339						
	4	Klimtouw gevlochten hennep met knopen				2005		
	20	Klimtouw gevlochten hennep				2018		
	24	Klimtouwswagen				2005		2022
	8	Ringstel / Unit - Elektrisch Band, , Rechthoek				2005		
		00.005.411; 00.005.412; 00.005.413; 00.005.414; 00.005.415; 00.005.416; 00.005.417; 00.415.418						
	4	Ringstel / Unit - Handmatig Koord, , Touwdoorvoerblok plafond				2005	Kwaliteit van het koord wordt minder, lichte slijtage op diverse draai- en zwaai punten. De kwaliteit is verminderd door de luchtvochtigheid en door temperatuurverschillen in de zaal. EN12655:1998, EN913:2018, EN-ISO12100-1:2010. Actie: deze op aangegeven termijn vervangen	
		00.005.370; 00.005.371; 00.421.021; 00.421.022; 00.421.023; 00.421.024						
	6	Koord				2005		2022
<i>Plafondtoestel accessoires bewegingsonderwijs</i>								
✓	2	Plafond unit accessoire Schommelframe				2005	De schommelframes hebben ernstige roestvorming en de poedercoating laat los. Verwondingsgevaar aan scherpe loslatende poedercoating. Verwonding in combinatie met roest kan leiden tot bloedarmoede. EN913:2018 5.1.	

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.654.863; 00.654.864						
	4	Plafond unit accessoire Trapezestok				2005	Trapezestok heeft gebruiksslijtage en lichte roestvorming. Actie: op aangegeven termijn vervangen. De niet meer leesbare T Spec stickers vervangen	2023
		00.459.995; 00.483.094; 00.654.849; 00.654.850						
Wandtoestellen								
Wandtoestellen bewegingsonderwijs								
	2	Klimraam Elektrisch verstelbaar Metalen stijlen, 4 vaks				2005		
		00.005.360; 00.005.361						
		Defect/gerepareerd onderdeel						
✓	2	Beveiligingsbeugel wikkelbuis				2005	Beveiligingsbeugels dienen update te ondergaan (montage van gele beveiligingsbeugel).	
Vloerinstallatie								
	2	Rekstokinstallatie Zuil conisch Drie zuilen, 260 cm				2005		
	6	Zuil				2005		
		00.483.082; 00.483.083; 00.483.084; 00.483.085; 00.483.086; 00.483.087;						
Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar								
	2	Bok Primair onderwijs				2005	Leder dekken ingevet	
		00.005.401; 00.005.402						
	2	Combiframe Laag / lang				2005		
		00.005.367; 00.005.368						
	2	Combiframe Piramidaal				2005	Lichte roestvorming, geen directe actie nodig.	
		00.005.366; 00.005.369						
	2	Dekplank (onbekleed)				2005		
	1	Minitrampoline - Gesloten				2020		
		00.654.865						
✓	1	Minitrampoline Gesloten				2005	De bevestigingsgaten van de veren in het frame zijn uitgesleten, EN13219:2008 4.2, 4.5. Tevens springdek versleten. De trampoline moet worden verwijderd of vervangen.	
		00.005.423						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	2	Springkast Standaard, Piramidaal - recht				2005	Door gebruiksslijtage is het houtwerk licht beschadigd, hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak van het toestel gesleten. Hierdoor is de stabiliteit/functionaliiteit van het toestel afgenomen, conform EN913:2018. Het toestel dient op het aangegeven vervangingsjaar te worden vervangen.	2023
		00.005.353; 00.005.355						
	1	Springkast Standaard, Piramidaal - recht				2005	Door gebruiksslijtage is het houtwerk licht beschadigd, hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak van het toestel gesleten. Hierdoor is de stabiliteit/functionaliiteit van het toestel afgenomen, conform EN913:2018. Het toestel dient op het aangegeven vervangingsjaar te worden vervangen.	
		00.005.356						
		Defect/gerepareerd onderdeel						
✓	2	Houtwerk korte zijde				2005	Het toestel bevat losse delen, breuken of losse verbindingen, EN916:2003 4.2, 5.2. De betreffende onderdelen moeten worden vervangen.	
	1	Springplank Bekleed 100 x 55 cm (Mini)				2005		
		00.005.426						
	1	Springplank Bekleed 120 x 60 cm (Junior)				2010		
		00.005.427						
	2	Stick-/stokkenbak Driehoek				2005		
		00.005.357; 00.005.358						
	12	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 300 cm				2005	De laklaag van de zitlat(ten) is versleten waardoor het hout kan uitdrogen splinteren. De zitlatten moeten worden geschuurd en gelakt, EN913 2018 5.1 Vloerbeschermers vertonen gebruikerslijtage. Actie: deze op aangegeven termijn vervangen.	
		00.005.340; 00.005.341; 00.005.342; 00.005.343; 00.005.344; 00.005.345; 00.005.346; 00.005.347; 00.005.348; 00.005.349; 00.005.350; 00.005.351						
	48	Vloerbescherming				2005		2023

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Bewegingsonderwijs accessoires								
	4	Rekstok installatie accessoire Rekstok bewegingsonderwijs 230 cm, Zelf verlengend				2005		
		00.483.088; 00.483.089; 00.483.090; 00.483.091						
Matten								
	2	Mat Landingsmat Bisonsyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2005	De demping is afgenomen tot een matig niveau. De vulling van de mat moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	
		00.459.993; 00.459.994						
	2	Vulling Polyurethaan schuim (PU 30 kg/m³) [wit]				2005		2023
✓	1	Mat Landingsmat Bisonsyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2005	De hoes, rits en/of grepen verkeren in slechte staat en de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende verdeeld over het oppervlak. De gehele mat moet worden verwijderd of vervangen.	
		00.005.397; 00.005.400						
	1	Mat Lange mat Canvas, 6 m				2018		
		00.579.516						
	2	Mat Lange mat Canvas, 6 m				2018		
		00.579.517; 00.579.518						
	10	Mat Turn mat Bisonsyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2020		
		00.654.853; 00.654.854; 00.654.855; 00.654.856; 00.654.857; 00.654.858; 00.654.859; 00.654.860; 00.654.861; 00.654.862						
	3	Mat Turn mat Bisonsyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2018		
		00.522.007; 00.522.008; 00.522.009						
	5	Mat Turn mat Canvas, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2005		
		00.005.377; 00.005.379; 00.005.381; 00.005.383; 00.005.384						
	2	Mat Turn mat Canvas, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2005		
		00.005.390; 00.593.934						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
✓	6	Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2005	De hoes, rits en/of grepen verkeren in slechte staat en de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende verdeeld over het oppervlak. De gehele mat moet worden verwijderd of vervangen.	
		00.005.386; 00.005.387; 00.005.388; 00.005.391; 00.005.392; 00.483.081						

Zaalsporten

Basketbal

	2	Basketbal installatie - Vast				2005		
		00.005.374; 00.005.375						
	2	Bord Hout				2005		
	2	Ring				2005		
	2	Basketbal installatie - Verticaal ophijsbaar > 225 cm, < 325 cm, Rechthoek tussenframe				2005		
		00.005.372; 00.005.373						
	2	Bord Hout				2005		
	2	Valbeveiliging				2015		
	2	Polstering/Padding				2016		
	2	Ring				2005		
	4	Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar 100 cm, Driehoek tussenframe				2005		
		00.005.362; 00.005.363; 00.005.364; 00.005.365						
	4	Bord Hout				2005		
	4	Ring				2005		
		Defect/gerepareerd onderdeel						
✓	4	Hoogte verstelling				2005	Vergrendeling vd binnenbuizen hoogteverstellingen versleten, hierdoor komt de basket bij gebruik snel los uit de ingestelde hoogte. Actie: binnenbuizen en vergrendelpallen vervangen	

Volleybal

	4	Volleybalpaal Aluminium Ø 105 mm				2005		
		00.005.437; 00.005.438; 00.005.439; 00.005.440						
	6	Volleybalverspanning				2005		

Korfbal

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	4	Spring-korfbalpaal Telescopisch Rieten mand, Ø 50 cm (schotelvoet)				2005	Vier ontbrekende inslagdoppen tbv mandbeugels aangebracht.	
		00.005.428; 00.005.429; 00.005.430; 00.005.431						
	2	Mand Riet				2005		2023
Defect/gerepareerd onderdeel								
✓	2	Mand				2005	Beschadigd en stuk. Actie: vervangen door kunststof manden	
	1	Schuifbuis				2005	Één vastzetknop ontbrak, nieuwe aangebracht.	
Turntoestellen en turnspringplanken								
	2	Herenbrug Junior				2005	De wielen vd verrolinrichtingen zijn gesleten, twee brugliggers hebben beschadigingen Actie: deze op aangegeven termijn vervangen (2022) Brugkolomen en brugkoppen gesmeerd, een nieuw geleverde brugligger gemonteerd	
		00.005.434; 00.005.436						
	2	Springplank Wedstrijd				2005		
		00.005.424; 00.005.425						
Klimwand, boulderwand en auto belay systemen								
	2	Klimwand-/Boulderwand - Boulderwand				2005		
		00.005.419; 00.005.420						
	80	Klimgrepen				2005		
Opbergen								
	2	Opberg- /transportwagen Landingsmatten, L - vorm				2005	Vier nieuwe inslagdoppen aangebracht	
		00.005.395; 00.005.396						
	4	Opberg- /transportwagen Lange mat				2005		
		00.005.405; 00.005.406; 00.005.409; 00.005.410						
	2	Opberg- /transportwagen Turnmatten Bodemplaats: 150 x 100 cm, Horizontale opberging				2005	De wiellagers vertonen gebruikerslijtage. Actie: deze op aangegeven termijn vervangen	
		00.005.393; 00.005.394						
	4	Wiel				2005		2022
2022		Wiel				2005		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Sportvloer								
	36	Vloervoorziening Grondpot kort Klein				2005	Vervuildt.	
	6	Vloervoorziening Grondpot rekstokzuil Metaal gecoat, , Conisch				2005	Gesmeerd	
	8	Vloervoorziening Grondpot volleybal/badminton/tennis paal Metaal, gecoat, Ø 105 mm, Nokjes				2005		
	6	Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling				2005	Vier stuks gangbaar gemaakt.	

T-Spec algemeen -



Plafond unit accessoire Schommelframe - 00.654.863; 00.654.864



Klimraam Elektrisch verstelbaar - 00.005.360; 00.005.361



Minitrampoline Gesloten - 00.005.423



Springkast Standaard - 00.005.356



Mat Landingsmat - 00.005.397; 00.005.400



Mat Turn mat - 00.005.386; 00.005.387; 00.005.388; 00.005.391; 00.005.392; 00.483.081



Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar - Hoogte verstelling - 00.005.362; 00.005.363; 00.005.364; 00.005.365



Klimwand-/Boulderwand - Boulderwand - 00.005.419; 00.005.420



Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever	Sportfondsen Haarlemmermeer BV	Ordernummer	25145
Klantnummer	C103895	Contractnummer	11342
Contracttype	Inspectie & onderhoud toestellen bewegingsonderwijs en	Datum uitvoering	12/05/2021
Locatie	Dussenstraat 28-42 2134DL HOOFFDORP		
Hal	11342 Bredeschool In de Breedte		
Toestellen set	11342 Bredeschool In de Breedte [11342]		
Zaaltype	Sporthal (3 velden)		
Bouwjaar	2007		
Zaalhoogte (m)	6.95		

Algemene opmerking:

Rapport telefonisch besproken met dhr. Hans Dusseljee

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.


Door de samenstelling van roest kunnen bacteriën zich eenvoudig aan roestige oppervlaktes binden. Wanneer iemand zich verwondt aan een roestig voorwerp kan dit gezondheidsklachten opleveren. Door roest kunnen bijvoorbeeld scherpe vlakken ontstaan, waaraan gebruikers zich kunnen verwonden. Dit zorgt voor een direct gezondheidsrisico, wat er weer voor zorgt dat het toestel wordt afgekeurd. Wanneer het risico op verwonding weg wordt genomen, kan het toestel weer worden goedgekeurd.

Inspectie uitgevoerd door:

Edwin Geels

Rapport besproken met:

Dhr Hans Dusseljee



Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Zaal algemeen								
<i>Overzicht foto's zaal en berging zijn afgedrukt onder T-Spec inspectie algemeen -</i>								
	1	T-Spec algemeen				2021	Toestellen voorzien van een T-Spec identificatienummer zijn geïnspecteerd, voor een veilig gebruik, conform de T-Spec inspectiemethodiek. De afgekeurde toestellen zijn gemarkeerd met een afkeursticker en zo mogelijk buiten werking gesteld.	
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	2	Klim- en touwladder installatie Recht 12 touwen, Gevlochten, lederen sok				2007		
		00.005.245; 00.005.246						
	4	Klimtouw gevlochten hennep met knopen				2015		
	20	Klimtouw gevlochten hennep				2015		
Defect/gerepareerd onderdeel								
	1	Klimtouwwagen				2007	Ketting tussen twee loopwagens was gebroken. Ketting gerepareerd	
	4	Ringstel / Unit Elektrisch Koord,				2007	De mechanische delen en de nylon koorden vertonen gebruikerslijtage. Actie: units op aangegeven termijn vervangen	2023
		00.005.247; 00.005.248; 00.005.256; 00.005.257						
	2	Ringstel / Unit Elektrisch Koord, , 2 units gekoppeld met hijs as				2007	De mechanische delen en de nylon koorden vertonen gebruikerslijtage. Actie: units op aangegeven termijn vervangen	2023
		00.005.249; 00.005.258						
	1	Ringstel / Unit Elektrisch				2007		
Defect/gerepareerd onderdeel								
✓	20	Schroefkarabiner				2007	De schroefcarabiëners zijn door gebruik te zwaar beschadigd. Actie: deze vervangen	
Plafondtoestel accessoires bewegingsonderwijs								
	1	Plafond unit accessoire - Aluminium sportraam				2007		
		00.610.766						
	2	Plafond unit accessoire - Touwladder				2007		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.421.036; 00.421.037						
	4	Plafond unit accessoire - Trapezestok				2007		
		00.421.066; 00.421.067; 00.421.068; 00.421.069						
	2	Plafond unit accessoire - Verdeelbalk				2007		
		00.421.031; 00.421.032						
	1	Plafond unit accessoire Klimnet In aluminium frame,				2007		
		00.610.767						
Wandtoestellen								
Wandtoestellen bewegingsonderwijs								
	2	Klimraam - Elektrisch verstelbaar Houten stijlen, 4 vaks				2007		
		00.005.251; 00.005.252						
	2	Valbeveiliging				2015		
Vloerinstallatie								
	1	Rekstokinstallatie Zuil conisch Drie zuilen, 260 cm				2007		
	3	Zuil				2007		
		00.421.038; 00.421.039; 00.421.040;						
	1	Rekstokinstallatie Zuil conisch Drie zuilen, 260 cm				2007		
	3	Zuil				2007		
		00.421.043; 00.421.044; 00.421.045;						
Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar								
	1	Bok Primair onderwijs				2007		
		00.005.287						
	1	Bok Primair onderwijs				2007		
		00.421.048						
	2	Combiframe Piramidaal				2007	Zie defecte onderdelen	
		00.005.292; 00.005.323						
	2	Dekplank (onbekleed)				2007		
		Defect/gerepareerd onderdeel						
✓	12	Vloerbescherming				2007	Vloerbeschermers versleten en stuk. Actie: 12 nieuwe vloerbeschermers (model trapezoïde) incl. 24 popnagels monteren	
	3	Honkpaal PU voet 155 cm				2019		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.610.753; 00.610.754; 00.610.755						
✓	3	Honkpaal PU voet 155 cm			■	2007	Stuk en krom geen nethouders meer. Actie: palen verwijderen of vervangen.	
📷								
	5	Honkpaal PU voet 155 cm	■			2018		
		00.610.758; 00.610.762; 00.610.763; 00.610.764; 00.610.765						
	2	Minitrampoline Gesloten	■			2020		
		00.658.296; 00.658.305						
	1	Minitrampoline Gesloten	■			2019		
		00.610.752						
	1	Springdek gecombineerd met padding				2019		
	1	Minitrampoline Open eind	■			2007		
		00.005.325						
	2	Springkast Standaard , Piramidaal - recht		■		2007	Zie defecte onderdelen	
		00.005.281; 00.005.282						
		Defect/gerepareerd onderdeel						
✓	8	Wiel			■	2007	Wielagers versleten Actie: wielen vervangen	
📷								
	1	Springkast Standaard , Piramidaal - recht			■	2007	Zie defecte onderdelen	
		00.005.280						
		Defect/gerepareerd onderdeel						
✓	4	Wiel			■	2007	Lagers vd wielen versleten . Actie: wielen vervangen	
📷								
✓	2	Hoekstijl			■	2007	Hoekstijlen stuk	
	1	Springkast Standaard , Piramidaal - recht			■	2007	Zie defecte onderdelen	
		00.005.283						
		Defect/gerepareerd onderdeel						
✓	4	Wiel			■	2007	Wielagers versleten. Actie: wielen vervangen	
📷								
✓	1	Hoekstijl			■	2007	Één hoekstijl stuk. Actie hoekstijl vervangen	
	1	Springplank Bekleed 120 x 60 cm (Junior)			■	2007	Zie defecte onderdelen	
		00.005.303						
		Defect/gerepareerd onderdeel						
✓	1	Eindkapje			■	2007	Het rubber kapje van de springplank vertoon slijtage/is kapot, EN913:2018. Het kapje moet worden gerepareerd of vervangen.	
📷								

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	1	Springplank Bekleed 120 x 60 cm (Junior)				2006		
		00.005.334						
	2	Turnbank - Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2007	De laklaag van de zitlat(ten) is versleten waardoor het hout kan uitdrogen splinteren. De zitlatten moeten worden geschuurd en gelakt, EN913 2018 5.1 of zitlatten vervangen. Tevens advies om de zitlatten aan de kopzijden vast te zetten dmv M6 x 35 slotbouten en flensmoeren .(8 per bank).	
		00.005.269; 00.005.271						
	10	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 300 cm				2007	De laklaag van de zitlat(ten) is versleten waardoor het hout kan uitdrogen splinteren. De zitlatten moeten worden geschuurd en gelakt, EN913 2018 5.1 of zitlatten vervangen. Tevens advies om de zitlatten aan de kopzijden vast te zetten dmv M6 x 35 slotbouten en flensmoeren .(8 per bank).	
		00.005.266; 00.005.267; 00.005.268; 00.005.270; 00.005.272; 00.005.273; 00.005.274; 00.005.275; 00.005.276; 00.005.277						
Bewegingsonderwijs accessoires								
	3	Rekstok installatie accessoire Rekstok bewegingsonderwijs 230 cm, Zelf verlengend				2007	Één rekstok (00.005.042) niet aangetroffen. Actie: aanschaf van nieuwe rekstok	
		00.421.041; 00.421.046; 00.421.047						
Matten								
	3	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2019		
		00.002.038; 00.579.528; 00.579.529						
✓	1	Mat Landingsmat Canvas, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2007	De hoes, rits en/of grepen verkeren in slechte staat en de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende verdeeld over het oppervlak. De gehele mat moet worden verwijderd of vervangen.	
		00.005.263						
	1	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2015		
		00.421.065						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	2	Mat Lange mat Canvas, 6 m				2016	Bekleding vertoont gebruikerslijtage en vervuild . Tevens hechtkoppelstroken stuk	2022
		00.483.099; 00.483.100						
	2	Mat Lange mat Bisonyl, 6 m				2014	Bekleding vertoont gebruikerslijtage en vervuild . Tevens hechtkoppelstroken stuk	2022
		00.005.320; 00.005.321						
	8	Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2020		
		00.658.297; 00.658.298; 00.658.299; 00.658.300; 00.658.301; 00.658.302; 00.658.303; 00.658.304						
	4	Mat Turn mat Canvas, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2019		
		00.579.523; 00.579.524; 00.579.526; 00.579.527						
✓	4	Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2015	De hoes, rits en/of beluchtigingsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. De mat moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2022
		00.421.054; 00.421.061; 00.421.063						
	3	Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2017		
		00.421.053; 00.522.011; 00.522.012						
Zaalsporten								
Basketbal								
	2	Basketbal installatie - Verticaal ophijsbaar > 225 cm, < 325 cm, Rechthoek tussenframe				2007		
		00.005.250; 00.005.259						
	2	Ring				2007		
	2	Valbeveiliging				2015		
	2	Bord Acryl				2007		
	4	Basketbal installatie - Verticaal ophijsbaar 100 cm, Rechthoek tussenframe				2007		
		00.005.253; 00.005.254; 00.005.261; 00.005.262						
	4	Ring				2007		
	4	Bord Polyester				2007		
	4	Basketbal installatie Vast				2007		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.005.255; 00.005.260; 00.005.264; 00.005.265						
	4	Ring				2007		
	4	Bord Hout				2007		
Volleybal								
	4	Volleybal profiel - Open doos profiel , Opbouw				2007		
		00.579.519; 00.579.520; 00.579.521; 00.579.522						
	4	Volleybalpaal Aluminium Ø 100 mm				2007	Zie defecte onderdelen	
		00.005.209; 00.005.210; 00.005.331; 00.005.332						
	3	Volleybalverspanning				2007		
Defect/gerepareerd onderdeel								
	✓ 3	Volleybalverspanning				2007	Katrollenset tbv verspanning stuk. Actie: verspanning in koker vervangen	
Korfbal								
	✓ 4	Spring-korfbalpaal Telescopisch Kunststof mand training,				2007	Roestvorming op de buitenbuizen. Actie: deze in eigen beheer te schuren en schilderen of staanders vervangen	
		00.005.305; 00.005.306; 00.005.307; 00.005.308						
								
Turntoestellen en turnspringplanken								
	1	Damesbrug Training				2007		
		00.005.329						
	1	Evenwichtsbalk Oefenbalk 500 cm, 10 cm				2007		
		00.005.285						
	1	Evenwichtsbalk Wedstrijd Origineel, 10 cm				2007		
		00.005.330						
	1	Herenbrug Senior				2007	Zie defecte onderdelen	
		00.005.328						
Defect/gerepareerd onderdeel								
	✓ 1	Vloerbescherming				2007	Vloerbeschermers stuk. Actie: vier nieuwe vloerbeschermers monteren	
	✓ 1	Herenbrug Senior				2007	Bevestigingskop ligger stuk, veerpallen in binnen kolommen weg en vloerbeschermers stuk en versleten. Actie: brug afvoeren of vervangen	
		00.005.286						
	1	Springplank Wedstrijd				2014	Zie defecte onderdelen	

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.005.333						
		Defect/gerepareerd onderdeel						
✓	1	Eindkapje				2014	Het rubber kapje van de springplank vertoon slijtage/is kapot, EN913:2018. Het kapje moet worden gerepareerd of vervangen.	
Opbergen								
	1	Opberg- /transportwagen - Accessoires plafond unit				2007		
		00.005.302						
	2	Opberg- /transportwagen Landingsmatten , T - vorm				2007	Acht nieuwe inslagdoppen aangebracht	
		00.005.289; 00.005.326						
	2	Opberg- /transportwagen Lange mat				2007		
		00.005.322; 00.005.335						
	2	Opberg- /transportwagen Turnmatten , Verticale opberging				2007		
		00.005.301; 00.005.319						
Sportvloer								
	24	Vloervoorziening Grondpot kort Klein				2007		
	6	Vloervoorziening Grondpot rekstokzuil Metaal gecoat, , Conisch				2007		
	8	Vloervoorziening Grondpot volleybal/badminton/tennis paal Metaal, gecoat, Ø 100 mm, Ronde flens				2007		
	6	Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling				2016		

T-Spec algemeen -



Combiframe Piramidaal - Vloerbescherming - 00.005.292; 00.005.323




Honkpaal PU voet -




Springkast Standaard - Hoekstijl - 00.005.280




Springplank Bekleed - Eindkapje - 00.005.303

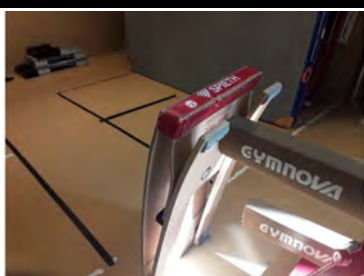

Mat Landingsmat - 00.005.263

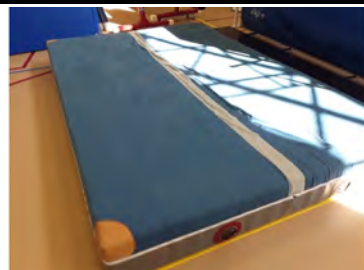

Mat Lange mat - 00.005.320; 00.005.321

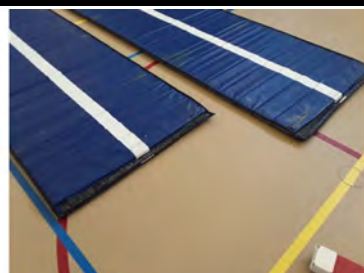

Volleybalpaal Aluminium - Volleybalverspanning - 00.005.209; 00.005.210; 00.005.331; 00.005.332



Spring-korfbalpaal Telescopisch - 00.005.305; 00.005.306; 00.005.307; 00.005.308



Herenbrug Senior - Vloerbescherming - 00.005.328



Herenbrug Senior - 00.005.286



Springplank Wedstrijd - Eindkapje - 00.005.333



Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 6

Datum inspectie 27-07-2021
Betreft Gymzaal Graan voor Visch
Adres Graan voor Visch 14001, 2132 VW
Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Turnmat 150x100	15	8	7		
Klimrek Handbediend 4V	2		2		
Lange mat 5 meter	2		2		
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1		1		
Sportvloer Polyurethaan	1		1		
Trampoline Mini	1		1		
Transportwagen Landingsmat dubbel	1		1		
Basketbalinstallatie Gasveer	2	2			
Doelen Mini	2	2			
Honkpaal 150 cm.	3	3			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	1	1			
Klimwand Boulderwand	6	6			
Korfbal Springstandaard	2	2			
Landingsmat 300x200x30	2	2			
Rekstokinstallatie Bovenloop rail met palen	1	1			
Rekstokinstallatie Rekstok met gaffels	1	1			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Kettingzak	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Touwen	6	6			
Ringen Turnring	12	12			
Springkast Multifunctioneel Groen/Rood-Wit	2	2			1
Springplank Training	2	2			
Stokkenbak Verrolbaar	1	1			
Transportwagen Lange mat wiegmodel	1	1			
Transportwagen Minitrampoline	1	1			
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			
Tschoukbalframe 100x100 cm.	2	2			
Turnbank 360 cm.	6	6			1
Turnbok L.O. model	1	1			
Turnbrug Maat 1	2	2			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 6

Datum inspectie	27-07-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Graan voor Visch	Opdracht via	-
Adres	Graan voor Visch 14001, 2132 VW Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Volleybal Muurstrip	4	4			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	2	2			
Volleybal Paal aluminium	1	1			
Volleybal Tuipaal	1	1			
Totalen:	109	94	15	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 6

Datum inspectie 27-07-2021
Betreft Gymzaal Graan voor Visch
Adres Graan voor Visch 14001, 2132 VW
Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen	Aantal	Stukprijs	Totaal
Springkast Multifunctioneel Groen/Rood-Wit: (0003138)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Springkast, grijze stapeldop	1,0	€ 8,00	€ 8,00
Springkast Multifunctioneel Groen/Rood-Wit: (0003137)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0003152)			
- Dop, inslag voor buis/koker	2,0	€ 0,00	€ 0,00
- Turnbank rubber voet	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0003141)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.			€ 8,00

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 6

Datum inspectie 27-07-2021
Betreft Gymzaal Graan voor Visch
Adres Graan voor Visch 14001, 2132 VW
Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Offerte	Aantal	Stukprijs	Uitvoeren
- Turnbank 360 cm. (7200019)	6,0	€ 580,00	€ 3480,00 ☐
- Turnbank afvoer (AFVOER4)	6,0	€ 21,00	€ 126,00 ☐

Onderhoudsrapport

Pagina 5 van 6

Datum inspectie	27-07-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Graan voor Visch	Opdracht via	-
Adres	Graan voor Visch 14001, 2132 VW Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Klimrek Handbediend 4V: (0003120) <u>Constatering:</u> (Val)beveiliging. Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Hoog. - 1x Valbeveiliging (1200030)	2034		€ 539,00 ☐
Klimrek Handbediend 4V: (0003121) <u>Constatering:</u> (Val)beveiliging. Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Hoog. <u>Constatering:</u> Vloervoorziening. Vervuild. Opmerking: Vloerautomaten zitten vast en bouten zijn afgebroken. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - 1x Valbeveiliging (1200030) - 1x Reparatiewerk: vloerautomaten schoonmaken en/of bouten vervangen (REPARATIE)	2034		€ 539,00 ☐ in regie ☐
Klimtouwinstallatie 12 touwen: (0003124) <u>Constatering:</u> Runners. Versleten. Opmerking: Runners lopen af en toe vast. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. <u>Constatering:</u> Metaalwerk. Verouderd. Opmerking: Installatie verouderd. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - Reparatie / vervanging op aanvraag - Alternatief: 12x Klimtouw railrunner excl. montage (4000200)	2023		☐ € 660,00 ☐
Lange mat 5 meter: (0003158) <u>Constatering:</u> Bekleding. Vervuild. Opmerking: Schimmel <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Lange mat 5 meter (44001001) - 1x Lange mat afvoer (AFVOER2)	2021		€ 998,00 ☐ € 75,00 ☐
Lange mat 5 meter: (0003159) <u>Constatering:</u> Bekleding. Vervuild. Opmerking: Schimmel <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Lange mat 5 meter (44001001) - 1x Lange mat afvoer (AFVOER2)	2021		€ 998,00 ☐ € 75,00 ☐
Sportvloer Polyurethaan: (0003163) <u>Constatering:</u> Vervuild. Opmerking: Vloer is plakkerig. <u>Constatering:</u> Beschadigd. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - 1x Reparatiewerk: diverse beschadigingen repareren (REPARATIE) - 1x Reparatiewerk: vloer diep reinigen (REPARATIE)	2029		in regie ☐ in regie ☐

Onderhoudsrapport

Pagina 6 van 6

Datum inspectie	27-07-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Graan voor Visch	Opdracht via	-
Adres	Graan voor Visch 14001, 2132 VW Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Trampoline Mini: (0003142) 2022 <u>Constatering:</u> Opmerking: Elastiek is versleten. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. <u>Constatering:</u> Dek. Versleten. Opmerking: Stiksels laten los en zijn erg vuil. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Hoog. <u>Constatering:</u> Bescherming. Gescheurd. Opmerking: Lusjes afdekrand. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Hoog.			
- 1x Minitramp 112 (4800000)			€ 543,00 ☐
- 1x Minitramp afvoer (AFVOER9)			€ 20,00 ☐
- Alternatief: 1x Minitramp afdekrand elastiek (4800050)			€ 25,75 ☐
- Alternatief: 1x Minitramp afdekrand lusjes stikken (4800057)			€ 89,00 ☐
- Alternatief: 1x Minitramp springdek 60x60 (4800053)			€ 165,50 ☐
- Alternatief: 1x Montagekosten (MONTAGE)			€ 97,50 ☐
Transportwagen Landingsmat dubbel: (0003157) 2029 <u>Constatering:</u> Band. Beschadigd. Opmerking: Bevestigingsklip is afgebroken. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld.			
- 2x Landingsmatwagen vastzetriem (4400021)			€ 103,00 ☐
Turnmat 150x100: (0003154) 2013 <u>Constatering:</u> Vulling/demping. Verouderd. Opmerking: Vullingen zijn slap en erg zwaar. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Laag.			
- 7x Turnmat canvas 150x100 (7210001)			€ 1715,00 ☐
- 7x Turnmat afvoer (AFVOER1)			€ 98,00 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 4

Datum inspectie	12-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Kinheim	Opdracht via	-
Adres	Kinheim 4, 1161 AP Zwanenburg	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Ringen Touwen	6		6		
Ringen Kettingzak	3	2	1		
Klimrek Elektrisch 4V	2	1	1		
Springkast Multifunctioneel	2	1	1		
Ballenwagen Met schuifdeur	1	1			
Basketbalinstallatie Gasveer	2	2			
Combiframe Piramidaal	1	1			
Combiframe Trapezoide	1	1			
Honkpaal 150 cm.	8	8			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	1	1			
Klimwand Boulderwand	1	1			
Korfbal Springstandaard	2	2			
Ladder Half/half	1	1			
Ladder Kippenladder	1	1			
Landingsmat 300x200x30	2	2			
Lange mat 10 meter	1	1			
Rekstokinstallatie Muurzuil Met bovenlooprail	1	1			
Rekstokinstallatie Rekstok met gaffels	1	1			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Trapezestok	1	1			
Ringen Turnring	12	12			
Sportvloer Polyurethaan	1	1			
Springplank Budapest	1	1			
Springplank Training	2	2			
Stokkenbak Verrolbaar	1	1			
Trampoline Mini	1	1			
Transportwagen Lange mat wiegmodel	1	1			
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			
Turnbank 360 cm.	6	6			3
Turnbok L.O. model	1	1			1

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 4

Datum inspectie	12-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Kinheim	Opdracht via	-
Adres	Kinheim 4, 1161 AP Zwanenburg	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Turnbrug Maat 1 Erhard sport	1	1			
Turnmat 150x100	12	12			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	1	1			
Volleybal Paal aluminium	1	1			
Totalen:	100	91	9	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 4

Datum inspectie	12-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Kinheim	Opdracht via	-
Adres	Kinheim 4, 1161 AP Zwanenburg	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen	Aantal	Stukprijs	Totaal
Springkast Multifunctioneel: (0001071)			
- Leren dek invetten	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001083)			
- Turnbank rubber voet	6,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0001077)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.			€ 0,00

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 4

Datum inspectie	12-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Kinheim	Opdracht via	-
Adres	Kinheim 4, 1161 AP Zwanenburg	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Klimrek Elektrisch 4V: (0001061) <u>Constatering:</u> Vloervoorziening. Verbogen. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 3x Klimrek vloerautomaat (4000554) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2045		€ 258,00 ☐ € 195,00 ☐
Ringen Kettingzak: (0001062) <u>Constatering:</u> Bak. Gescheurd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 1x Kettingzak (6640015) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2020		€ 155,00 ☐ € 48,75 ☐
Ringen Touwen: (0001062) <u>Constatering:</u> Touw. Gescheurd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - Reparatie / vervanging op aanvraag	2019		☐
Springkast Multifunctioneel: (0001072) <u>Constatering:</u> Dop(pen). Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Laag. - 2x Springkast afdekdoop J&F (3133120)	2034		€ 30,00 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 4

Datum inspectie 04-08-2021
Betreft Gymzaal Langerak
Adres Langerak 42a, 2157 PG Abbenes

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	2		2		
Afschermnet Berging	1	1			
Badminton Ondersteuningspaal	10	10			
Basketbalinstallatie Gasveer	2	2			
Combiframe Trapezoïde	1	1			
Evenwichtsbalk 5 meter houten balk	1	1			
Evenwichtsbalk Combi	1	1			
Kleutermateriaal Duikelstang	1	1			
Kleutermateriaal Glijbaan	1	1			
Kleutermateriaal Zwiepplank	4	4			
Klimrek Handbediend 4V	2	2			
Klimrek Spin	1	1			
Klimrek Verplaatsbaar	1	1			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	2	2			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimwand Boulderwand	1	1			
Korfbal Springstandaard	4	4			
Ladder Combi	3	3			
Ladder Half/half	1	1			
Landingsmat 300x200x30	1	1			
Lange mat 5 meter	1	1			
Rekstokinstallatie Muurzuil Met bovenloop rail	1	1			
Rekstokinstallatie Rekstok met gaffels	4	4			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Kettingzak	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Touwen	6	6			
Ringen Turning	12	12			
Sportvloer Polyurethaan	1	1			
Springkast Hout	2	2			2
Springkast Kleuter	1	1			
Springplank Kleuter	1	1			
Springplank Schoolmodel	1	1			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 4

Datum inspectie	04-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Langerak	Opdracht via	-
Adres	Langerak 42a, 2157 PG Abbenes	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Springplank Training	1	1			
Stokkenbak Verrolbaar	1	1			
Trampoline Mini	2	2			
Transportwagen Landingsmat dubbel	1	1			
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			
Turnbank 360 cm.	6	6			6
Turnbok L.O. model	1	1			1
Turnbrug Maat 1	1	1			
Turnmat 150x100	12	12			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	2	2			
Volleybal Paal aluminium	2	2			
Volleybal Tuipaal	2	2			
Totalen:	123	121	2	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 4

Datum inspectie 04-08-2021
Betreft Gymzaal Langerak
Adres Langerak 42a, 2157 PG Abbenes

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen	Aantal	Stukprijs	Totaal
Springkast Hout: (0001007)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0000985)			
- Turnbank rubber voet	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0000986)			
- Turnbank rubber voet	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0000987)			
- Turnbank rubber voet	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0000988)			
- Turnbank rubber voet	3,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0000989)			
- Turnbank rubber voet	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0000990)			
- Turnbank rubber voet	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0001019)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.			€ 0,00

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 4

Datum inspectie	04-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Langerak	Opdracht via	-
Adres	Langerak 42a, 2157 PG Abbenes	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Klimtouwinstallatie Omlooptouw: (0000966)	2021		
<u>Constatering:</u> Touw. Versleten.			
<u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld.			
- 2x Klimtouwinstallatie omlooptouw (4000102)			€ 405,50 ☐
- 1x Montagekosten (MONTAGE)			€ 65,00 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 4

Datum inspectie	03-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Linqenda 1	Opdracht via	-
Adres	Kalslagerring 19, 2151 TA Nieuw-Vennep	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Turnmat 150x100	8	5	3		
Ringen Touwen	6		6		
Rekstokinstallatie Insteekpaal	1		1		
Sportvloer Hout	1		1		
Springkast Multifunctioneel	2	1	1		1
Badminton Badmintonnet	1	1			
Badminton Ondersteuningspaal	2	2			
Basketbalinstallatie Gasveer	2	2			
Combiframe	1	1			
Klimrek Handbediend 4V	2	2			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	1	1			
Klimwand Boulderwand	1	1			
Korfbal Springpaal	2	2			
Korfbal Springstandaard	2	2			
Landingsmat 300x200x30	2	2			
Lange mat 10 meter	1	1			
Lange mat 5 meter	2	2			
Rekstokinstallatie Rekstok met gaffels	4	4			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Kettingzak	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Trapezestok	2	2			
Ringen Turning	12	12			
Springplank Budapest	1	1			
Springplank Kleuter	1	1			
Springplank Training	2	2			
Stokkenbak Verrolbaar	1	1			
Trampoline Mini	1	1			
Transportwagen Landingsmat dubbel	1	1			
Transportwagen Lange mat wiegmodel	2	2			
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 4

Datum inspectie	03-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Linqenda 1	Opdracht via	-
Adres	Kalslagerring 19, 2151 TA Nieuw-Vennep	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Turnbank 360 cm.	6	6			6
Turnbok L.O. model	1	1			1
Turnbrug Maat 1	1	1			
Volleybal Muurstrip	4	4			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	2	2			
Volleybal Tuipaal Middenpaal	1	1			
Totalen:	102	90	12	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 4

Datum inspectie 03-08-2021
Betreft Gymzaal Linqenda 1
Adres Kalslagerring 19, 2151 TA Nieuw-Vennep

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen		Aantal	Stukprijs	Totaal
Springkast Multifunctioneel: (0001772)				
- Leren dek invetten		2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001758)				
- Turnbank rubber voet		3,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001757)				
- Turnbank rubber voet		2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001759)				
- Turnbank rubber voet		4,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001760)				
- Turnbank rubber voet		3,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001761)				
- Turnbank rubber voet		2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001762)				
- Turnbank rubber voet		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0001778)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.				€ 0,00

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 4

Datum inspectie	03-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Linquenda 1	Opdracht via	-
Adres	Kalslagerring 19, 2151 TA Nieuw-Vennep	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Rekstokinstallatie Insteekpaal: (0001766) <u>Constatering:</u> Dop(pen). Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Reparatiewerk: 2 doppen type jf monteren (REPARATIE)	2034		in regie ☐
Ringen Touwen: (0001755) <u>Constatering:</u> Touw. Verouderd. Opmerking: Begint te raffelen. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 6x Ringenstellen touwwerk (6640040) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2021		€ 1003,50 ☐ € 195,00 ☐
Sportvloer Hout: (0001800) <u>Constatering:</u> Vloervoorziening. Werkt niet. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 18x Reparatiewerk: in zaal 1 en 2 zijn nog oude niet afsluitbare vloerautomaten aanwezig. Vloerautomaten verwijderen en gaten in de vloer afwerken. (REPARATIE)			in regie ☐
Springkast Multifunctioneel: (0001773) <u>Constatering:</u> Dop(pen). Ontbreekt. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Laag. - 1x Springkast afdekop J&F (3133120)	2032		€ 15,00 ☐
Turnmat 150x100: (0001785) <u>Constatering:</u> Hoes. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 3x Turnmathoes 150x100 (7210010)	2024		€ 516,00 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 4

Datum inspectie	02-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Linqenda 2	Opdracht via	-
Adres	Kalslagerring 19, 2151 TA Nieuw-Vennep	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Ringen Touwen	6		6		
Basketbalinstallatie Gasveer	2	1	1		
Badminton Ondersteuningspaal	2	2			
Combiframe Trapezoïde	1	1			
Honkpaal 150 cm.	10	10			
Klimrek Handbediend 4V	2	2			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	1	1			
Klimwand Boulderwand	1	1			
Korfbal Springpaal	2	2			
Korfbal Springstandaard	2	2			
Landingsmat 300x200x30	2	2			
Lange mat 5 meter	2	2			
Rekstokinstallatie Flexaturn	1	1			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Kettingzak	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Trapezestok	4	4			
Ringen Turnring	12	12			
Sportvloer Hout	1	1			
Springkast Multifunctioneel	2	2			2
Springplank Kleuter	1	1			
Springplank Schoolmodel	2	2			
Springplank Training	1	1			
Trampoline Mini	1	1			
Transportwagen Lange mat wiegmodel	1	1			
Transportwagen Materiaal	1	1			
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			
Turnbank 360 cm.	6	6			4
Turnbok flexaturn	5	5			5
Turnbok L.O. model	1	1			1
Turnbrug Maat 1	1	1			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 4

Datum inspectie	02-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Linqenda 2	Opdracht via	-
Adres	Kalslagerring 19, 2151 TA Nieuw-Vennep	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Turnmat 150x100	10	10			
Volleybal Muurstrip	4	4			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	2	2			
Totalen:	112	105	7	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 4

Datum inspectie 02-08-2021
Betreft Gymzaal Linqenda 2
Adres Kalslagerring 19, 2151 TA Nieuw-Vennep

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen		Aantal	Stukprijs	Totaal
Springkast Multifunctioneel: (0001825)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Multifunctioneel: (0001824)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001816)				
- Turnbank rubber voet		4,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001814)				
- Turnbank rubber voet		2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001813)				
- Turnbank rubber voet		4,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001812)				
- Turnbank rubber voet		2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok flexaturn: (0001817)				
- Leren dek invetten		14,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0001833)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.				€ 0,00

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 4

Datum inspectie	02-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Linqenda 2	Opdracht via	-
Adres	Kalslagerring 19, 2151 TA Nieuw-Vennep	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Basketbalinstallatie Gasveer: (0001809)	2028		
<u>Constatering:</u> Net. Versleten.			
<u>Advies:</u> Onderdeel vervangen.			
<u>Constatering:</u> Ring. Gescheurd.			
<u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag.			
- 1x Basketbalring vast (400006)			€ 60,00 ☐
- 1x Basketbalnet gemonteerd (400008)			€ 24,85 ☐
- 1x Montagekosten (MONTAGE)			€ 32,50 ☐
Ringten Touwen: (0001805)	2021		
<u>Constatering:</u> Touw. Versleten.			
<u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog.			
- 6x Ringstellen touwwerk (6640040)			€ 1003,50 ☐
- 1x Montagekosten (MONTAGE)			€ 195,00 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 4

Datum inspectie	05-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Noorderdreef	Opdracht via	-
Adres	Noorderdreef 104, 2152 AA Nieuw-Vennep	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	2		2		
Sportvloer Polyurethaan	1		1		
Basketbalinstallatie Gasveer	2	2			
Combiframe Trapezoide	1	1			
Honkpaal 150 cm.	8	8			
Klimrek Handbediend 4V	2	2			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimwand Boulderwand	1	1			
Korfbal Springstandaard	4	4			
Landingsmat 300x200x30	2	2			
Lange mat 10 meter	2	2			
Rekstokinstallatie Muurzuil	1	1			
Rekstokinstallatie Rekstok met gaffels	1	1			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Kettingzak	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Touwen	6	6			
Ringen Turnring	12	12			
Springkast Hout	1	1			
Springkast Multifunctioneel	1	1			1
Springplank Budapest	1	1			
Springplank Schoolmodel	1	1			
Springplank Training	3	3			
Trampoline Mini	1	1			
Trampoline Mini openeind	1	1			
Transportwagen Landingsmat dubbel	1	1			
Transportwagen Lange mat wiegmodel	2	2			2
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			
Turnbank 360 cm.	6	6			
Turnbok L.O. model	1	1			1
Turnbrug Heren	1	1			
Turnbrug Maat 1	1	1			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 4

Datum inspectie	05-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Noorderdreef	Opdracht via	-
Adres	Noorderdreef 104, 2152 AA Nieuw-Vennep	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Turnmat 150x100	12	12			
Volleybal Muurstrip	3	3			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	2	2			
Volleybal Paal aluminium	1	1			
Volleybal Tuipaal	1	1			
Totalen:	108	105	3	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 4

Datum inspectie	05-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Noorderdreef	Opdracht via	-
Adres	Noorderdreef 104, 2152 AA Nieuw-Vennep	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen	Aantal	Stukprijs	Totaal
Springkast Multifunctioneel: (0001606)			
- Leren dek invetten	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Transportwagen Lange mat wiegmodel: (0001632)			
- Wielen schoonmaken	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Transportwagen Lange mat wiegmodel: (0001634)			
- Wiel 50 x 18 Rhombus	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0001613)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.			€ 0,00

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 4

Datum inspectie	05-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Noorderdreef	Opdracht via	-
Adres	Noorderdreef 104, 2152 AA Nieuw-Vennep	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Klimtouwinstallatie Omlooptouw: (0001589)	2014		
<u>Constatering:</u> Touw. Verouderd. Opmerking: begint te raffelen			
<u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld.			
- 2x Klimtouwinstallatie omlooptouw (4000102)			€ 405,50 ☐
- 1x Montagekosten (MONTAGE)			€ 65,00 ☐
Sportvloer Polyurethaan: (0001636)	2029		
<u>Constatering:</u> Vloervoorziening. Verouderd. Opmerking: Diverse vloerautomaten zijn overbodig en niet afsluitbaar.			
<u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Gemiddeld.			
<u>Constatering:</u> Gescheurd.			
<u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog.			
- 1x Reparatiewerk: 9 overbodige vloerautomaten verwijderen en vloer aanhelen. Beschadigingen in de vloer onder basketbord repareren. (REPARATIE)			in regie ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 4

Datum inspectie 06-08-2021
Betreft Gymzaal Noppenstraat
Adres Noppenstraat 90, 2136 AK Zwaanshoek

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Turnmat 150x100	12	8	4		
Evenwichtsbalk 5 meter Houten balk	1		1		
Klimrek Handbediend 4V	2	1	1		
Korfbal Springstandaard	4	3	1		
Sportvloer Polyurethaan	1		1		
Springkast Multifunctioneel	2	1	1		1
Basketbalinstallatie Gasveer	2	2			
Combiframe Piramidaal 2-delig	2	2			1
Combiframe Trapezoïde	2	2			
Evenwichtsbalk Combi	2	2			
Honkpaal 150 cm.	1	1			
Kleutermateriaal Combi oplegbankblad	2	2			
Klimtouwinstallatie 6 touwen	2	2			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	2	2			
Klimwand Boulderwand	1	1			
Ladder Combi	2	2			
Landingsmat 300x200x30	2	2			
Lange mat 5 meter	2	2			
Rekstokinstallatie Muurzuil Bovenloop rail	1	1			
Rekstokinstallatie Rekstok met gaffels	1	1			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Kettingzak	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Touwen	6	6			
Ringen Turnring	1	1			
Springplank Budapest	1	1			
Springplank Training	3	3			
Stokkenbak Verrolbaar	2	2			
Trampoline Mini	1	1			
Transportwagen Lange mat wiegmodel	1	1			
Transportwagen Materiaal Voor kleutermateriaal	1	1			
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 4

Datum inspectie	06-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Noppenstraat	Opdracht via	-
Adres	Noppenstraat 90, 2136 AK Zwaanshoek	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Turnbank 360 cm.	6	6			
Turnbok L.O. model	1	1			1
Turnbrug Maat 1	2	2			
Volleybal Muurstrip	3	3			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	2	2			
Volleybal Paal aluminium Middenpaal	2	2			
Volleybal Tuipaal	1	1			
Totalen:	101	92	9	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 4

Datum inspectie 06-08-2021
Betreft Gymzaal Noppenstraat
Adres Noppenstraat 90, 2136 AK Zwaanshoek

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen		Aantal	Stukprijs	Totaal
Combiframe Piramidaal 2-delig: (0001532)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Multifunctioneel: (0001523)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0001533)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.				€ 0,00

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 4

Datum inspectie	06-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Noppenstraat	Opdracht via	-
Adres	Noppenstraat 90, 2136 AK Zwaanshoek	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Evenwichtsbalk 5 meter Houten balk: <u>Constatering:</u> Hoogteverstelling. Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Hoog. - 1x Reparatiewerk: verstelstang type Rogym monteren (REPARATIE)	2022		in regie ☐
Klimrek Handbediend 4V: (0001501) <u>Constatering:</u> Bediening. Ontbreekt. Opmerking: Lierslinger. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Laag. - 1x Lierslinger (4401011)	2034		€ 38,50 ☐
Korfbal Springstandaard: (0001546) <u>Constatering:</u> Schuifstuk. Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Laag. - 1x Korfbalspringstandaard opzetbuis (4001006)	2034		€ 85,00 ☐
Sportvloer Polyurethaan: <u>Constatering:</u> Opmerking: Er zitten nog oude overbodige vloerautomaten in de vloer. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Laag. - 8x Reparatiewerk: 9 vloerautomaten verwijderen en vloer herstellen (REPARATIE)			in regie ☐
Springkast Multifunctioneel: (0001524) <u>Constatering:</u> Dek. Versleten. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Laag. - 1x Springkastdek opnieuw bekleden (6800120)	2029		€ 415,00 ☐
Turnmat 150x100: (0001557) <u>Constatering:</u> Hoes. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 4x Turnmathoes 150x100 (7210010)	2022		€ 688,00 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 5

Datum inspectie	04-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Pampusstraat	Opdracht via	-
Adres	Pampusstraat 30, 1435 LJ Rijsenhout	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Ringen Turnring	12	2	10		
Ringen Trapezestok	4	2	2		
Klimrek Handbediend 4V	2		2		
Ringen Kettingzak	2	1	1		
Evenwichtsbalk Verbreder 3 meter	1		1		
Landingsmat 300x200x30	2	1	1		
Rekstokinstallatie Insteekpaal	1		1		
Sportvloer Polyurethaan	1		1		
Badminton Ondersteuningspaal	1	1			
Basketbalinstallatie Gasveer	2	2			
Doelen Mini	2	2			
Evenwichtsbalk 5 meter	1	1			
Evenwichtsbalk Combi	1	1			
Kleutermateriaal Glijbaan	1	1			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	1	1			
Korfbal Springstandaard	4	4			
Ladder Combi	1	1			
Lange mat 10 meter	1	1			
Lange mat 5 meter	2	2			
Rekstokinstallatie Rekstok met gaffels	4	4			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Ringenstok	1	1			1
Ringen Touwen	6	6			
Springkast Hout	2	2			2
Springplank Kleuter	1	1			
Springplank Training	2	2			
Stokkenbak Verrolbaar	1	1			
Trampoline Mini	1	1			
Trampoline Mini openeind	2	2			
Transportwagen Lange mat wiegmodel	2	2			
Transportwagen Minitrampoline	1	1			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 5

Datum inspectie	04-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Pampusstraat	Opdracht via	-
Adres	Pampusstraat 30, 1435 LJ Rijsenhout	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			
Turnbank 360 cm.	6	6			5
Turnbok L.O. model	1	1			1
Turnbrug Dames vrijstaand	1	1			
Turnbrug Maat 1	1	1			
Turnmat 150x100	17	17			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	1	1			
Volleybal Tuipaal	1	1			
Totalen:	113	94	19	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 5

Datum inspectie 04-08-2021
Betreft Gymzaal Pampusstraat
Adres Pampusstraat 30, 1435 LJ Rijsenhout

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen	Aantal	Stukprijs	Totaal
Ringen Ringenstok: (0002730)			
- Reparatiwerk: rechtgemaakt	0,1	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Hout: (0002735)			
- Springkast veer hoekklos	1,0	€ 10,50	€ 10,50
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Wielen schoonmaken	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Hout: (0002736)			
- Wielen schoonmaken	1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0002722)			
- Turnbank rubber voet	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0002723)			
- Turnbank rubber voet	3,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0002724)			
- Turnbank rubber voet	4,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0002725)			
- Turnbank rubber voet	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0002726)			
- Turnbank rubber voet	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0002741)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.			€ 10,50

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 5

Datum inspectie	04-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Pampusstraat	Opdracht via	-
Adres	Pampusstraat 30, 1435 LJ Rijsenhout	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Evenwichtsbalk Verbreder 3 meter: (0002759) <u>Constatering:</u> Bekleding. Gescheurd. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Laag. - 1x Evenwichtsbalk verbreder opnieuw bekleden (1600014)	2024		€ 205,00 ☐
Klimrek Handbediend 4V: (0002712) <u>Constatering:</u> Vloervoorziening. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 1x Klimrek vloerautomaat (4000554) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2033		€ 86,00 ☐ € 65,00 ☐
Klimrek Handbediend 4V: (0002713) <u>Constatering:</u> Hijssysteem. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 2x Gasveer (7001) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2033		€ 170,00 ☐ € 65,00 ☐
Landingsmat 300x200x30: (0002720) <u>Constatering:</u> Band. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 1x Landingsmat opbergriem (4400020) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2024		€ 49,50 ☐ € 32,50 ☐
Rekstokinstallatie Insteekpaal: (0002721) <u>Constatering:</u> Vloervoorziening. Ontbreekt. Opmerking: 39x3,5 mm <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Hoog. - 1x Reparatiewerk: deksel monteren (REPARATIE)	2022		in regie ☐
Ringens Kettingzak: (0002715) <u>Constatering:</u> Bak. Gescheurd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Kettingzak (6640015) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2018		€ 155,00 ☐ € 48,75 ☐
Ringens Trapezestok: (0002758) <u>Constatering:</u> Houtwerk. Beschadigd. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 2x Trapezestok (7220052)	2030		€ 251,50 ☐
Ringens Turning: (0002715) <u>Constatering:</u> Ring. Verouderd. Opmerking: dun en verdroogd <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 10x Ringensstel turning (6640025)	2020		€ 600,00 ☐

Onderhoudsrapport

Pagina 5 van 5

Datum inspectie	04-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Pampusstraat	Opdracht via	-
Adres	Pampusstraat 30, 1435 LJ Rijsenhout	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties

Vervangjaar

Afgekeurd

Uitvoeren

Sportvloer Polyurethaan:

2030

Constatering: Opmerking: Vloer is glad.Advies: Repareren. **Prioriteit: Hoog.**

- 1x Reparatiewerk: vloer diep reinigen (REPARATIE)

in regie ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 5

Datum inspectie 05-08-2021
Betreft Gymzaal Papaverstraat
Adres Ridderspoorstraat 22, 2153 BV
Nieuw-Vennep

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Klimwand Boulderwand	6	5	1		
Ringen Conventioneel	6		6		
Combiframe Trapezoïde	2		2		
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	2		2		
Springplank Schoolmodel	2		2		
Klimrek Handbediend 4V	2	1	1		
Sportvloer Polyurethaan	1		1		
Basketbalinstallatie Gasveer	2	2			
Honkpaal 150 cm.	4	4			
Klimtouwinstallatie 6 touwen	2	2			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Korfbal Springstandaard	2	2			
Landingsmat 300x200x30	2	2			
Lange mat 10 meter	1	1			
Rekstokinstallatie Insteekpaal	4	4			
Ringen Kettingzak	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Touwen	6	6			
Ringen Turnring	12	12			
Springkast Hout	3	3			3
Springplank Training	1	1			
Stokkenbak Verrolbaar	1	1			
Trampoline Mini	2	2			1
Transportwagen Lange mat wiegmodel	1	1			
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			
Turnbank 360 cm.	6	6			
Turnbok L.O. model	1	1			1
Turnbok M.O. model	1	1			1
Turnbrug Maat 1	2	2			
Turnmat 150x100	6	6			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	3	3			
Volleybal Paal aluminium	2	2			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 5

Datum inspectie	05-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Papaverstraat	Opdracht via	-
Adres	Ridderspoorstraat 22, 2153 BV Nieuw-Vennep	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Totalen:	101	86	15	0
-----------------	------------	-----------	-----------	----------

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 5

Datum inspectie 05-08-2021
Betreft Gymzaal Papaverstraat
Adres Ridderspoorstraat 22, 2153 BV
Nieuw-Vennep

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen		Aantal	Stukprijs	Totaal
Springkast Hout: (0002898)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Hout: (0002897)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Hout: (0002896)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Trampoline Mini: (0002895)				
- Minitramp afdekrand elastiek		1,0	€ 25,75	€ 25,75
Turnbok M.O. model: (0002892)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.				€ 25,75

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 5

Datum inspectie	05-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Papaverstraat	Opdracht via	-
Adres	Ridderspoorstraat 22, 2153 BV Nieuw-Vennep	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Combiframe Trapezoïde: (0002905) <u>Constatering:</u> Bescherming. Versleten. Opmerking: Buis diam. 32,4mm <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Hoog. - 1x Reparatiewerk: 16 stuks beschermers vervangen (REPARATIE) - Alternatief: 2x Trapezoïde 180x120 cm. (7220000) - Alternatief: 2x Trapezoïde afvoer (AFVOER15)	2022		in regie ☐ € 1060,00 ☐ € 40,00 ☐
Klimrek Handbediend 4V: (0002875) <u>Constatering:</u> Hijssysteem. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 2x Gasveer (7001) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2026		€ 170,00 ☐ € 65,00 ☐
Klimtouwinstallatie Omlooptouw: (0002772) <u>Constatering:</u> Touw. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 2x Klimtouwinstallatie omlooptouw (4000102) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2020		€ 405,50 ☐ € 65,00 ☐
Klimwand Boulderwand: (0002873) <u>Constatering:</u> Grepen. Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Laag. - 1x Klimgrepen (4000755) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2026		€ 107,50 ☐ € 97,50 ☐
Ringconventioneel: (0002876) <u>Constatering:</u> Kikkerplaat. Verouderd. Opmerking: 120mm hh M12 <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 2x Kikkerplaat 3 delig, incl. ketting en noodchalmen (6640033)	2027		€ 734,70 ☐
Sportvloer Polyurethaan: (0002917) <u>Constatering:</u> Opmerking: Oude niet afsluitbare vloerautomaten zijn overbodig. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - 1x Reparatiewerk: 9 vloerautomaten verwijderen en vloer aanhalen (REPARATIE)	2029		in regie ☐
Springplank Schoolmodel: (0002907) <u>Constatering:</u> Houtwerk. Verouderd. Opmerking: weinig vering <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Springplank Gymnova school (6800000) - 1x Springplank afvoer (AFVOER5)	2019		€ 480,58 ☐ € 25,00 ☐

Onderhoudsrapport

Pagina 5 van 5

Datum inspectie	05-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Papaverstraat	Opdracht via	-
Adres	Ridderspoorstraat 22, 2153 BV Nieuw-Vennep	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Springplank Schoolmodel: (0002908)	2019		
<u>Constatering:</u> Houtwerk. Verouderd. Opmerking: weinig vering			
<u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld.			
- 1x Springplank Gymnova school (6800000)			€ 480,58 ☐
- 1x Springplank afvoer (AFVOER5)			€ 25,00 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 5

Datum inspectie 03-08-2021
Betreft Gymzaal Pax 1
Adres Hammarskoldstraat 238, 2131 VN Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Klimrek Handbediend 4V	2		1	1	
Turnmat 150x100	13	12	1		
Ringen Turning	12	10	2		
Trampoline Mini	2		2		
Landingsmat 300x200x30	3	2	1		
Lange mat 10 meter	1		1		
Springplank Schoolmodel	1		1		
Badminton Badmintonnet	2	2			
Basketbalinstallatie Gasveer 100 cm.	2	2			
Combiframe Laag-lang	2	2			
Honkpaal 150 cm.	7	7			
Kleutermateriaal Glijbaan	2	2			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	1	1			
Klimwand Boulderwand	6	6			
Korfbal Springstandaard	2	2			
Ladder Combi	1	1			
Ladder Half/half	1	1			
Rekstokinstallatie	1	1			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Kettingzak	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Touwen	6	6			
Ringen Trapezestok	2	2			
Sportvloer Polyurethaan	1	1			
Springkast Multifunctioneel	1	1			1
Springkast Multifunctioneel Groen/Rood-Wit	1	1			
Springplank Training	2	2			
Stokkenbak Verrolbaar	1	1			
Transportwagen Lange mat wiegmodel	1	1			
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 5

Datum inspectie	03-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Pax 1	Opdracht via	-
Adres	Hammarskoldstraat 238, 2131 VN Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Turnbank 360 cm.	6	6			4
Turnbok L.O. model	1	1			
Turnbrug Heren	1	1			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	4	4			
Volleybal Paal aluminium	2	2			
Volleybal Tuipaal	3	3			
Totalen:	116	106	9	1	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 5

Datum inspectie 03-08-2021
Betreft Gymzaal Pax 1
Adres Hammarskoldstraat 238, 2131 VN
Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen		Aantal	Stukprijs	Totaal
Springkast Multifunctioneel: (0000935)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001852)				
- Turnbank rubber voet		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001854)				
- Turnbank rubber voet		2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001855)				
- Turnbank rubber voet		2,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.				€ 0,00

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 5

Datum inspectie	03-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Pax 1	Opdracht via	-
Adres	Hamarskoldstraat 238, 2131 VN Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Klimrek Handbediend 4V: (0000919) <u>Constatering:</u> Vloervoorziening. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. <u>Constatering:</u> Metaalwerk. Verbogen. Opmerking: Het klimrek klappt moeilijk uit. <u>Advies:</u> Repareren. <u>Constatering:</u> Hijssysteem. Versleten. Opmerking: Gasveren. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. - 1x Reparatiewerk: metaalwerk reviseren en rek opnieuw afstellen (REPARATIE) in regie ☐ - 2x Gasveer (7001) € 170,00 ☐ - 1x Klimrek vloerautomaat (4000554) € 86,00 ☐ - 1x Reparatiewerk: in de vloer zijn nog 7 oude vloerautomaten aanwezig. Deze verwijderen en vloer aangieten. (REPARATIE) in regie ☐ - 1x Montagekosten (MONTAGE) € 130,00 ☐	2021	X	
Klimrek Handbediend 4V: (0000920) <u>Constatering:</u> Vloervoorziening. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 3x Klimrek vloerautomaat (4000554) € 258,00 ☐ - 1x Montagekosten (MONTAGE) € 195,00 ☐	2026		
Landingsmat 300x200x30: (0000915) <u>Constatering:</u> Vulling/demping. Zacht. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 1x Landingsmat vulling 300x200x30 (4400010) € 787,00 ☐ - 1x Landingsmat vulling afvoer (AFVOER3) € 75,00 ☐	2030		
Lange mat 10 meter: (0001860) <u>Constatering:</u> Bekleding. Gescheurd. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - 1x Reparatiewerk: stuk canvas plakken (REPARATIE) in regie ☐	2022		
Ringens Turnring: (0000921) <u>Constatering:</u> Ring. Beschadigd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 2x Ringensstel turning (6640025) € 120,00 ☐	2021		
Springplank Schoolmodel: (0000939) <u>Constatering:</u> Versleten. Opmerking: Vering onvoldoende. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Springplank Gymnova school (6800000) € 480,58 ☐ - 1x Springplank afvoer (AFVOER5) € 25,00 ☐	2021		

Onderhoudsrapport

Pagina 5 van 5

Datum inspectie 03-08-2021
Betreft Gymzaal Pax 1
Adres Hammarskoldstraat 238, 2131 VN
Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Trampoline Mini: (0000941) <u>Constatering:</u> Bevestiging. Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Hoog. - 16x Minitramp elastisch riempje afdekrand (4800056) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2029		€ 46,40 ☐ € 32,50 ☐
Trampoline Mini: (0000942) <u>Constatering:</u> Bevestiging. Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Gemiddeld. - 4x Minitramp elastisch riempje afdekrand (4800056)	2029		€ 11,60 ☐
Turnmat 150x100: (0001859) <u>Constatering:</u> Hoes. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 1x Turnmathoes 150x100 (7210010)	2024		€ 172,00 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 4

Datum inspectie 04-08-2021
Betreft Gymzaal Pax 2
Adres Hammarskjoldstraat 240, 2131 VN
Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Ringen Turnring	12		12		
Turnmat 150x100	8	7	1		
Springkast Multifunctioneel	2		2		
Landingsmat 300x200x30	1		1		
Sportvloer Polyurethaan	1		1		
Trampoline Mini	2	1	1		
Basketbalinstallatie Gasveer 100 cm.	2	2			
Combiframe Piramidaal 2-delig	2	2			
Evenwichtsbalk	1	1			
Klimrek Handbediend 4V	2	2			
Klimtouwinstallatie 6 touwen	2	2			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	2	2			
Klimwand Boulderwand	6	6			
Korfbal Springstandaard	2	2			
Lange mat 5 meter	2	2			
Rekstokinstallatie Muurzuil Bovenloop rail	1	1			
Rekstokinstallatie Rekstok met gaffels	1	1			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Kettingzak	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Touwen	6	6			
Springkast Hout	1	1			1
Springplank Budapest	2	2			
Springplank Schoolmodel	1	1			
Stokkenbak Verrolbaar	1	1			
Transportwagen Lange mat wiegmodel	1	1			
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			
Turnbank 360 cm.	6	6			6
Turnbok L.O. model	1	1			1
Turnbrug Maat 1	1	1			
Volleybal Muurstrip	2	2			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 4

Datum inspectie	04-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Pax 2	Opdracht via	-
Adres	Hammarskjoldstraat 240, 2131 VN Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	4	4			
Volleybal Paal aluminium	2	2			
Volleybal Tuipaal	1	1			
Totalen:	100	82	18	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 4

Datum inspectie 04-08-2021
Betreft Gymzaal Pax 2
Adres Hammarskjoldstraat 240, 2131 VN
Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen	Aantal	Stukprijs	Totaal
Springkast Hout: (0001882)			
- Wielen schoonmaken	1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Multifunctioneel: (0001883)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Wielen schoonmaken	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Multifunctioneel: (0001884)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001897)			
- Turnbank rubber voet	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001898)			
- Turnbank rubber voet	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001986)			
- Turnbank rubber voet	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (19.JEKA 0004341)			
- Turnbank rubber voet	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (19.JEKA 0004342)			
- Turnbank rubber voet	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (19.JEKA 0004343)			
- Turnbank rubber voet	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0001890)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.			€ 0,00

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 4

Datum inspectie 04-08-2021
Betreft Gymzaal Pax 2
Adres Hammarskjoldstraat 240, 2131 VN
Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Landingsmat 300x200x30: (19.JEKA 0004346) <u>Constatering:</u> Band. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 1x Landingsmat opbergriem (4400020) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2030		€ 49,50 ☐ € 32,50 ☐
Ringen Turnring: (0001873) <u>Constatering:</u> Opmerking: 2 ringen zijn beschadigd en de overige ringen zijn verdroogd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 12x Ringenstel turnring (6640025) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2017		€ 720,00 ☐ € 48,75 ☐
Sportvloer Polyurethaan: (19.JEKA 0004351) <u>Constatering:</u> Opmerking: Er zitten nog oude vloerautomaten in de vloer. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 8x Reparatiewerk: 7 oude vloerautomaten verwijderen en vloer aanhelen (REPARATIE)			in regie ☐
Springkast Multifunctioneel: (0001883) <u>Constatering:</u> Dop(pen). Gebroken. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 2x Springkast afdek Dop J&F (3133120)	2034		€ 30,00 ☐
Springkast Multifunctioneel: (0001884) <u>Constatering:</u> Hijssysteem. Gescheurd. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - 1x Reparatiewerk: verrolinrichting lassen (REPARATIE)	2039		in regie ☐
Trampoline Mini: (0001886) <u>Constatering:</u> Opmerking: De zeilogen zijn losgeraakt. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Reparatiewerk: zeilogen monteren (REPARATIE)	2024		in regie ☐
Turnmat 150x100: (19.JEKA 0004345) <u>Constatering:</u> Hoes. Gescheurd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Turnmatioes 150x100 (7210010)	2026		€ 172,00 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 4

Datum inspectie 28-07-2021
Betreft Sporthal Sandestein
Adres Sandestein 40, 2151 KG Nieuw-Vennep

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Volleybal Paal aluminium	3	1		2	
Ringen Kettingzak	3	1	2		
Basketbalinstallatie Uitval Met Iier	1		1		
Klimrek Handbediend 4V	2	1	1		
Landingsmat 300x200x30	5	4	1		
Badminton Paal verrolbaar	11	11			
Basketbalinstallatie Gasveer	4	4			
Basketbalinstallatie Oefen	4	4			
Basketbalinstallatie Uitval Ophijsbaar	1	1			
Combiframe Piramidaal	4	4			
Combiframe Piramidaal 2-delig	2	2			
Evenwichtsbalk Combi	2	2			
Kleutermateriaal Zwiepplank	2	2			
Klimtouwinstallatie 8 touwen	4	4			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	32	32			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	4	4			
Korfbal Springstandaard	1	1			
Lange mat 5 meter	2	2			
Rekstokinstallatie Insteekpaal Combi	1	1			
Ringen Koord	7	7			
Ringen Koord Handbediend	7	7			
Ringen Ringenstok	2	2			
Ringen Unitsysteem handbediend Handbediend	14	14			
Springkast Hout	2	2			2
Springkast Multifunctioneel	2	2			1
Springplank Budapest	1	1			
Springplank Kleuter	1	1			
Springplank Training	2	2			
Stokkenbak Verrolbaar	2	2			
Trampoline Mini	1	1			
Trampoline Mini openeind	1	1			
Transportwagen Landingsmat dubbel	1	1			
Transportwagen Lange mat omklapmodel	1	1			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 4

Datum inspectie	28-07-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Sporthal Sandestein	Opdracht via	-
Adres	Sandestein 40, 2151 KG Nieuw-Vennep	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Transportwagen Lange mat wiegmodel	1	1			
Transportwagen Turnmat verticaal	1	1			
Turnbank 360 cm.	17	17			2
Turnbok L.O. model	2	2			2
Turnbrug Maat 2	1	1			
Turnmat 150x100	7	7			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	3	3			
Totalen:	164	157	5	2	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 4

Datum inspectie 28-07-2021
Betreft Sporthal Sandestein
Adres Sandestein 40, 2151 KG Nieuw-Vennep

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen		Aantal	Stukprijs	Totaal
Springkast Hout: (0002988)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Hout: (0002989)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Multifunctioneel: (0022498)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Multifunctioneel: (0022497)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0002955)				
- Turnbank rubber voet		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0002965)				
- Wiel 75 x 18		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0002949)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0002994)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.				€ 0,00

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 4

Datum inspectie	28-07-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Sporthal Sandestein	Opdracht via	-
Adres	Sandestein 40, 2151 KG Nieuw-Vennep	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Volleybal Paal aluminium: (0002938) <u>Constatering:</u> Metaalwerk. Gescheurd. Opmerking: Scherp en gevaarlijk. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - 1x Reparatiewerk: 1x hefboom Nijha vervangen (REPARATIE)	2031	X	in regie ☐
Basketbalinstallatie Uitval Met lier: (0002919) <u>Constatering:</u> Delen. Versleten. Opmerking: Lier hapert. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Lier HadeF (4401003) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2025		€ 375,00 ☐ € 65,00 ☐
Klimrek Handbediend 4V: (0002928) <u>Constatering:</u> Vloervoorziening. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 1x Klimrek vloerautomaat (4000554) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2031		€ 86,00 ☐ € 97,50 ☐
Landingsmat 300x200x30: (0002966) <u>Constatering:</u> Hoes. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 1x Landingsmathoes 300x200x30 (4400014)	2022		€ 680,00 ☐
Ringens Kettingzak: (0002932) <u>Constatering:</u> Bekleding. Gescheurd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 2x Kettingzak (6640015) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2029		€ 310,00 ☐ € 97,50 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever	Sportfondsen Haarlemmermeer BV	Ordernummer	25144
Klantnummer	C103895	Contractnummer	11339
Contracttype	Inspectie & onderhoud toestellen bewegingsonderwijs en	Datum uitvoering	11/05/2021
Locatie	Sarabande 1 2152TB NIEUW VENNEP		
Hal	11339	Bredeschool-Breedenborgh	
Toestellen set	11339	Bredeschool-Breedenborgh [11339]	
Zaaltype	Sporthal (3 velden)		
Bouwjaar	2005		
Zaalhoogte (m)	6.98		

Algemene opmerking:

Rapport besproken met dhr Hans Dusseljee

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.


Door de samenstelling van roest kunnen bacteriën zich eenvoudig aan roestige oppervlaktes binden. Wanneer iemand zich verwondt aan een roestig voorwerp kan dit gezondheidsklachten opleveren. Door roest kunnen bijvoorbeeld scherpe vlakken ontstaan, waaraan gebruikers zich kunnen verwonden. Dit zorgt voor een direct gezondheidsrisico, wat er weer voor zorgt dat het toestel wordt afgekeurd. Wanneer het risico op verwonding weg wordt genomen, kan het toestel weer worden goedgekeurd.

Inspectie uitgevoerd door:

Edwin Geels

Rapport besproken met:

Dhr. Hans Dusseljee



Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Zaal algemeen								
<i>Overzicht foto's zaal en berging zijn afgedrukt onder T-Spec inspectie algemeen -</i>								
	1	T-Spec algemeen				2005	Toestellen voorzien van een T-Spec identificatienummer zijn geïnspecteerd, voor een veilig gebruik, conform de T-Spec inspectiemethodiek. De afgekeurde toestellen zijn gemarkeerd met een afkeursticker en zo mogelijk buiten werking gesteld.	
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	1	Klim- en touwladder installatie - Bocht 12 touwen, Gevlochten, lederen sok				2005		
		00.005.200						
	11	Klimtouw gevlochten hennep				2016		
	1	Klimtouw gevlochten hennep met knopen				2005		
	1	Klim- en touwladder installatie - Bocht 12 touwen, Gevlochten, lederen sok				2005		
		00.005.129						
	11	Klimtouw gevlochten hennep				2016		
	1	Klimtouw gevlochten hennep met knopen				2014		
	3	Ringstel / Unit - Handmatig Koord, , Touwdoorvoerblok plafond				2005	Kwaliteit van de koorden wordt minder, lichte slijtage op diverse draai- en zwaai punten. De kwaliteit is verminderd door de luchtvochtigheid en door temperatuurverschillen in de zaal. EN12655:1998, EN913:2018, EN-ISO12100-1:2010. Actie: koorden op aangegeven termijn vervangen	
		00.421.070; 00.421.071; 00.421.072						
	3	Koord				2005		2022
	3	Ringstel / Unit - Handmatig Koord, , Touwdoorvoerblok plafond				2005	Kwaliteit van de koorden wordt minder, lichte slijtage op diverse draai- en zwaai punten. De kwaliteit is verminderd door de luchtvochtigheid en door temperatuurverschillen in de zaal. EN12655:1998, EN913:2018, EN-ISO12100-1:2010. Actie: koorden op aangegeven termijn vervangen	

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.421.073; 00.421.074; 00.421.075						
	3	Koord				2005		2022
	4	Ringstel / Unit Elektrisch Band, , Rechthoek				2019		
		00.579.512; 00.579.513; 00.579.514; 00.579.515						

Wandtoestellen

Wandtoestellen bewegingsonderwijs

	2	Klimraam - Elektrisch verstelbaar Houten stijlen, 4 vaks				2005		
		00.005.135; 00.005.205						
	2	Valbeveiliging				2016		
		Defect/gerepareerd onderdeel						
	1	Opberghaak				2005	Twee nieuwe opbergriempjes gemonteerd	
	8	Lat met hechtstrook 100 cm				2005	Hechtkoppelstroken beschadigd en gesleten. Actie: deze op aangegeven termijn vervangen	2022

Vloerinstallatie

	1	Rekstokinstallatie Zuil conisch Drie zuilen, 260 cm				2005		
	3	Zuil				2005		
		00.005.173; 00.005.174; 00.005.175;						
	1	Rekstokinstallatie Zuil conisch Drie zuilen, 260 cm				2005		
	3	Zuil				2005		
		00.005.170; 00.005.171; 00.005.172;						

Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar

	1	Bok Primair onderwijs				2005		
		00.005.212						
	1	Bok Primair onderwijs				2005		
		00.005.169						
	2	Combiframe Piramidaal				2005	Twee rubber buffers opnieuw gemonteerd	
		00.005.214; 00.005.215						
	2	Combiframe Piramidaal				2005		
		00.005.150; 00.005.151						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		Defect/gerepareerd onderdeel						
	1	Klemrubber				2005	Één ontbrekende rubber buffer aangebracht	
	1	Honkpaal PU voet				2005		
		00.005.192						
	5	Honkpaal PU voet 155 cm				2005		
		00.005.182; 00.005.183; 00.005.184; 00.005.185; 00.005.186						
	1	Honkpaal PU voet 155 cm				2005		
		00.005.188						
	2	Minitrampoline Gesloten				2020		
		00.658.294; 00.658.295						
	1	Minitrampoline Gesloten				2019		
		00.593.933						
	1	Springdek gecombineerd met padding				2019		
		Defect/gerepareerd onderdeel						
	5	Vastzetriem met gesp				2019	Vijf ontbrekende vastzetriempje aangebracht	
	2	Springkast Standaard , Piramidaal - recht				2005	Houtwerk rondom licht beschadigd. De acht wielen vd verrolinrichtingen zijn gesleten. Actie: deze op aangegeven termijn vervangen	
		00.005.210; 00.005.211						
		Defect/gerepareerd onderdeel						
	✓ 8	Wiel				2005	Lagers vd wielen gesleten. Actie: deze op aangegeven termijn vervangen (2022)	
	2	Springkast Standaard , Piramidaal - recht				2005	Houtwerk rondom licht beschadigd. Vier zwenkwielen vervangen. Vier zwenkwielen op aangegeven termijn vervangen.	
		00.005.144; 00.005.145						
		Defect/gerepareerd onderdeel						
	✓ 4	Wiel				2005	Lagers vd wielen gesleten . Actie: deze op aangegeven termijn vervangen (2022)	
	4	Wiel				2005	Vier versleten wielen vervangen.	
	1	Springplank - Bekleed 100 x 55 cm (Mini)				2020		
		00.658.293						
	2	Springplank - Bekleed 120 x 60 cm (Junior)				2020		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.659.291; 00.659.292						
	2	Stick-/stokkenbak Rond				2005		
		00.005.178; 00.005.179						
	4	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 300 cm				2005	Door gebruiksslijtage is het houtwerk en onderframe licht beschadigd, conform EN913:2018. Op dit moment is er geen vervolgactie noodzakelijk.	
		00.579.502; 00.579.503; 00.579.504; 00.579.505						
		Defect/gerepareerd onderdeel						
	1	Vloerbescherming				2005	Één nieuwe vloerbescherming aangebracht	
	4	Stapeldop				2005	Vier nieuwe stapeldoppen aangebracht	
	4	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 300 cm				2005	Door gebruiksslijtage is het houtwerk en onderframe licht beschadigd, conform EN913:2018. Op dit moment is er geen vervolgactie noodzakelijk.	
		00.005.206; 00.005.207; 00.005.208; 00.005.209						
	4	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 300 cm				2005		
		00.005.140; 00.005.141; 00.005.142; 00.005.143						
Bewegingsonderwijs accessoires								
	4	Rekstok installatie accessoire Rekstok bewegingsonderwijs , Zelf verlengend				2005		
		00.421.076; 00.421.077; 00.421.078; 00.421.079						
Matten								
	4	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2019		
		00.579.508; 00.579.509; 00.579.510; 00.579.511						
	2	Mat Lange mat Bisonyl, 6 m				2017		
		00.522.005; 00.522.006						
	2	Mat Lange mat Canvas, 10 m				2005		
		00.658.289; 00.658.290						
	2	Mat Lange mat Canvas, 6 m				2005	Lichte slijtage en vervuiling vd bekleding	
		00.579.506; 00.579.507						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
1		Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2016	Bisonyl bekleding op diverse plaatsen beschadigd. Geen directe actie nodig.	
		00.421.091; 00.421.095						
8		Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2016		
		00.488.075; 00.488.076; 00.488.077; 00.488.078; 00.488.079; 00.488.080; 00.658.296; 00.658.297						
6		Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2016		
		00.421.090; 00.421.092; 00.421.093; 00.421.094; 00.421.096; 00.421.097						
4		Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2005		
		00.005.222; 00.005.225; 00.522.002; 00.522.003						
4		Hoes				2017		
1		Mat Turn mat Canvas, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2005	Mat heeft waterschade gehad. Actie: mat op aangegeven termijn vervangen	2022
		00.005.167						
Zaalsporten								
Basketbal								
4		Basketbal installatie - Vast				2005		
		00.005.138; 00.005.139; 00.005.203; 00.005.204						
4		Bord Hout				2005		
4		Ring				2005		
2		Basketbal installatie - Verticaal ophijsbaar > 225 cm, < 325 cm, Rechthoek tussenframe				2005		
		00.005.134; 00.005.199						
2		Bord Acryl				2005		
2		Ring				2005		
2		Valbeveiliging				2015		
4		Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar 100 cm, Rechthoek tussenframe				2005	Zie defecte onderdelen	
		00.005.136; 00.005.137; 00.005.201; 00.005.202						
4		Ring				2005		
4		Bord Polyester				2005		


Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Defect/gerepareerd onderdeel								
	1	Gasveer	■			2021	Twee slechte gasveren vervangen	
✓	1	Hoogte verstelling			■	2005	Van twee bedieningsstokken zijn de haken afgebroken . Actie: aanschaf van twee nieuwe bedieningsstokken	
Volleybal								
	4	Volleybal profiel - Open doos profiel , Opbouw	■			2005		
		00.005.190; 00.005.191; 00.005.192; 00.005.193						
	2	Volleybalpaal Aluminium	■			2005		
		00.005.176; 00.005.177						
	3	Volleybalverspanning				2005		
	2	Volleybalpaal Aluminium	■			2005		
		00.005.242; 00.005.243						
	3	Volleybalverspanning				2005		
Handbal / voetbal / hockey								
✓	2	Handbaldoel 100 cm diep			■	2014	Het doel kan niet aan de vloer worden verankerd/ de vloerverankering ontbreekt, EN749:2004 3.2. Er moet een vloerverankering worden aangebracht.	
		00.459.991; 00.459.992						
	2	Handbaldoel 100 cm diep			■	2014	Zie defecte onderdelen.	
		00.459.991; 00.459.992						
Defect/gerepareerd onderdeel								
✓	1	Bevestiging vastzetinr. standaard			■	2014	Het doel kan niet aan de vloer worden verankerd/ de vloerverankering ontbreekt, EN749:2004 3.2. Er moet een vloerverankering worden aangebracht.	
Korfbal								
	2	Spring-korfbalpaal Telescopisch Kunststof mand training, Ø 50 cm (schotelvoet)	■			2005		
		00.005.180; 00.005.181; 00.005.237; 00.005.238						
	4	Mand Kunststof				2005		
Turtoestellen en turnspringplanken								
	2	Herenbrug Junior		■		2005	Vloerbeschermers beschadigd. Actie: deze op aangegeven termijn vervangen (2022)	
		00.005.172; 00.005.235						
	1	Springplank Wedstrijd	■			2019		
		00.593.932						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Opbergen								
	1	Opberg- /transportwagen Landingsmatten , T - vorm				2005	Zes nieuwe inslagdoppen aangebracht	
		00 005 152; 00.005.231						
	2	Opberg- /transportwagen Lange mat				2005		
		00.005.230; 00.005.233						
	1	Opberg- /transportwagen Lange mat				2016		
		00.005.153						
✓	1	Opberg- /transportwagen Turnmatten , Verticale opberging				2005	Één beugel afgebroken, hierdoor scherpe delen . Actie: de beugel opnieuw laten lassen of mattenwagen vervangen.	
		00.005.234						
	1	Opberg- /transportwagen Turnmatten , Verticale opberging				2005		
		00.005.154						
Sportvloer								
	20	Vloervoorziening Grondpot kort Klein				2005		
	6	Vloervoorziening Grondpot rekstokzuil Metaal gecoat, , Conisch				2005	Gronpotten gesmeerd	
	8	Vloervoorziening Grondpot volleybal/badminton/tennis paal Metaal, gecoat, Ø 100 mm, Ronde flens				2005		
	3	Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling				2005	Slijtage vd veerplaatjes/scharnierpunten. Actie: deze op aangegeven termijn vervangen	2022
	3	Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling				2017		

T-Spec algemeen -




Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar - Hoogte verstelling - 00.005.136; 00.005.137; 00.005.201; 00.005.202

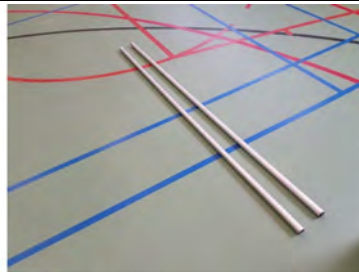

Handbaldoel 100 cm diep - 00.459.991; 00.459.992



Opberg- /transportwagen Turnmatten - 00.005.234

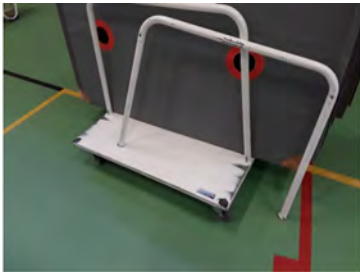

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 5

Datum inspectie	11-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Sportzaal de Schulp	Opdracht via	-
Adres	Zandbos 165, 2134 DD Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Basketbalinstallatie Uitval	2		2		
Klimrek Handbediend 4V	2		2		
Ringen Klimtouw	2		2		
Volleybal Paal aluminium	2		2		
Ringen Ringenstok	1		1		
Trampoline Mini	2	1	1		
Badminton Badmintonnet	3	3			
Badminton Paal aluminium	2	2			
Basketbalinstallatie Oefen	4	4			
Combiframe Laag-kort Met leder dek	2	2			2
Combiframe Piramidaal 2-delig	1	1			1
Combiframe Piramidaal 2-delig met suède dek	1	1			1
Doelen Latten op de muur Houten latten in de muur	2	2			
Evenwichtsbalk Combi	4	4			
Honkpaal 150 cm. Badminton onderst. Paal	4	4			
Kleutermateriaal Combi brugligger	1	1			
Kleutermateriaal Combi oplegbankblad	3	3			
Kleutermateriaal Duikelstang	1	1			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	1	1			
Korfbal Springstandaard	2	2			
Ladder Combi	3	3			
Ladder Touwladder	1	1			
Landingsmat 300x200x30	1	1			
Lange mat 5 meter	2	2			
Ringen Kettingzak	3	3			
Ringen Koord	6	6			
Ringen Trapezestok	4	4			
Ringen Turnring	8	8			
Ringen Unitsysteem handbediend	4	4			
Sportvloer Polyurethaan	1	1			1
Springkast Hout	1	1			1

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 5

Datum inspectie	11-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Sportzaal de Schulp	Opdracht via	-
Adres	Zandbos 165, 2134 DD Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Springkast Multifunctioneel	1	1			
Springplank Training	1	1			
Stokkenbak Verrolbaar	1	1			
Tafeltennistafel 340 InPro Indoor 743	1	1			
Transportwagen Landingsmat enkel	1	1			
Transportwagen Materiaal	1	1			
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			
Transportwagen Turnmat horizontaal Voor matten 200	1	1			
Turnbank 360 cm.	6	6			5
Turnbok M.O. model	1	1			1
Turnmat 150x100	6	6			
Turnmat Canvas 200x100	7	7			
Volleybal Muurstrip	3	3			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	2	2			
Totalen:	122	112	10	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 5

Datum inspectie 11-08-2021
Betreft Sportzaal de Schulp
Adres Zandbos 165, 2134 DD Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen	Aantal	Stukprijs	Totaal
Combiframe Laag-kort Met leder dek: (0002763)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Combiframe Laag-kort Met leder dek: (0002764)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Combiframe Piramidaal 2-delig: (0002762)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Combiframe Piramidaal 2-delig met suède dek: (0002761)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Sportvloer Polyurethaan: (0002872)			
- Reparatiewerk: 5 vloerringen vervangen order 16409	3,8	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Hout: (0002859)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001039)			
- Wiel 75 x 18	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001040)			
- Turnbank rubber voet	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001042)			
- Wiel 75 x 18	2,0	€ 0,00	€ 0,00
- Turnbank rubber voet	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001043)			
- Turnbank rubber voet	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok M.O. model: (0001053)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.			€ 0,00

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 5

Datum inspectie	11-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Sportzaal de Schulp	Opdracht via	-
Adres	Zandbos 165, 2134 DD Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Basketbalinstallatie Uitval: (0001030) 2021 <u>Constatering:</u> Opmerking: Bord hangt scheef. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. <u>Constatering:</u> Metaalwerk. Verbogen. Opmerking: Dwars balk boven. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - Reparatie / vervanging op aanvraag			☐
Basketbalinstallatie Uitval: (0001036) 2021 <u>Constatering:</u> Metaalwerk. Verbogen. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - Reparatie / vervanging op aanvraag			☐
Klimrek Handbediend 4V: (0001028) 2046 <u>Constatering:</u> Wiel. Versleten. Opmerking: 75x25 <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 5x Wiel 75 x 25 (WL75X25) € 97,50 ☐ - 1x Montagekosten (MONTAGE) € 48,75 ☐			
Klimrek Handbediend 4V: (0001029) 2043 <u>Constatering:</u> Wiel. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 5x Wiel 75 x 25 (WL75X25) € 97,50 ☐ - 1x Montagekosten (MONTAGE) € 48,75 ☐			
Ringen Klimtouw: (0001037) 2031 <u>Constatering:</u> Opmerking: Nieuwe touwen geleverd, oude touwen afvoeren. Prioriteit: Laag. - 1x Oud materiaal afvoer (AFVOER) € 12,50 ☐			
Ringen Ringenstok: (0002770) 2021 <u>Constatering:</u> Metaalwerk. Verbogen. Opmerking: Verouderde en zware ringenstok. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Laag. <u>Constatering:</u> Beugel. Gescheurd. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 1x Ringenstok opbergbeugels (6640100) € 102,75 ☐ - 1x Ringenstok unitsysteem (7600040) € 122,50 ☐ - 1x Montagekosten (MONTAGE) € 32,50 ☐			
Trampoline Mini: (0001050) 2022 <u>Constatering:</u> Opmerking: Zeilogen uitgescheurd. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Laag. - 1x Reparatiewerk: zeilogen monteren (REPARATIE) in regie ☐			

Onderhoudsrapport

Pagina 5 van 5

Datum inspectie	11-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Sportzaal de Schulp	Opdracht via	-
Adres	Zandbos 165, 2134 DD Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Volleybal Paal aluminium: (0002768) <u>Constatering:</u> Dop(pen). Beschadigd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 2x Dop volleybalzuil type NH (8000077)	2029		€ 12,80 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 4

Datum inspectie 12-08-2021
Betreft Gymzaal Sparresholm
Adres Sparresholm 175, 2133 BM Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Korfbal Springstandaard	4	3		1	
Turnmat 150x100	10	9	1		
Trampoline Mini	1		1		
Basketbalinstallatie Gasveer 100 cm.	2	2			
Evenwichtsbalk 5 meter	1	1			
Honkpaal 150 cm.	10	10			
Klimrek Handbediend 4V	2	2			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	2	2			
Klimwand Boulderwand	6	6			
Landingsmat 300x200x30	2	2			
Lange mat 5 meter	2	2			
Rekstokinstallatie	1	1			
Rekstokinstallatie Rekstok met gaffels	4	4			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Kettingzak	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Touwen	6	6			
Ringen Trapezestok	2	2			
Ringen Turning	12	12			
Sportvloer Polyurethaan	1	1			
Springkast Hout Groen/Rood-Wit	2	2			
Springplank Training	2	2			
Transportwagen Lange mat wiegmodel	1	1			
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			
Turnbank 360 cm.	5	5			2
Turnbok L.O. model	1	1			
Turnbrug Maat 1	1	1			
Turnbrug Maat 2	1	1			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	4	4			
Volleybal Paal aluminium	2	2			
Volleybal Tuipaal	2	2			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 4

Datum inspectie	12-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Sparresholm	Opdracht via	-
Adres	Sparresholm 175, 2133 BM Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Totalen:	112	109	2	1
-----------------	------------	------------	----------	----------

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 4

Datum inspectie	12-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Sparresholm	Opdracht via	-
Adres	Sparresholm 175, 2133 BM Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen	Aantal	Stukprijs	Totaal
Turnbank 360 cm.: (0001930)			
- Turnbank rubber voet	4,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001931)			
- Turnbank rubber voet	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.			€ 0,00

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 4

Datum inspectie	12-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Sparresholm	Opdracht via	-
Adres	Sparresholm 175, 2133 BM Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Korfbal Springstandaard: (0001918) <u>Constatering:</u> Metaalwerk. Verroest. Opmerking: Afgekeurde paal staat nog in de zaal. <u>Prioriteit:</u> Gemiddeld.	2003	X	
- 1x Korfbalpaal afvoer (AFVOER11)			€ 12,50 ☐
Trampoline Mini: (0001923) <u>Constatering:</u> Dek. Gescheurd. <u>Advies:</u> Repareren. <u>Prioriteit:</u> Laag.	2024		
- 1x Minitramp afdekrand 112 (4800055)			€ 177,95 ☐
Turnmat 150x100: (0001929) <u>Constatering:</u> Hoes. Gescheurd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. <u>Prioriteit:</u> Hoog.	2023		
- 1x Turnmathoes 150x100 (7210010)			€ 172,00 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 5

Datum inspectie 10-08-2021
Betreft Sporthal Het Spectrum
Adres Assumburg 1, 2135 BA Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Turnmat 150x100	19	18	1		
Ringen Unitsysteem elektrisch	6	5	1		
Scheidsrechterstoel Vrijstaand	4		4		
Basketbaltoren Verrolbaar B01024	2		2		
Badminton Badmintonnet	15	15			
Badminton Ondersteuningspaal	20	20			
Badminton Paal verrolbaar	14	14			
Ballenwagen Omlapbeugel	2	2			
Basketbalinstallatie Gasveer	2	2			
Basketbalinstallatie Uitval	4	4			
Doelen Handbal	4	4			
Hockeybalk Hout	1	1			
Klimwand Boulderwand	1	1			
Korfbal Mand	4	4			
Korfbal Springstandaard	6	6			
Landingsmat 300x200x30	6	6			
Lange mat 10 meter	3	3			
Ringen Klimnet	1	1			
Ringen Klimtouw	4	4			
Ringen Ophangframe	2	2			
Ringen Trapezestok	2	2			
Ringen Turning	8	8			
Scorebord Staal	4	4			
Sportvloer Polyurethaan	1	1			
Springkast Multifunctioneel	3	3			2
Springplank Budapest	4	4			
Springplank Training	3	3			
Stokkenbak Verrolbaar	1	1			
Tafeltennistafel Cornilleau 440 indoor	1	1			
Tafeltennistafel Cornilleau 540 ITTF	4	4			
Trampoline Mini	8	8			
Transportwagen Hockeybalk	1	1			
Transportwagen Landingsmat dubbel	3	3			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 5

Datum inspectie	10-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Sporthal Het Spectrum	Opdracht via	-
Adres	Assumburg 1, 2135 BA Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Transportwagen Lange mat wiegmodel	3	3			1
Transportwagen Palen en netten	1	1			
Transportwagen Turnmat horizontaal	3	3			
Tschoukbalframe 100x100 cm.	4	4			
Turnbank 360 cm.	14	14			
Turnbok M.O. model	2	2			2
Turnbrug Maat 1	1	1			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	4	4			
Volleybal Paal aluminium	8	8			8
Totalen:	203	195	8	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 5

Datum inspectie 10-08-2021
Betreft Sporthal Het Spectrum
Adres Assumburg 1, 2135 BA Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen		Aantal	Stukprijs	Totaal
Overig:				
- Smeren van bruggen en torens		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Multifunctioneel: (0000043)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Multifunctioneel: (0000044)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Transportwagen Lange mat wiegmodel: (0004199)				
- Wiel 50 x 18 Rhombus		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok M.O. model: (0000052)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok M.O. model: (0000053)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Volleybal Paal aluminium: (0000081)				
- Reparatiewerk: hefboom vastgezet, 1x m10x35 + moer en ringen		0,1	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.				€ 0,00

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 5

Datum inspectie	10-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Sporthal Het Spectrum	Opdracht via	-
Adres	Assumburg 1, 2135 BA Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Basketbaltoren Verrolbaar B01024: (0022501) Vervangjaar: 2030 <u>Constatering:</u> Bescherming. Gescheurd. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Gemiddeld. <u>Constatering:</u> Opmerking: bedieningstang ontbreekt <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Laag. - 2x Reparatiewerk: bedieningstang monteren en beschermers repareren met antislip doek (REPARATIE)	2030		in regie ☐
Basketbaltoren Verrolbaar B01024: (0022502) Vervangjaar: 2030 <u>Constatering:</u> Bescherming. Gescheurd. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Reparatiewerk: bescherming repareren met antislip (REPARATIE)	2030		in regie ☐
Ringen Unitsysteem elektrisch: (0000102) Vervangjaar: 2039 <u>Constatering:</u> Werkt niet. Opmerking: Motorunit 1 staat in storting. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Reparatiewerk: motorunit 1 nakijken met lift (REPARATIE)	2039		in regie ☐
Scheidsrechterstoel Vrijstaand: (0000039) Vervangjaar: 2024 <u>Constatering:</u> Hijssysteem. Werkt niet. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 1x Gasveer (7001)	2024		€ 85,00 ☐
			€ 48,75 ☐
Scheidsrechterstoel Vrijstaand: (0000040) Vervangjaar: 2024 <u>Constatering:</u> Hijssysteem. Werkt niet. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 1x Gasveer (7001)	2024		€ 85,00 ☐
			€ 48,75 ☐
Scheidsrechterstoel Vrijstaand: (0000041) Vervangjaar: 2024 <u>Constatering:</u> Hijssysteem. Werkt niet. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 1x Gasveer (7001)	2024		€ 85,00 ☐
			€ 48,75 ☐
Scheidsrechterstoel Vrijstaand: (0000042) Vervangjaar: 2024 <u>Constatering:</u> Hijssysteem. Werkt niet. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 1x Gasveer (7001)	2024		€ 85,00 ☐
			€ 48,75 ☐
Turnmat 150x100: (0000019) Vervangjaar: 2028 <u>Constatering:</u> Hoes. Gescheurd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 1x Turnmathoes canvas 150x100 (7210012)	2028		€ 178,00 ☐

Onderhoudsrapport

Pagina 5 van 5

Datum inspectie	10-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Sporthal Het Spectrum	Opdracht via	-
Adres	Assumburg 1, 2135 BA Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 6

Datum inspectie		Debiteurnummer	680002
Betreft	Sporthal de Sporthoeve	Opdracht via	Dhr. R. Wurtz
Adres	Snelliuslaan 1, 1171 CZ Badhoevedorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving	Jaarlijkse inspectie uitvoeren + tribunes
Opmerkingen	Pawel Siekiera 2-6-2020: Graag controleren hoe/of worden toestellen door het systeem behandeld als ze worden verwijderd met vorige inspectie?

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Tafeltennistafel 340 InPro	1			1	
Turnmat 150x100	12	10	2		
Badminton Paal aluminium	10	9	1		
Volleybal Paal aluminium	8	5	3		
Springkast Multifunctioneel	4		4		
Basketbaltoren Verrolbaar	2		2		
Klimrek Handbediend 4V	2		2		
Basketbalinstallatie Gasveer 100 cm.	2	1	1		
Evenwichtsbalk Baffner	1		1		
Lange mat 5 meter	4	3	1		
Rekstokinstallatie Insteekpaal	1		1		
Rekstokinstallatie Rekstok met gaffels	1		1		
Sportvloer Polyurethaan	1		1		
Trampoline Mini openeind	1		1		
Tribune Vast Elektrisch	1		1		
Afschermnet Berging	7	7			
Badminton Badmintonnet	8	8			
Basketbalinstallatie Uitval	2	2			
Doelen Handbal	2	2			
Doelen Hockey	5	5			
Hockeybalk Kunststof	22	22			
Honkpaal 150 cm.	15	15			
Kleutermateriaal Divers Multirek buitentoestel	1	1			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	2	2			
Klimwand Boulderwand	1	1			
Korfbal Paal aluminium	4	4			
Korfbal Springstandaard	7	7			
Landingsmat 300x200x30	7	7			
Scheidsrechterstoel Vrijstaand	4	4			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 6

Datum inspectie		Debiteurnummer	680002
Betreft	Sporthal de Sporthoeve	Opdracht via	Dhr. R. Wurtz
Adres	Snelliuslaan 1, 1171 CZ Badhoevedorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Scorebord Staal	2	2			
Spiegel Verrolbaar	1	1			
Springplank Schoolmodel	1	1			
Springplank Training	5	5			
Trampoline Mini	1	1			1
Transportwagen Hockeybalk	2	2			
Transportwagen Lange mat wiegmodel	2	2			
Transportwagen Turnmat horizontaal	2	2			
Tschoukbalframe 100x100 cm.	2	2			
Turnbank 360 cm.	12	12			1
Turnbok L.O. model	4	4			4
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	4	4			
Totalen:	189	166	22	1	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 6

Datum inspectie		Debiteurnummer	680002
Betreft	Sporthal de Sporthoeve	Opdracht via	Dhr. R. Wurtz
Adres	Snelliuslaan 1, 1171 CZ Badhoevedorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen	Aantal	Stukprijs	Totaal
Sportvloer Polyurethaan: (0002099)			
- Reparatiwerk: Vloervoorzieningen schoongemaakt.	1,0	€ 65,00	€ 65,00
Springkast Multifunctioneel: (0002018)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Wielen schoonmaken	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Multifunctioneel: (0002016)			
- Wielen schoonmaken	1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Multifunctioneel: (0002015)			
- Wielen schoonmaken	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Multifunctioneel: (0002017)			
- Wielen schoonmaken	1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Trampoline Mini: (0002041)			
- Minitramp afdekrand elastiek	1,0	€ 25,75	€ 25,75
Turnbank 360 cm.: (0002053)			
- Turnbank rubber voet	11,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0002024)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0002025)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0002026)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0002027)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.			€ 90,75

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 6

Datum inspectie		Debiteurnummer	680002
Betreft	Sporthal de Sporthoeve	Opdracht via	Dhr. R. Wurtz
Adres	Snelliuslaan 1, 1171 CZ Badhoevedorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Tafeltennistafel 340 InPro: (0002050) <u>Constatering:</u> Delen. Verouderd. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Laag. - 1x Tafeltennistafel 340 InPro (CO340IN) € 455,00 ☐ - 1x Oude tafeltennistafel afvoer (AFVOER) € 47,50 ☐	2016	X	
Badminton Paal aluminium: (0001990) <u>Constatering:</u> Dop(pen). Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Dop volleybalzuil Jeka (8000020) € 10,45 ☐	2033		
Basketbalinstallatie Gasveer 100 cm.: (0001985) <u>Constatering:</u> Ring. Gescheurd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. <u>Constatering:</u> Bord. Verbogen. Opmerking: Bord is licht verbogen <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 1x Basketbalring vast (400006) € 60,00 ☐ - 1x Basketbalbord 120x90 cm. (400010) € 168,50 ☐ - 1x Montagekosten (MONTAGE) € 165,00 ☐	2028		
Basketbaltoren Verrolbaar: (0001994) <u>Constatering:</u> Hoogteverstelling. Ontbreekt. Opmerking: Grendelpen diam.16mm <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Hoog. - 1x Reparatiewerk: Grendelpen diam. 16 mm monteren. (REPARATIE) in regie ☐	2030		
Basketbaltoren Verrolbaar: (0001995) <u>Constatering:</u> Bescherming. Gescheurd. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Reparatiewerk: Beschermer opnieuw bekleden. (REPARATIE) in regie ☐	2030		
Evenwichtsbalk Baffner: (0002049) <u>Constatering:</u> Bekleding. Gescheurd. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - 1x Evenwichtsbalk opnieuw bekleden (1600016) € 385,50 ☐	2033		
Klimrek Handbediend 4V: (0001982) <u>Constatering:</u> Versleten. Opmerking: Vloerautomaat verzakt. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Klimrek vloerautomaat verenstaal (4000549) € 39,50 ☐ - 1x Reparatiewerk: Vloerautomaat opnieuw vastzetten en stellen. (REPARATIE) in regie ☐	2040		
Klimrek Handbediend 4V: (0001983) <u>Constatering:</u> Versleten. Opmerking: Verenstaal. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Klimrek vloerautomaat verenstaal (4000549) € 39,50 ☐	2040		

Onderhoudsrapport

Pagina 5 van 6

Datum inspectie		Debiteurnummer	680002
Betreft	Sporthal de Sporthoeve	Opdracht via	Dhr. R. Wurtz
Adres	Snelliuslaan 1, 1171 CZ Badhoevedorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Lange mat 5 meter: (0002029) 2022 <u>Constatering:</u> Bekleding. Gescheurd. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Reparatiewerk: Stukje canvas plakken. (REPARATIE) in regie ☐ - Alternatief: 1x Lange mat 5 meter (44001001) € 947,00 ☐ - Alternatief: 1x Lange mat afvoer (AFVOER2) € 75,00 ☐			
Rekstokinstallatie Insteekpaal: (0001987) 2030 <u>Constatering:</u> Dop(pen). Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Reparatiewerk: Bovendop type rogyt monteren. (REPARATIE) in regie ☐			
Rekstokinstallatie Rekstok met gaffels: (0001987) 2030 <u>Constatering:</u> Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 2x Rekstokgaffel opnieuw bekleden (6400250) € 170,00 ☐			
Sportvloer Polyurethaan: (0002099) 2030 <u>Constatering:</u> Gescheurd. Opmerking: Er zitten oude vloerautomaten en 2 scheuren in de vloer. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Reparatiewerk: Vloer beschadigingen repareren. (REPARATIE) in regie ☐ - 1x Reparatiewerk: Oude vloervoorzieningen verwijderen. (REPARATIE) in regie ☐			
Springkast Multifunctioneel: (0002018) 2036 <u>Constatering:</u> Dop(pen). Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Gemiddeld. - 6x Springkast afdekstop J&F (3133120) € 90,00 ☐			
Springkast Multifunctioneel: (0002016) 2036 <u>Constatering:</u> Dop(pen). Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Gemiddeld. - 3x Springkast afdekstop J&F (3133120) € 45,00 ☐			
Springkast Multifunctioneel: (0002015) 2034 <u>Constatering:</u> Dop(pen). Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Gemiddeld. <u>Constatering:</u> Voet. Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Hoog. <u>Constatering:</u> Dek. Versleten. Opmerking: Dek begint grof en dun te worden <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Laag. - 1x Springkastdek opnieuw bekleden (6800120) € 365,50 ☐ - 4x Springkast afdekstop J&F (3133120) € 60,00 ☐ - 1x Reparatiewerk: 1 voet type jf monteren. (REPARATIE) in regie ☐			

Onderhoudsrapport

Pagina 6 van 6

Datum inspectie		Debiteurnummer	680002
Betreft	Sporthal de Sporthoeve	Opdracht via	Dhr. R. Wurtz
Adres	Snelliuslaan 1, 1171 CZ Badhoevedorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Springkast Multifunctioneel: (0002017) <u>Constatering:</u> Dop(pen). Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Gemiddeld. - 5x Springkast afdekop J&F (3133120)	2034		€ 75,00 ☐
Trampoline Mini openeind: (0002044) <u>Constatering:</u> Dek. Gescheurd. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Minitramp afdekrand lusjes stikken (4800057)	2022		€ 89,00 ☐
Tribune Vast Elektrisch: <u>Constatering:</u> Verouderd. Opmerking: Tribunes zijn in slechte staat. Delen ontbreken en beschadigd. Houtwerk ook beschadigd. Aandrijving is verouderd / glijdt. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - Reparatie / vervanging op aanvraag	2020		☐
Turnmat 150x100: (0002008) <u>Constatering:</u> Hoes. Gescheurd. <u>Constatering:</u> Vulling/demping. Versleten. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 1x Turnmat 150x100 (7210000) - 1x Turnmat afvoer (AFVOER1)	2030		€ 223,50 ☐ € 14,00 ☐
Volleybal Paal aluminium: (0001968) <u>Constatering:</u> Dop(pen). Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Gemiddeld. <u>Constatering:</u> Band. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 3x Dop volleybalzuil Jeka (8000020) - 2x Volleybal spanband (8000017) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2033		€ 31,35 ☐ € 71,00 ☐ € 32,50 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 4

Datum inspectie	30-07-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal de Veste	Opdracht via	-
Adres	Schuilenburg 3, 2135 GJ Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Ringen Turnring	10	8	2		
Evenwichtsbalk Combi	3	1	2		
Klimrek Handbediend 4V	2		2		
Korfbal Springstandaard	2		2		
Turnbank 360 cm.	6	4	2		
Basketbalinstallatie Gasveer	2	2			
Combiframe incl. dek	3	3			
Honkpaal 150 cm.	6	6			
Kleutermateriaal Combi brugligger	1	1			1
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	2	2			
Ladder Combi	2	2			
Landingsmat 300x200x30	1	1			
Lange mat 5 meter	2	2			
Ringen Kettingzak	1	1			
Ringen Koord	6	6			
Ringen Ophangframe	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Trapezestok	4	4			4
Ringen Unitsysteem handbediend	6	6			
Sportvloer Polyurethaan	1	1			
Springplank Budapest	1	1			
Springplank Schoolmodel	1	1			
Springplank Training	1	1			
Trampoline Mini	1	1			1
Transportwagen Lange mat wiegmodel	1	1			
Turnbok M.O. model	1	1			
Volleybal Muurstrip	4	4			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	5	5			
Totalen:	91	81	10	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 4

Datum inspectie	30-07-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal de Veste	Opdracht via	-
Adres	Schuilenburg 3, 2135 GJ Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen	Aantal	Stukprijs	Totaal
Combiframe incl. dek: (0003204)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Combiframe incl. dek: (0003205)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Kleutermateriaal Combi brugligger: (0003210)			
- Flensmoer m6	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Klimrek Handbediend 4V: (0003031)			
- Bolknoop M8	1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Tapeind m6	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Ring en Trapezestok: (0003032)			
- Dop, inslag voor buis/koker	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Trampoline Mini: (0003201)			
- Minitramp elastisch riempje afdekrand	3,0	€ 2,90	€ 8,70
Turnbok M.O. model: (0003047)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.			€ 8,70

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 4

Datum inspectie	30-07-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal de Veste	Opdracht via	-
Adres	Schuilenburg 3, 2135 GJ Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Evenwichtsbalk Combi: (0003209) 2019 <u>Constatering:</u> Houtwerk. Verouderd. Opmerking: Gescheurd en uitgedroogd. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 1x Evenwichtsbalk combi (10000015) € 309,00 ☐ - 1x Evenwichtsbalk afvoer (AFVOER10) € 25,00 ☐			
Evenwichtsbalk Combi: (0003208) 2019 <u>Constatering:</u> Houtwerk. Splintert. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 1x Evenwichtsbalk combi (10000015) € 309,00 ☐ - 1x Evenwichtsbalk afvoer (AFVOER10) € 25,00 ☐			
Klimrek Handbediend 4V: (0003031) 2019 <u>Constatering:</u> Vloervoorziening. Werkt niet. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - 1x Reparatiewerk: vloerautomaat repareren (REPARATIE) in regie ☐			
Klimrek Handbediend 4V: (0003030) 2019 <u>Constatering:</u> Opmerking: Slinger ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Lierslinger (4401011) € 38,50 ☐			
Korfbal Springstandaard: (0003040) 2021 <u>Constatering:</u> Lijnhouder. Ontbreekt. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Laag. <u>Constatering:</u> Metaalwerk. Vastgelopen. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 1x Korfbalspringstandaard (4001000) € 379,00 ☐ - 1x Korfbalpaal afvoer (AFVOER11) € 12,50 ☐			
Korfbal Springstandaard: (0003042) 2021 <u>Constatering:</u> Lijnhouder. Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Laag. <u>Constatering:</u> Metaalwerk. Vastgelopen. Opmerking: Opzetpaal vast <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 1x Korfbalspringstandaard (4001000) € 379,00 ☐ - 1x Korfbalpaal afvoer (AFVOER11) € 12,50 ☐			
Ringen Turning: (0003032) 2022 <u>Constatering:</u> Ring. Beschadigd. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Laag. - 2x Turning compleet (7600010) € 170,00 ☐			

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 4

Datum inspectie	30-07-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal de Veste	Opdracht via	-
Adres	Schuilenburg 3, 2135 GJ Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Turnbank 360 cm.: (0003215) <u>Constatering:</u> Blad. Beschadigd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag.	2018		
- 1x Turnbank blad 360x25x2 (7200028)			€ 160,00 ☐
- 1x Montagekosten (MONTAGE)			€ 32,50 ☐
Turnbank 360 cm.: (0003217) <u>Constatering:</u> Blad. Beschadigd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld.	2019		
- 1x Turnbank blad 360x25x2 (7200028)			€ 160,00 ☐
- 1x Montagekosten (MONTAGE)			€ 32,50 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 5

Datum inspectie	30-07-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Sportzaal de Veste	Opdracht via	-
Adres	Schuilenburg 3, 2135 GJ Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Kleutermateriaal Combi oplegbankblad	1			1	
Badminton Paal aluminium	2		2		
Korfbal Springstandaard	3	1	2		
Landingsmat 300x200x30	4	2	2		
Volleybal Paal aluminium	2		2		
Klimrek Handbediend 4V	2	1	1		1
Springkast Hout	2	1	1		1
Springplank Schoolmodel	1		1		
Transportwagen Landingsmat enkel	1		1		
Turnbank 360 cm.	6	5	1		4
Basketbalinstallatie Oefen	4	4			
Basketbalinstallatie Uitval	2	2			
Combiframe Laag-lang	4	4			2
Combiframe Laag-lang Dekplank	1	1			
Doelen Latten op de muur	2	2			
Evenwichtsbalk Combi	1	1			
Honkpaal 150 cm.	7	7			
Kleutermateriaal Zwiepplank	1	1			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	1	1			
Ladder Combi	2	2			
Ladder Touwladder	3	3			
Lange mat 10 meter	1	1			
Ringen Kettingzak	2	2			
Ringen Koord	6	6			
Ringen Ophangframe	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Trapezestok	2	2			
Ringen Unitsysteem handbediend	6	6			
Sportvloer Polyurethaan	1	1			
Springplank Training	2	2			
Stokkenbak Verrolbaar	2	2			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 5

Datum inspectie	30-07-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Sportzaal de Veste	Opdracht via	-
Adres	Schuilenburg 3, 2135 GJ Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Trampoline Mini	1	1			
Transportwagen Materiaal	1	1			
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			
Transportwagen Turnmat verticaal	1	1			
Turnbok L.O. model	1	1			1
Turnbrug Heren	1	1			
Turnmat 150x100	6	6			
Turnmat 200x100	11	11			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	11	11			
Totalen:	124	110	13	1	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 5

Datum inspectie 30-07-2021
Betreft Sportzaal de Veste
Adres Schuilenburg 3, 2135 GJ Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen	Aantal	Stukprijs	Totaal
Combiframe Laag-lang: (0003254)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Combiframe Laag-lang: (0003256)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Klimrek Handbediend 4V: (0003227)			
- Bolknop M8	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Klimrek Handbediend 4V: (0003226)			
- Bolknop M8	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Hout: (0003244)			
- Wielen schoonmaken	1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Hout: (0003245)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Wielen schoonmaken	1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Springkast veer hoekklos	1,0	€ 10,50	€ 10,50
Turnbank 360 cm.: (0003260)			
- Turnbank rubber voet	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0003261)			
- Turnbank rubber voet	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0003262)			
- Turnbank rubber voet	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0003264)			
- Turnbank rubber voet	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0003265)			
- Turnbank rubber voet	3,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0003250)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.			€ 10,50

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 5

Datum inspectie	30-07-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Sportzaal de Veste	Opdracht via	-
Adres	Schuilenburg 3, 2135 GJ Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Kleutermateriaal Combi oplegbankblad: (0003258) <u>Constatering:</u> Houtwerk. Beschadigd. Opmerking: Splintert en is verdroogd. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 1x Kleutermateriaal afvoer (AFVOER12)	2019	X	€ 12,50 ☐
Badminton Paal aluminium: (0003236) <u>Constatering:</u> Dop(pen). Beschadigd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 4x Dop volleybalzuil type NH (8000077)	2023		€ 25,60 ☐
Klimrek Handbediend 4V: (0003226) <u>Constatering:</u> Vloervoorziening. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Klimrek vloerautomaat 160x80 (4000554) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2023		€ 86,00 ☐ € 97,50 ☐
Korfbal Springstandaard: (0003242) <u>Constatering:</u> Lijnhouder. Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. Prioriteit: Laag. - 1x Lijnhouder springpaal NH (4001114)	2019		€ 25,00 ☐
Korfbal Springstandaard: (0003241) <u>Constatering:</u> Lijnhouder. Ontbreekt. <u>Advies:</u> Compleet maken. - 1x Lijnhouder springpaal (4001112)	2029		€ 47,50 ☐
Landingsmat 300x200x30: (0003266) <u>Constatering:</u> Hoes. Versleten. Opmerking: Gaat kapot op de randen. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 1x Landingsmathoes 300x200x30 (4400014)	2024		€ 680,00 ☐
Landingsmat 300x200x30: (0003268) <u>Constatering:</u> Band. Beschadigd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 1x Landingsmat opbergriem (4400020)	2026		€ 49,50 ☐
Springkast Hout: (0003244) <u>Constatering:</u> Delen. Beschadigd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Reparatiewerk: kopdeel vervangen (REPARATIE)	2030		in regie ☐
Springplank Schoolmodel: (0003249) <u>Constatering:</u> Versleten. Opmerking: Vering onvoldoende. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Springplank Gymnova school (6800000) - 1x Springplank afvoer (AFVOER5)	2022		€ 480,58 ☐ € 25,00 ☐

Onderhoudsrapport

Pagina 5 van 5

Datum inspectie	30-07-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Sportzaal de Veste	Opdracht via	-
Adres	Schuilenburg 3, 2135 GJ Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Transportwagen Landingsmat enkel: (0003269) <u>Constatering:</u> Band. Beschadigd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 1x Landingsmatwagen vastzetriem (4400021)	2049		€ 51,50 ☐
Turnbank 360 cm.: (0003262) <u>Constatering:</u> Blad. Beschadigd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Turnbank blad 360x25x2 (7200028) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2023		€ 160,00 ☐ € 32,50 ☐
Volleybal Paal aluminium: (0003236) <u>Constatering:</u> Dop(pen). Beschadigd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 4x Dop volleybalzuil type NH (8000077)	2029		€ 25,60 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 6

Datum inspectie	09-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Voortouw	Opdracht via	-
Adres	Adelaarstraat 15b, 1171 TM Badhoevedorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Turnbank 300 cm.	6	1	5		
Klimrek Handbediend 3V	3		3		
Korfbal Springpaal	2		2		
Ringen Kettingzak	2		2		
Evenwichtsbalk 5 meter	2	1	1		
Sportvloer Polyurethaan	1		1		
Turnbank 360 cm.	1		1		
Turnpaard	1		1		
Basketbalinstallatie Gasveer	2	2			
Evenwichtsbalk Verbreder 3 meter	1	1			
Honkpaal 150 cm.	6	6			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	1	1			
Korfbal Springstandaard	2	2			
Landingsmat 300x200x30	3	3			
Lange mat 5 meter	4	4			
Rekstokinstallatie Insteekpaal	1	1			
Rekstokinstallatie Rekstok met gaffels	4	4			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Ringenstok	1	1			
Ringen Touwen	1	1			
Ringen Turnring	12	12			
Springkast Hout	2	2			2
Springplank Budapest	1	1			
Springplank Schoolmodel	1	1			
Springplank Training	4	4			
Trampoline Mini	1	1			
Transportwagen Lange mat wiegmodel	2	2			
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			
Turnbok L.O. model	1	1			1
Turnbrug Dames vrijstaand	1	1			
Turnbrug Maat 1	1	1			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 6

Datum inspectie	09-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Voortouw	Opdracht via	-
Adres	Adelaarstraat 15b, 1171 TM Badhoevedorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Turnmat Canvas 150x100	6	6			
Volleybal Tuipaal	2	2			
Totalen:	98	82	16	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 6

Datum inspectie	09-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Voortouw	Opdracht via	-
Adres	Adelaarstraat 15b, 1171 TM Badhoevedorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen	Aantal	Stukprijs	Totaal
Springkast Hout: (0002241)			
- Wielen schoonmaken	1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Hout: (0002242)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 300 cm.: (0002247)			
- Turnbank rubber voet	2,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0002234)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.			€ 0,00

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 6

Datum inspectie	09-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Voortouw	Opdracht via	-
Adres	Adelaarstraat 15b, 1171 TM Badhoevedorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Evenwichtsbalk 5 meter: (0002233) 2030 <u>Constatering:</u> Voet. Beschadigd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. <u>Constatering:</u> Knop(pen). Gescheurd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 3x Gymnova vloerbeschermers GR (4800250) € 100,08 ☐ - 1x Knop, wit Gymnova (4006009) € 29,40 ☐ - 1x Montagekosten (MONTAGE) € 48,75 ☐			
Klimrek Handbediend 3V: (0002260) 2036 <u>Constatering:</u> Vloervoorziening. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 2x Klimrek vloerautomaat (4000554) € 172,00 ☐ - 1x Montagekosten (MONTAGE) € 130,00 ☐			
Klimrek Handbediend 3V: (0002259) 2036 <u>Constatering:</u> Vloervoorziening. Versleten. Opmerking: 163x50 <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 2x Klimrek vloerautomaat (4000554) € 172,00 ☐ - 1x Montagekosten (MONTAGE) € 130,00 ☐			
Klimrek Handbediend 3V: (0002258) 2036 <u>Constatering:</u> Vloervoorziening. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 2x Klimrek vloerautomaat (4000554) € 172,00 ☐ - 1x Montagekosten (MONTAGE) € 130,00 ☐			
Korfbal Springpaal: (0002217) 2021 <u>Constatering:</u> Verouderd. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Laag. - 1x Springpaal (4001003) € 265,00 ☐ - 1x Korfbalpaal afvoer (AFVOER11) € 12,50 ☐			
Korfbal Springpaal: (0002218) 2021 <u>Constatering:</u> Paal. Verouderd. <u>Advies:</u> Geheel vervangen. Prioriteit: Laag. - 1x Springpaal (4001003) € 265,00 ☐ - 1x Korfbalpaal afvoer (AFVOER11) € 12,50 ☐			
Ringen Kettingzak: (0002257) 2021 <u>Constatering:</u> Bak. Verouderd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 2x Kettingzak (6640015) € 310,00 ☐ - 1x Montagekosten (MONTAGE) € 130,00 ☐			

Onderhoudsrapport

Pagina 5 van 6

Datum inspectie	09-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Voortouw	Opdracht via	-
Adres	Adelaarstraat 15b, 1171 TM Badhoevedorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Sportvloer Polyurethaan: (0002267) 2032 <u>Constatering:</u> Opmerking: De vloer is glad. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Reparatiewerk: vloer diep reinigen (REPARATIE)			in regie ☐
Turnbank 300 cm.: (0002247) 2022 <u>Constatering:</u> Blad. Losgeraakt. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - 6x Bankblad vastzetten met extra kolombouten en moeren (REP0005) - Alternatief: 6x Turnbank 300 cm. (7200018)			€ 177,00 ☐ € 3240,00 ☐
Turnbank 300 cm.: (0002250) 2022 <u>Constatering:</u> Blad. Losgeraakt. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - Reparatie / vervanging op aanvraag			☐
Turnbank 300 cm.: (0002249) 2022 <u>Constatering:</u> Blad. Losgeraakt. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - Reparatie / vervanging op aanvraag			☐
Turnbank 300 cm.: (002252) 2022 <u>Constatering:</u> Blad. Losgeraakt. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - Reparatie / vervanging op aanvraag			☐
Turnbank 300 cm.: (0002251) 2022 <u>Constatering:</u> Blad. Losgeraakt. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - Reparatie / vervanging op aanvraag			☐
Turnbank 360 cm.: (0002248) 2022 <u>Constatering:</u> Blad. Losgeraakt. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - Reparatie / vervanging op aanvraag			☐
Turnpaard: (0002219) 2022 <u>Constatering:</u> Bekleding. Gescheurd. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Laag. - 1x Reparatiewerk: koppaneel opnieuw bekleden (REPARATIE)			in regie ☐

Onderhoudsrapport

Pagina 6 van 6

Datum inspectie	09-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Voortouw	Opdracht via	-
Adres	Adelaarstraat 15b, 1171 TM Badhoevedorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever	Sportfondsen Haarlemmermeer BV	Ordernummer	25136
Klantnummer	C103895	Contractnummer	11340
Contracttype	Inspectie & onderhoud toestellen bewegingsonderwijs en	Datum uitvoering	02/06/2021
Locatie	Waddenweg 83 2134XL HOOFFDORP		
Hal	11340	Bredeschool het Braambos	
Toestellen set	11340	Bredeschool het Braambos [11340]	
Zaaltype	Gymzaal (1 veld)		
Bouwjaar	2000		
Zaalhoogte (m)	5.65		

Algemene opmerking:

Rapport besproken met dhr. Hans Dusseljee

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.


Door de samenstelling van roest kunnen bacteriën zich eenvoudig aan roestige oppervlaktes binden. Wanneer iemand zich verwondt aan een roestig voorwerp kan dit gezondheidsklachten opleveren. Door roest kunnen bijvoorbeeld scherpe vlakken ontstaan, waaraan gebruikers zich kunnen verwonden. Dit zorgt voor een direct gezondheidsrisico, wat er weer voor zorgt dat het toestel wordt afgekeurd. Wanneer het risico op verwonding weg wordt genomen, kan het toestel weer worden goedgekeurd.

Inspectie uitgevoerd door:

Edwin Geels

Rapport besproken met:

Dhr. Hans Dusseljee



Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Zaal algemeen								
<i>Overzicht foto's zaal en berging zijn afgedrukt onder T-Spec inspectie algemeen -</i>								
	1	T-Spec algemeen				2021	Toestellen voorzien van een T-Spec identificatienummer zijn geïnspecteerd, voor een veilig gebruik, conform de T-Spec inspectiemethodiek. De afgekeurde toestellen zijn gemarkeerd met een afkeursticker en zo mogelijk buiten werking gesteld.	
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	2	Klim- en touwladder installatie Recht 6 touwen, Gevlochten, lederen sok				2000	Zie defecte onderdelen	
		00.005.444; 00.005.445						
	2	Klimtouw geslagen hennep				2000		2022
Defect/gerepareerd onderdeel								
✓	2	Knopentouw (geknoopt in touw)				2000	De klimtouwen zijn versleten en te lang (slepen over de grond) Actie: touwen vervangen.	
	7	Ringstel / Unit Handmatig Koord, , Touwdoorvoerblok plafond				2000		
		00.005.442; 00.005.443; 00.005.446; 00.051.984; 00.051.985; 00.051.986; 00.051.987						
Plafondtoestel accessoires bewegingsonderwijs								
	3	Plafond unit accessoire Trapezestok				2000		
		00.519.99300.519.994; 00.519.995						
Wandtoestellen								
<i>Wandtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	1	Klimraam - Elektrisch verstelbaar Metalen stijlen, 4 vaks				2000	Zie defecte onderdelen	
		00.005.441						
Defect/gerepareerd onderdeel								
✓	1	Afdekkap voor stijl				2000	Één afdekkapje van stijl weg. Actie: nieuwe aanschaffen	
Vloerinstallatie								
	1	Rekstokinstallatie Muurzuil				2000		
		00.051.990						
	1	Rekstokinstallatie Zuil met klemsluiting Twee zuilen				2000		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	2	Zuil 00.051.988; 00.051.989;				2000		
Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar								
	1	Bok Primair onderwijs 00.005.488	■			2000		
	2	Combiframe Laag / lang 00.005.474; 00.005.475	■			2000		
	2	Dekplank (onbekleed)				2000		
	2	Combiframe Piramidaal 00.005.476; 00.005.477	■			2000		
✓	1	Minitrampoline Gesloten 00.005.473			■	2000	Door gebruik gebruiksslijtage zijn het frame, beschermpadding, stalen veren en springdek gesleten. De stabiliteit van het toestel is afgenomen doordat de onderliggende delen speling hebben gekregen. In combinatie met de lichte roestvorming op het frame moet het toestel vervangen worden.	
📷	2	Springkast Standaard , Piramidaal - recht 00.005.471; 00.005.472		■		2000	Door gebruiksslijtage is het houtwerk licht beschadigd, hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak van het toestel gesleten. Hierdoor is de stabiliteit/functionaliteit van het toestel afgenomen, conform EN913:2018. Het toestel dient op het aangegeven vervangingsjaar te worden vervangen.	2023
	2	Springplank Bekleed 120 x 60 cm (Junior) 00.005.486; 00.005.487	■			2000		
	1	Stick-/stokkenbak Rond 00.005.510	■			2000		
	1	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm 00.522.014	■			2017		
	6	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm 00.002.452; 00.005.447; 00.005.448; 00.005.449; 00.005.450; 00.005.451	■			2000		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Bewegingsonderwijs accessoires								
	2	Rekstok installatie accessoire Rekstok bewegingsonderwijs 230 cm, Zelf verlengend				2000		
		00.051.991; 00.051.992						
Matten								
	2	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2000	Zie defecte onderdelen	
		00.005.457; 00.005.458						
		Defect/gerepareerd onderdeel						
	✓ 2	Hoes				2000	De hoes moet worden vervangen omdat de hoes en/of rits in slechte staat verkeren.	
	2	Mat Lange mat Canvas, 6 m				2000		
		00.005.481; 00.005.482						
	10	Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2000	De hoes, rits en/of grepen verkeren in slechte staat en de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende verdeeld over het oppervlak. De gehele mat moet worden verwijderd of vervangen. Zijn reeds nieuwe matten aanwezig	
		00.005.461; 00.005.462; 00.005.463; 00.005.464; 00.005.465; 00.005.466; 00.005.467; 00.005.468; 00.005.469; 00.005.470						
	10	Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2020		
		00.658.386; 00.658.387; 00.658.388; 00.658.389; 00.658.390; 00.658.391; 00.658.392; 00.658.393; 00.658.394; 00.658.395						
Zaalsporten								
Basketbal								
	2	Basketbal installatie - Vast				2000		
		00.005.455; 00.005.456						
	2	Ring				2000		
	2	Bord Hout				2000		
	2	Basketbal installatie - Verticaal ophijsbaar 100 cm, Rechthoek tussenframe				2000		
		00.005.453; 00.005.454						
	2	Bord Hout				2000		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	2	Ring				2000		
Volleybal								
	2	Volleybalpaal Aluminium Ø 89 mm				2000		
		00.005.507; 00.005.508						
	1	Volleybalverspanning				2000		
Korfbal								
	2	Spring-korfbalpaal Telescopisch Rieten mand,				2000	De twee maatstrippen (voor hoogte lijnhouder) beschadigd en stuk. Tevens hebben de schotelvoeten geen vloerbeschermers Actie: maatstrippen vervangen en vloerbeschermers aanschaffen.	
		00.005.478; 00.005.479						
Turntoestellen en turnspringplanken								
	1	Herenbrug Senior				2000	Draaiende delen en kolommen gesmeerd.	
		00.005.489						
	1	Springplank Wedstrijd				2000		
		00.005.483						
Klimwand, boulderwand en auto belay systemen								
	1	Klimwand-/Boulderwand - Boulderwand				2000		
	77	Klimgrepen				2000		
Opbergen								
✓	1	Opberg- /transportwagen Landingsmatten + springplanken + trampolines , T - vorm				2000	Dubbele opbergband versleten. Actie: vervangen	
		00.005.459						
	1	Opberg- /transportwagen Lange mat				2000		
		00.005.480						
	1	Opberg- /transportwagen Turnmatten Bodemplaat: 150 x 100 cm, Horizontale opberging				2000		
		00.005.460						
Sportvloer								
	6	Vloervoorziening - Tuimelhaak , Gesloten				2000		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	4	Vloervoorziening Grondpot kort Klein	☒			2000	Bussen gangbaar gemaakt en gesmeerd	
	2	Vloervoorziening Grondpot rekstokzuil Metaal gecoat,	☒			2000	Mechanisme klemvastzetting gesmeerd	
	2	Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling	☒			2000		

T-Spec algemeen -



Klim- en touwladder installatie Recht - Knopentouw (geknoopt in touw) - 00.005.444; 00.005.445



Klimraam - Elektrisch verstelbaar - 00.005.441




Klimraam - Elektrisch verstelbaar - Afdekkap voor stijl - 00.005.441




Minitrampoline Gesloten - 00.005.473



Mat Landingsmat - Hoes - 00.005.457; 00.005.458

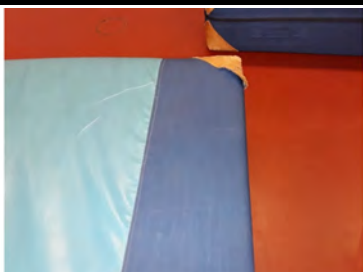

Mat Turn mat - 00.005.461; 00.005.462; 00.005.463; 00.005.464; 00.005.465; 00.005.466; 00.005.467; 00.005.468; 00.005.469; 00.005.470

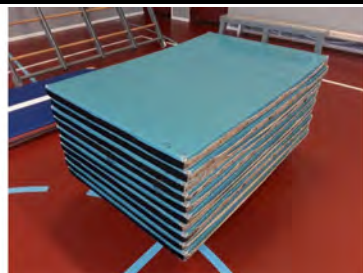

Spring-korfbalpaal Telescopisch - 00.005.478; 00.005.479



Opberg- /transportwagen Landingsmatten + springplanken + trampolines - 00.005.459



Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 4

Datum inspectie 09-08-2021
Betreft Gymzaal Wormerstraat
Adres Wormerstraat 23, 2131 AX Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Ringen Ringenstok	1		1		
Sportvloer Polyurethaan	1		1		
Turnbrug Maat 1	1		1		
Turnbrug Maat 2	1		1		
Ballenwagen Met schuifdeur	1	1			
Basketbalinstallatie Gasveer 100 cm.	2	2			
Honkpaal 150 cm.	7	7			
Klimrek Elektrisch 4V	2	2			1
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	2	2			
Klimwand Boulderwand	6	6			6
Korfbal Springstandaard	2	2			
Landingsmat 300x200x30	2	2			
Lange mat 10 meter	1	1			
Rekstokinstallatie Insteekpaal + muurzuil	1	1			
Rekstokinstallatie Rekstok met gaffels	1	1			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Kettingzak	2	2			
Ringen Touwen	6	6			
Ringen Trapezestok	2	2			
Ringen Turning	12	12			
Springkast Hout	2	2			2
Springplank Budapest	1	1			
Springplank Training	2	2			
Stokkenbak Verrolbaar	1	1			
Trampoline Mini	1	1			
Transportwagen Lange mat wiegmodel	1	1			
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			
Turnbank 360 cm.	6	6			2
Turnbok L.O. model	1	1			1
Turnbok M.O. model	1	1			1
Turnmat Canvas 150x100	10	10			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 4

Datum inspectie	09-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Wormerstraat	Opdracht via	-
Adres	Wormerstraat 23, 2131 AX Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Volleybal Muurstrip	3	3			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	5	5			
Volleybal Paal aluminium Stalen paal.	2	2			
Volleybal Tuipaal	1	1			
Totalen:	110	106	4	0	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 4

Datum inspectie 09-08-2021
Betreft Gymzaal Wormerstraat
Adres Wormerstraat 23, 2131 AX Hoofddorp

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen	Aantal	Stukprijs	Totaal
Klimrek Elektrisch 4V: (0001941)			
- Klimrek grendelsysteem reparatie	1,0	€ 26,50	€ 26,50
Klimwand Boulderwand: (0001980)			
- Reparatiewerk: klimgrepen aangedraaid	0,1	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Hout: (0001957)			
- Bolknop M12	1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Hout: (0001956)			
- Bolknop M12	1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbank 360 cm.: (0001967)			
- Turnbank rubber voet	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (0001958)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok M.O. model: (0001959)			
- Leren dek invetten	1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.			€ 26,50

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 4

Datum inspectie	09-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Wormerstraat	Opdracht via	-
Adres	Wormerstraat 23, 2131 AX Hoofddorp	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Ringen Ringenstok: (0001953) <u>Constatering:</u> Beugel. Gebroken. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 1x Ringenstok opbergbeugels (6640100) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2044		€ 102,75 ☐ € 32,50 ☐
Sportvloer Polyurethaan: (0001966) <u>Constatering:</u> Opmerking: Oude overbodige vloerautomaten in de vloer. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Laag. - 1x Reparatiewerk: 15 vloerautomaten verwijderen en vloer herstellen (REPARATIE)	2029		in regie ☐
Turnbrug Maat 1: (0001963) <u>Constatering:</u> Bekleding. Beschadigd. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Laag. - 1x Brug loopplank opnieuw bekleden (600017)	2027		€ 195,00 ☐
Turnbrug Maat 2: (0001965) <u>Constatering:</u> Bekleding. Beschadigd. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Laag. - 1x Brug loopplank opnieuw bekleden (600017)	2027		€ 195,00 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.

Onderhoudsrapport

Pagina 1 van 5

Datum inspectie 27-08-2021
Betreft Gymzaal Zijdewinde
Adres Zijdewinde 40, 2141 VB Vijfhuizen

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Opdracht omschrijving Jaarlijkse inspectie uitvoeren

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Sportvloer Hout	1			1	
Ringen Turnring	12	10	2		
Ringen Touwen	6		6		
Klimrek Handbediend 4V	2		2		
Turnbrug Maat 1	2		2		
Basketbalinstallatie Gasveer	2	1	1		
Landingsmat 300x200x30	2	1	1		
Rekstokinstallatie Flexaturn	1		1		
Springkast Multifunctioneel	1		1		
Combiframe Piramidaal	1	1			
Combiframe Trapezoide	1	1			
Evenwichtsbalk	1	1			
Evenwichtsbalk Laag model	1	1			
Evenwichtsbalk Verbreder 3 meter	1	1			
Honkpaal 150 cm.	6	6			6
Kleutermateriaal Glijbaan	1	1			
Klimtouwinstallatie 12 touwen	1	1			
Klimtouwinstallatie Klimtouw	12	12			
Klimtouwinstallatie Omlooptouw	1	1			
Klimwand Boulderwand	6	6			
Korfbal Springstandaard	2	2			
Lange mat 5 meter	4	4			
Ringen Conventioneel	6	6			
Ringen Kettingzak	2	2			
Ringen Ringenstok	1	1			
Springkast Hout	1	1			
Springkast Kleuter	1	1			
Springplank Budapest	1	1			
Springplank Kleuter	1	1			
Springplank Training	1	1			
Stokkenbak Verrolbaar	1	1			
Trampoline Mini	1	1			
Transportwagen Lange mat wiegmodel	1	1			

Onderhoudsrapport

Pagina 2 van 5

Datum inspectie	27-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Zijdewinde	Opdracht via	-
Adres	Zijdewinde 40, 2141 VB Vijfhuizen	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Omschrijving	Aantal	Goed	Actie nodig	Afgekeurd	Gerepareerd
Transportwagen Materiaal Flexaturn mat	1	1			
Transportwagen Turnmat horizontaal	1	1			
Turnbank 200 cm.	1	1			
Turnbank 360 cm.	6	6			
Turnbok L.O. model	1	1			
Turnbrug Dames vrijstaand	1	1			
Turnmat 150x100	6	6			
Turnmat Canvas 200x100	6	6			
Volleybal Net standaard 9,5 mtr.	2	2			
Volleybal Paal aluminium	1	1			
Totalen:	110	93	16	1	

Onderhoudsrapport

Pagina 3 van 5

Datum inspectie 27-08-2021
Betreft Gymzaal Zijdewinde
Adres Zijdewinde 40, 2141 VB Vijfhuizen

Debiteurnummer 680002
Opdracht via -
Opdrachtgever S.F. Haarlemmermeer B.V.

Uitgevoerde reparaties / verbruikte materialen		Aantal	Stukprijs	Totaal
Honkpaal 150 cm.: (19.JEKA 0004335)				
- Dop, omdop voor buis/koker		1,0	€ 2,75	€ 2,75
Springkast Hout: (19.JEKA 0004306)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Wielen schoonmaken		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Kleuter: (19.JEKA 0004308)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Wielen schoonmaken		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Springkast Multifunctioneel: (19.JEKA 0004307)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
- Wielen schoonmaken		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Turnbok L.O. model: (19.JEKA 0004315)				
- Leren dek invetten		1,0	€ 0,00	€ 0,00
Totaal bedrag, exclusief BTW.				€ 2,75

Onderhoudsrapport

Pagina 4 van 5

Datum inspectie	27-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Zijdewinde	Opdracht via	-
Adres	Zijdewinde 40, 2141 VB Vijfhuizen	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Sportvloer Hout: <u>Constatering:</u> Opmerking: Vloer staat minimaal 30 cm bol. Er zit water onder of lucht onder. Dit levert struikelgevaar op. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - Reparatie / vervanging op aanvraag	0	X	☐
Basketbalinstallatie Gasveer: (19.JEKA 0004297) <u>Constatering:</u> Hoogteverstelling. Werkt niet. Opmerking: Gasveren <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. - 2x Gasveer (7001) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2024		€ 170,00 ☐ € 65,00 ☐
Klimrek Handbediend 4V: (19.JEKA 0004296) <u>Constatering:</u> Sporten. Verouderd. Opmerking: Sporten beginnen te slijten <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 1x Klimrek houtwerk (4000510) - Alternatief: 1x Klimrek multifunctioneel 4 vaks excl. afvoer- en montagekosten (4000506)	2034		€ 1645,00 ☐ € 3250,00 ☐
Klimrek Handbediend 4V: (19.JEKA 0004295) <u>Constatering:</u> Hijssysteem. Verouderd. Opmerking: Slinger draait ongecontroleerd rond / slaat op hol. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. <u>Constatering:</u> Hijssysteem. Beschadigd. Opmerking: Hendel gebroken. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Hoog. <u>Constatering:</u> Sporten. Versleten. Opmerking: Sporten beginnen te slijten <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 1x Lierslinger (4401011) - 1x Reparatiewerk: bediening repareren of vervangen (REPARATIE) - 1x Klimrek houtwerk (4000510) - Alternatief: 1x Klimrek multifunctioneel 4 vaks excl. afvoer- en montagekosten (4000506)	2034		€ 38,50 ☐ in regie ☐ € 1645,00 ☐ € 3250,00 ☐
Landingsmat 300x200x30: (19.JEKA 0004310) <u>Constatering:</u> Hoes. Versleten. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 1x Landingsmathoes 300x200x30 (4400014)	2024		€ 680,00 ☐
Rekstokinstallatie Flexaturn: (19.JEKA 0004340) <u>Constatering:</u> Opmerking: Vloerdekels zitten vast. Komt doordat de vloer vloer bol staat. Hierdoor kon de installatie niet getest worden. <u>Advies:</u> Repareren. Prioriteit: Hoog. - 1x Reparatiewerk: dekels losmaken na vloerreparatie (REPARATIE)	2022		in regie ☐
Ringten Touwen: (19.JEKA 0004299) <u>Constatering:</u> Touw. Verouderd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 6x Ringstellen touwwerk (6640040) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2021		€ 1003,50 ☐ € 260,00 ☐

Onderhoudsrapport

Pagina 5 van 5

Datum inspectie	27-08-2021	Debiteurnummer	680002
Betreft	Gymzaal Zijdewinde	Opdracht via	-
Adres	Zijdewinde 40, 2141 VB Vijfhuizen	Opdrachtgever	S.F. Haarlemmermeer B.V.

Nog uit te voeren reparaties	Vervangjaar	Afgekeurd	Uitvoeren
Ringens Turnring: (19.JEKA 0004299) <u>Constatering:</u> Ring. Beschadigd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 2x Ringensstel turnring (6640025)	2021		€ 120,00 ☐
Springkast Multifunctioneel: (19.JEKA 0004307) <u>Constatering:</u> Houtwerk. Beschadigd. Opmerking: Hapje uit trespas bij opening verrollinrichting. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Gemiddeld. - 1x Reparatiwerk: trespas deel vervangen (REPARATIE)	2030		in regie ☐
Turnbrug Maat 1: (19.JEKA 0004322) <u>Constatering:</u> Ligger. Beschadigd. Opmerking: Deuken in het hout. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 2x Brugligger lengte 280 cm. (600011) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2025		€ 410,00 ☐ € 48,75 ☐
Turnbrug Maat 1: (19.JEKA 0004323) <u>Constatering:</u> HoutwerkLigger. Beschadigd. <u>Advies:</u> Onderdeel vervangen. Prioriteit: Laag. - 2x Brugligger lengte 280 cm. (600011) - 1x Montagekosten (MONTAGE)	2022		€ 410,00 ☐ € 48,75 ☐

Indien u reparaties wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u dit aan te geven in de kolom 'Uitvoeren'.
Wij zien uw ingevulde kopie graag tegemoet.

De in dit rapport vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
Montage- en afvoerkosten zullen indien van toepassing apart worden berekend.
