
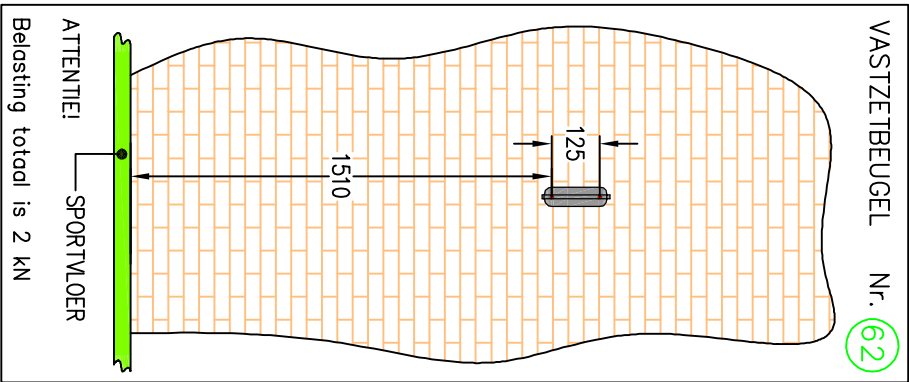
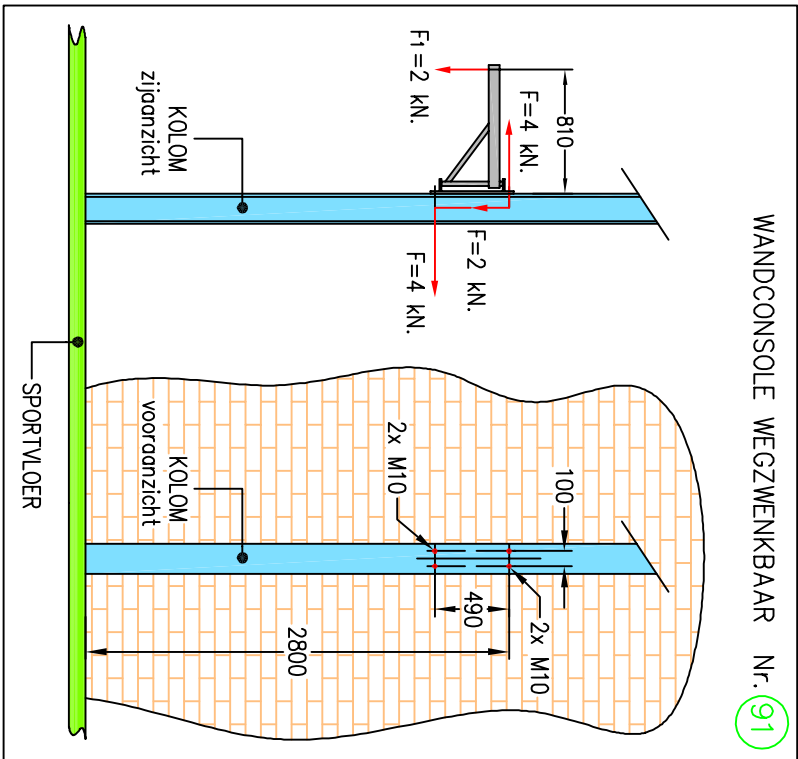


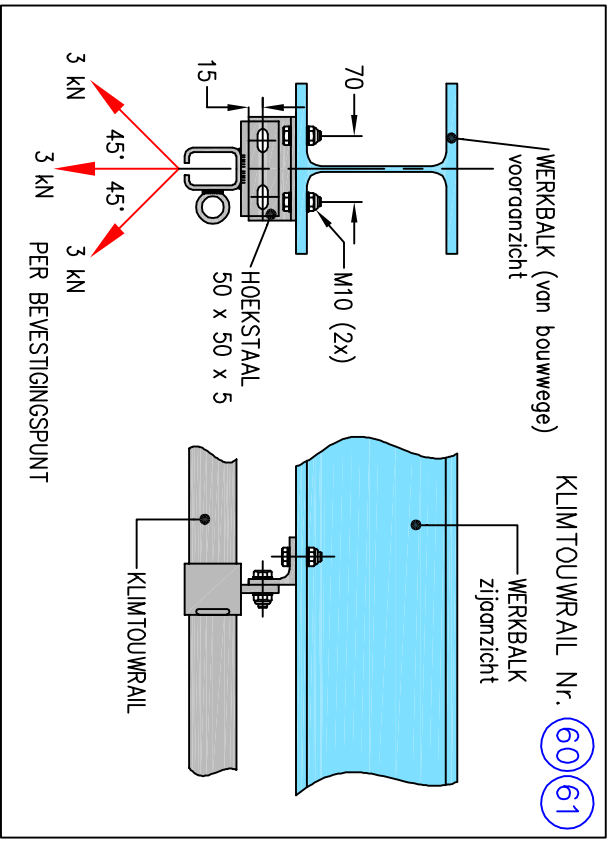

### BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN:

- Voor het uitvoeren van de werkzaamheden door Bosan dient de werkvloer bezemschoon en obstakelvrij te zijn.
- Alle sparingen dienen een correcte maatvoering te hebben en schoon te zijn.
- Levering, storting en afwerking van het beton t.b.v. sparingen is voor rekening van de aannemer.
- De bouwkundige constructie van het gebouw dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bijgevoegde detailtekeningen.
- Alle opgegeven krachten zijn rekenkrachten waarin een veiligheidsfactor van 3 is aangehouden volgens NEN-EN 913 (dynamische factor 2,5 x veiligheidsfactor 1,2)
- Tenzij anders overeengekomen, dienen de sportinstallaties van Bosan rechtstreeks gemonteerd te kunnen worden aan vloer, wand en werkbalen. Waarbij de definitie wand, de wand is welke zichtbaar is op zaalniveau. In geval van voorzetwand zal de constructie uitgevuld dienen te worden tot direct achter de toplaar (max. 18mm)
- Indien er tijdens montage geen mogelijkheid is om een contramoer te plaatsen in de staalconstructie, zal de wanddikte ter plaatse van de bevestiging minimaal 10mm dienen te zijn (evt. plaatselijk opgelast)
- Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er afwijkingen zijn t.o.v. de hierboven vermelde aandachtspunten, zijn wij gerechtigd de extra hieruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

### WERKPLANING BOSAN :


Afspraken m.b.t. het tijdstip van montage dienen uiterlijk 15 werkdagen van tevoren te worden gemaakt en voor akkoord schriftelijk door Bosan te worden bevestigd.

### Tijdstip eerste montage door Bosan:

Voor het aanbrengen van de sportvloer en het plafond moeten de grondbussen gesteld en aangesloten worden in de volgens door onze tekening aangegeven sparingen. Hulpstaal moet aan de werkbalen en in de wanden aangebracht worden verder dienen alle montagewerkzaamheden t.b.v. de sportinstallaties te zijn uitgevoerd.

### Tijdstip afmontage door Bosan:

Na het aanbrengen van de sportvloer vindt afmontage van de sportinstallaties plaats (o.a. dekseis uitzetren, netten passend maken, klimrek monteren etc.)

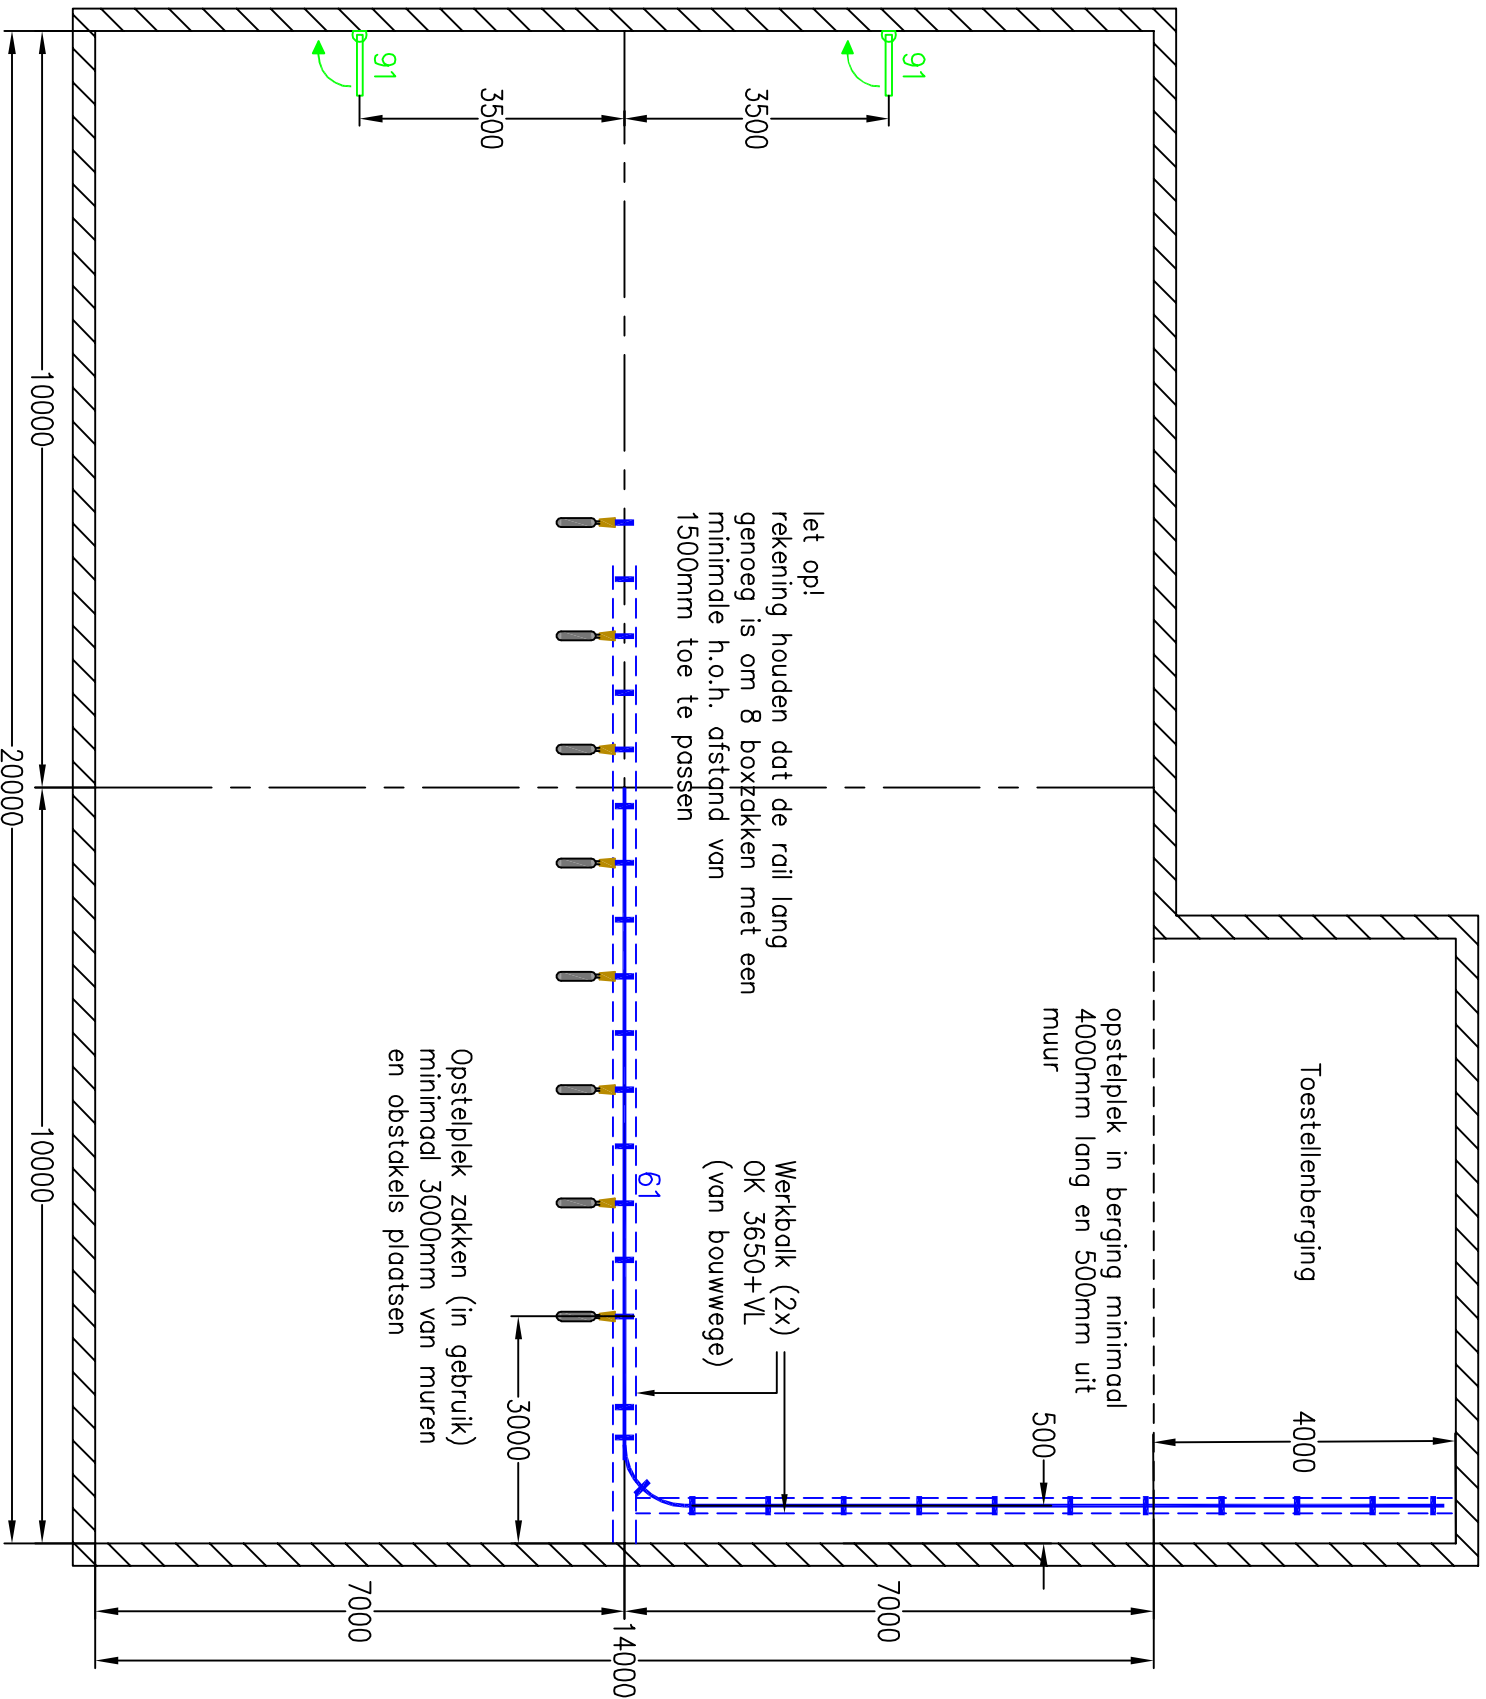

| Aanduiding | Aantal | Omschrijving                                          |
|------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 61         | 1      | KLIMTOUWINSTALLATIE MET BOCHTRAIL (t.b.v. bokszakken) |
| 62         | 1      | VASTZETBEUGEL T.B.V. KLIMTOUW                         |
| 91         | 2      | WANDCONSOLE WEGZWENKBAAR                              |

|        |            |                 |
|--------|------------|-----------------|
| 02     | 07-07-2021 | Nieuwe tekening |
| Versie | Datum      | Wijziging       |

| PLANINDELING & SPARINGSPLAN |                    | Status : Voorlopig        |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| Zaachtype                   | Dojo, begane grond | Offertentnr. : OFP21-xxxx |
|                             |                    | Datum : 30-06-2021        |

### Elst

Sportthal Helster, Dojo

-

| BOSAN S P O R T I N S T A L L A T I E S |  | Bouwkundige tekening : d.d. xx-xx-xxxx |                          |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------|--------------------------|
|                                         |  | xxx                                    |                          |
|                                         |  | Metrodical 21                          | Tel.: (+031) 053-5723115 |
|                                         |  | 7483 PD Hockbeigen                     | E-mail: info@bosan.nl    |
|                                         |  | Nedelfond                              | Internet: www.bosan.nl   |
|                                         |  |                                        | Posterformaat: A2        |
