2

Herinrichting Groote Vink *(kruispunt Haagweg - Leidseweg, Ontsluiting Intratuin-locatie en aanleg Velostrada)*

Start DO na vaststellen SOK in B en W Leiden én Voorschoten

Id	Taaknaam	Begindatum	Duur	Einddatum
1	**Initiatieffase**	**woe 9-9-20**	**64,6 wkn**	**maa 6-12-21**
29				
30	**Definitiefase**	**maa 1-2-21**	**95,79 wkn**	**don 1-12-22**
76				
77	**Ontwerpfase**	**maa 4-10-21**	**237,6 wkn**	**woe 22-4-26**
78	**Ontwerp openbare ruimte (totaal)**	**maa 4-10-21**	**115 wkn**	**vri 15-12-23**
79	**Voorlopig Ontwerp (VO)**	**maa 4-10-21**	**104,01 wkn**	**maa 2-10-23**
92	**BLVC-plan**	**maa 6-3-23**	**31 wkn**	**maa 9-10-23**
98	Overleg PZH aansluiting op Waddingerbrug	vri 15-12-23	0 wkn	vri 15-12-23
99	**Samenwerkingsovereenkomst (SOK)**	**maa 11-7-22**	**75,39 wkn**	**din 19-12-23**
100	Opstellen SOK incl. afstemming met gemeente Voorschoten (plankosten, kosten openbare ruimte)	maa 11-7-22	73 wkn	maa 4-12-23
101	SOK in PO Leiden (en Voorschoten)	maa 4-12-23	1 wk	maa 11-12-23
102	SOK in B en W Leiden en Voorschoten	din 12-12-23	1,19 wkn	din 19-12-23
103	**Raadsbesluit Voorschoten**	**maa 18-12-23**	**11,6 wkn**	**don 7-3-24**
104	Behandeling Stafoverleg	maa 18-12-23	0 wkn	maa 18-12-23
105	Behandeling in B en W	din 19-12-23	4 wkn	din 16-1-24
106	Behandeling in Cie Wonen, Ruimte en Groen	vri 19-1-24	3 wkn	don 8-2-24
107	Behandeling in raad	vri 9-2-24	4 wkn	don 7-3-24
108	**Uitvoeringsbesluit Leiden**	**maa 9-10-23**	**21,79 wkn**	**don 7-3-24**
109	Opstellen besluit	maa 9-10-23	8 wkn	maa 4-12-23
110	Besluit in sturingsdriehoek / PO	maa 4-12-23	1 wk	maa 11-12-23
111	Besluit in B en W	woe 13-12-23	1 wk	din 19-12-23
112	*Kerstreces*	maa 25-12-23	2 wkn	maa 8-1-24
113	Besluit in Cie Leefbaarheid en Bereikbaarheid (horen)	don 21-12-23	5 wkn	don 25-1-24
114	Besluit in Cie Leefbaarheid en Bereikbaarheid (inhoudelijke behandeling)	don 25-1-24	3 wkn	don 15-2-24
115	*Voorjaarsreces*	maa 19-2-24	1 wk	maa 26-2-24
116	Besluit vaststellen in raad	vri 16-2-24	3 wkn	don 7-3-24
117	**Ontwerp openbare ruimte (totaal)**	**woe 20-12-23**	**17 wkn**	**din 16-4-24**
118	**Definitief Ontwerp (DO)**	**woe 20-12-23**	**17 wkn**	**din 16-4-24**
119	DO	woe 20-12-23	13 wkn	din 19-3-24
120	Kostenraming (SSK)	woe 20-3-24	2 wkn	din 2-4-24
121	Beheertoets	woe 20-3-24	2 wkn	din 2-4-24
122	Grote Tacor	woe 3-4-24	2 wkn	din 16-4-24
123	**Omgevingsvergunning (uitgebreid zonder VVGB) - definitieve ontsluiting Het Fortuyn**	**woe 20-12-23**	**122 wkn**	**woe 22-4-26**
124	Indienen aanvraag omgevingsvergunning (incl. resultaten onderzoeken) o.b.v. VO (gemeente Voorschoten)	woe 20-12-23	0 wkn	woe 20-12-23
125	Procedure omgevingsvergunning (incl. bomenkap)	don 21-12-23	8 wkn	woe 14-2-24
126	Evt. Verlenging procedure (i.v.m. economische uitvoerbaarheid)	maa 11-3-24	6 wkn	vri 19-4-24
127	Aanvraag in PO	don 15-2-24	1,5 wkn	maa 26-2-24
128	Aanvraag in B en W	woe 28-2-24	2 wkn	din 12-3-24
129	Vrijgave en publicatie (ruimtelijk onderbouwing + aanvraag)	woe 13-3-24	1 wk	din 19-3-24
130	Ter visie legging	woe 20-3-24	6 wkn	din 30-4-24
131	Verwerken zienswijzen en opstellen zienswijzenrapport (2w bij geen zienswijzen)	woe 1-5-24	4 wkn	din 28-5-24
132	Vaststellen in PO (alleen bij zienswijzen)	woe 29-5-24	0,8 wkn	maa 3-6-24
133	Vaststellen in B en W (alleen bij zienswijzen)	woe 5-6-24	2 wkn	din 18-6-24
134	Afgifte omgevingsvergunning	woe 19-6-24	1 wk	din 25-6-24
135	Publicatie definitief besluit	woe 26-6-24	1,2 wkn	woe 3-7-24
136	Beroep volgens Awb	don 4-7-24	6 wkn	woe 14-8-24
137	Wachttijd	don 15-8-24	1 wk	woe 21-8-24
138	Vergunning onherroepelijk bij geen bezwaar	woe 21-8-24	0 wkn	woe 21-8-24
139	Besluit RvS inzake verzoek om voorl. Voorziening	don 15-8-24	10 wkn	woe 23-10-24
140	ev. Bodemprocedure	don 24-10-24	78 wkn	woe 22-4-26
141	Vergunning onherroepelijk	woe 22-4-26	0 wkn	woe 22-4-26

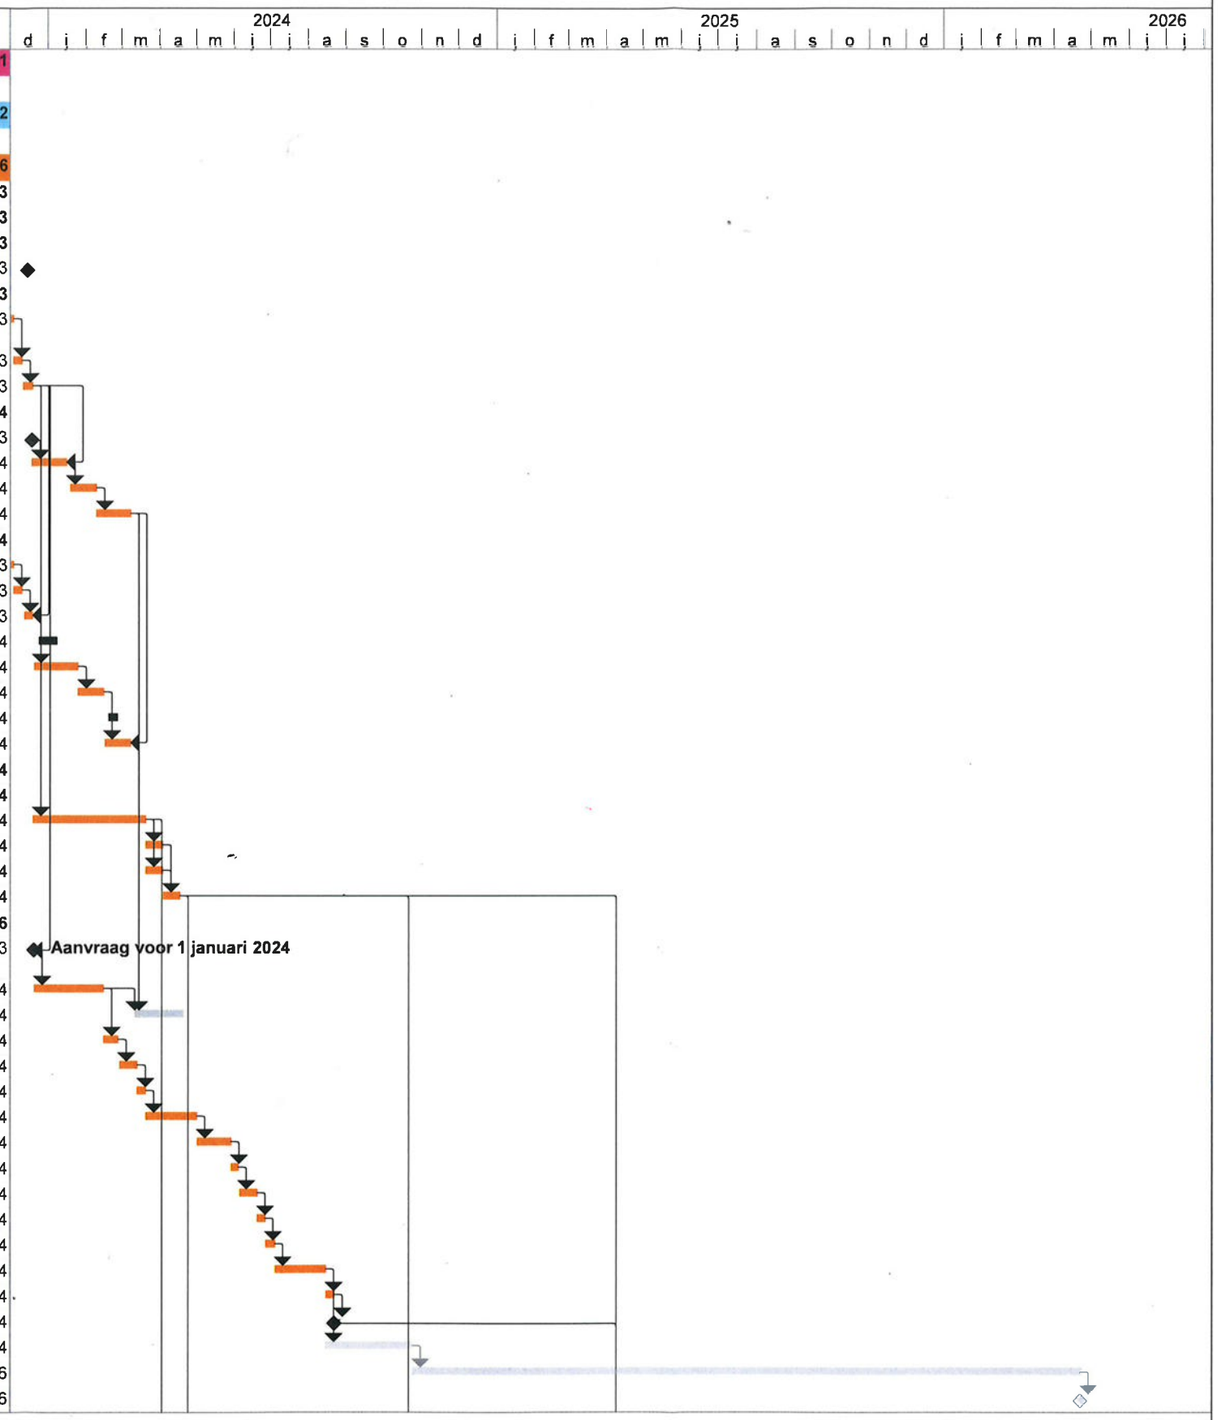

Projectfases: initiatief — definitie — ontwerp — voorbereiding — realisatie — beheer

RN 46
