Bedragen Exclusief BTW

5DI003: Plein 1969/De Doorgang, Heeswijk-Dinther - De ontmoeting

Bouwjaar: 1982

inspectiedatum: 5-7-2022

907311 Kunstwerk natuursteen 1 st 1

Bouw, Gering gebrek, Verval 1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

Maatregel: 1 st Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud

Startjaar: 2025

Bedrag € 500,00

Advies vervangingsjaar:

Breuk en afbrokkelen natuurstenen sokkel.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Veiligheid/gezondheid	1	0		3
Cultuur historische waarde	3	1		2
Gebruik en bedrijfsproces	1	1		5
Technische vervolgschade	2	2		6
Toename klachtenonderhoud	1	2		7
Beleving, esthetica	3	3		7
Energie	1	1		6

5HS001: De Misse, Heesch - Carnaval de Animaux

Bouwjaar: 1972

inspectiedatum: 5-7-2022

907396 Kunstwerk brons — 1 st — 4

Defecten; eindstadium — 4



Omvang: Regelmatig: 10-30%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

Maatregel: 1 st Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud

Startjaar: 2025

Bedrag € 2.500,00

Advies vervangingsjaar:

Betreft niet functioneren van 2 uitlopers. Geadviseerd wordt deze te repareren.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Veiligheid/gezondheid				
Cultuur historische waarde				
Gebruik en bedrijfsproces				
Technische vervolgschade				
Toename klachtenonderhoud	1	2		7
Beleving, esthetica				
Energie				


5HS004: Boekweit/Gerst, Heesch - Roggeblad

Bouwjaar: 1993

inspectiedatum: 5-7-2022

907397 Kunstwerk messing 1 st 1

Afbrokkelen afboeren; eindstadium 1

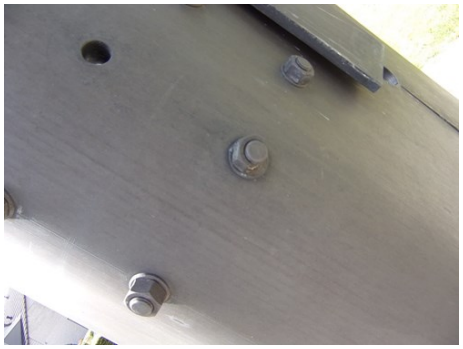



Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

Maatregel: 1 st Vervangen

Startjaar: 2025

Bedrag € 200,00

Advies vervangingsjaar:

1 bout afgebroken deze vervangen, 2x bout/moer ontbreken deze aanbrengen.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Veiligheid/gezondheid				
Cultuur historische waarde	1	1		4
Gebruik en bedrijfsproces				
Technische vervolgschade				
Toename klachtenonderhoud				
Beleving, esthetica	1	3		9
Energie				

5HW006: Aula Gymnasium Bernrode, Heeswijk-Dinther - Romance, Money en Motorbikes

Bouwjaar: 2010

inspectiedatum: 6-7-2022

631130003 Verlichtingsarmaturen LED

1 st

6

Defecten; eindstadium

6

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

Maatregel: 1 st Vervangen

Startjaar: 2025

Bedrag € 0,00

Advies vervangingsjaar:

Op het moment van opname was de gehele installatie defect. Er is begrepen dat het kunstwerk slechts 1 jaar ook daadwerkelijk heeft mogen functioneren. Allerminst wens van Gymnasium om deze te laten herstellen. In overleg bekijken wat wenselijk is.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Veiligheid/gezondheid				
Cultuur historische waarde				
Gebruik en bedrijfsproces	3	1		3
Technische vervolgschade				
Toename klachtenonderhoud				
Beleving, esthetica				
Energie				

5HS022: Monseigneur van Oorschotlaan, Heeswijk -Dinther - Airborne Monument

Bouwjaar: 1997

461001004 Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend, klasse 4 >30 cm

4 m2

1

Afbladderen, kale delen; eindstadium

4

Omvang: Regelmatig: 10-30%
Intensiteit Hoog (Eindstadium)

Maatregel: 4 m2 Vervolgsysteem, hergebruik, revisie
Startjaar: 2023
Bedrag € 600,00

Advies vervangingsjaar:

Verflaag op bank afgebladderd door mogelijke onvoldoende hechting.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Veiligheid/gezondheid				
Cultuur historische waarde				
Gebruik en bedrijfsproces				
Technische vervolgschade	3	2		5
Toename klachtenonderhoud				
Beleving, esthetica	2	3		8
Energie				

5HS020: De Hoef, Heesch - Bovenloop van den laaglandbeek, insectenflats,

Bouwjaar: 2003

inspectiedatum: 21-1-2025

211103 Buitenwanden, niet constructief metselwerk — 8 m2 — 3

Ontbrekende (onder-)delen; eindstadium — 3



Omvang: Regelmatig: 10-30%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

Maatregel: 1 pst Vervangen

Startjaar: 2025

Bedrag € 650,00

Advies vervangingsjaar:

Betreft ontbrekend metselwerk. Tevens ontbreekt de afdekking. Geadviseerd wordt het metselwerk waar nodig aan te helen en de afdekking aan te brengen.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Veiligheid/gezondheid	1	0		3
Cultuur historische waarde				
Gebruik en bedrijfsproces				
Technische vervolgschade				
Toename klachtenonderhoud				
Beleving, esthetica	1	3		9
Energie				

5HS020: De Hoef, Heesch - Bovenloop van den laaglandbeek, insectenflats,

Bouwjaar: 2003

inspectiedatum: 21-1-2025

411209 Buitenwandafwerking kunststof — 32 m2 — 4

Loszittend, onsamenhangend; eindstadium — 4



Omvang: Regelmatig: 10-30%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

Maatregel: 1 pst Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud

Startjaar: 2025

Bedrag € 4.250,00

Advies vervangingsjaar:

Betreft loszittende en ontbrekende kunststof panelen. De multiplex kasten vertonen houtrot waardoor waardoor de montage loskomt. Geadviseerd wordt alle panelen te verwijderen, houten constructie waar nodig te vervangen en de panelen opnieuw te monteren.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Veiligheid/gezondheid	3	0		1
Cultuur historische waarde				
Gebruik en bedrijfsproces				
Technische vervolgschade				
Toename klachtenonderhoud				
Beleving, esthetica	1	3		9
Energie				
