

INSPECTIERAPPORT | 2.2020/23
RAPPORTAGEDATUM | 26 MEI 2023
VERSIENUMMER | 1

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

GEÏNSPECTEERDE VOORZIENING:

De milieustraat

PROJECT
Milieustraat Laarbeek
De Stater 2
5737 RV Lieshout

OPDRACHTGEVER
BLINK
Gerstdijk 1
5704 RG Helmond

GEAUTORISEERD DOOR
DESKUNDIG INSPECTEUR NIVEAU 1:

ing. Bjørn van der Heijden

Deze rapportage mag alleen in zijn geheel én ongewijzigd worden gereproduceerd met toestemming van ABV Haukes. Overal waar staat vermeld AS SIKB 6700 en de betreffende protocollen wordt bedoeld versie 3.0 d.d. 15 februari 2018

ABV HAUKES BODEMBESCHERMING

Dorpsstraat 112
6544 AG Nijmegen

024 - 303 00 94
projectnr. 2.2020/23

info@abvhaukes.nl
www.abvhaukes.nl







INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMENE GEGEVENS 1
2. CONCLUSIE 2
3. BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 2
4. DOSSIERONDERZOEK 3
4.1 Inleiding 3
4.2 Uitgangspunten herinspectie 3
4.3 Informatie over eerdere inspecties 3
4.4 Onafhankelijkheid 3
5. HERINSPECTIE EN NADER ONDERZOEK 3
5.1 Inleiding 3
5.2 Verslaglegging resultaten herinspectie 3
5.3 Nader onderzoek 3
6. PROFESSIONELE MENING 3
7. HERSTELTERMIJN 4
8. GEREEDMELDING HERSTELWERKZAAMHEDEN 4
9. HERINSPECTIE 4
10. DE VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING 4
11. TERMIJN TOT DE VOLGENDE BEOORDELING 5
12. BEDRIJFSINTERNE CONTROLE 5
13. AANSPRAKELIJKHEID 5
BIJLAGE 1: WAARNEMINGEN EN BEVINDINGEN

1. ALGEMENE GEGEVENS

OPDRACHTGEVER	:	BLINK Gerstdijk 1 5704 RG Helmond Tel.: 0492 - 58 00 00
CONTACTPERSOON	:	De heer D. Bleumer
REFERENTIE OPDRACHTGEVER	:	0000
NAAM TE INSPECTEREN LOCATIE	:	Milieustraat Laarbeek De Stater 2 5737 RV Lieshout
VAN TOEPASSING ZIJNDE WET- EN REGELGEVING	:	Het activiteitenbesluit
GEÏNSPECTEERDE VOORZIENING	:	De milieustraat
OPDRACHTNEMER	:	ABV Haukes Inspectiediensten B.V. Dorpsstraat 112 6544 AG Nijmegen Tel.: 024 - 303 00 94
OFFERTENUMMER	:	22.9.1681
INSPECTIEGRONDSLAG	:	▪ NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 ▪ AS SIKB 6700/Protocol 6701
PROJECTNUMMER	:	2.2020/23
SIKB NUMMER	:	95352
DATUM RAPPORTAGE	:	26 mei 2023
RAPPORTAGE OPGESTELD DOOR	:	Nicky Bongers

INSPECTIEDATUM	INSPECTEUR	PARAAF INSPECTEUR[1]
14 APRIL 2023	NICKY BONGERS	

Het weer tijdens de inspectie	bewolkt	10,1 °C	70%	1008hPa

[1] Met het ondertekenen van deze inspectierapportage verklaart de inspecteur dat de inspectie en de beoordeling onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd

2. CONCLUSIE

De conclusies van de uitgevoerde inspectie staan vermeld in onderstaande tabel. Het betreft de volgende items:

- of de voorziening als vloeistofdicht is aangemerkt
- of een nader onderzoek noodzakelijk is om uiteindelijk te kunnen bepalen of de voorziening voldoet aan de eisen uit AS SIKB 6700 en het betreffende Protocol
- de datum waarop de voorziening als vloeistofdicht is aangemerkt
- de frequentie waarmee de bedrijfsinterne controle (BIC) moet worden uitgevoerd
- einde keuringstermijn (de datum waarop de voorziening opnieuw goedgekeurd moet zijn).

VOORZIENING	VLOEISTOFDICHT?	NADER ONDERZOEK?	DATUM VLOEISTOFDICHT	FREQUENTIE BIC PER JAAR	EINDE KEURINGSTERMIJN
De milieustraat	nee	nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

De reden voor het niet kunnen afgeven van de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening staat vermeld in Bijlage 1

3. BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN

In opdracht van BLINK is door ABV Haukes Inspectiediensten B.V. (hierna ABV Haukes) als onafhankelijk deskundig inspectie- en adviesbureau een herinspectie uitgevoerd ter plaatse van de milieustraat.

De doelstelling van de door ons uitgevoerde herinspectie was te bepalen of de als gereed gemelde herstelwerkzaamheden op de juiste wijze zijn uitgevoerd dat de betreffende voorziening als vloeistofdicht kan worden aangemerkt.

ABV Haukes is aangesloten bij de Stichting Onafhankelijke Deskundige Inspecteurs en adviseurs (Stichting ODI/VDV).

Het Besluit bodemkwaliteit richt zich op kwaliteit én integriteit van de bodemintermediair.

Op grond van artikel 2 van het besluit bodemkwaliteit heeft ABV Haukes een erkenning voor het uitvoeren van inspecties van bodembeschermende voorzieningen. De erkenning is te vinden op de website van ABV Haukes.

Voor het uitvoeren van inspecties is ABV Haukes geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer I198.

De accreditatie is van toepassing op de volgende activiteiten:

- visuele inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen volgens Protocol 6701
- inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met een geo-elektrische meting volgens Protocol 6702
- inspectie van de vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met een hydrologische meting volgens Protocol 6703
- het uitvoeren van inspecties van IBC-werken volgens AS SIKB 6900 en Protocol 6902.

Het certificaat van de accreditatie (accreditatienummer I198) van ABV Haukes en het hierbij behorende accreditatielogo en het SIKB-beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de inspectiewerkzaamheden incl. rapportage.

De resultaten van de inspectie en de conclusie uit deze rapportage zijn alleen van toepassing op de geïnspecteerde voorziening zoals vermeld in deze rapportage.

WIST U DAT?:

Wij nog meer voor u kunnen betekenen nl.:

- Jaarlijkse Bedrijfsinterne Controles (BIC's)
- Inspecties vloeistofkerende voorzieningen
- Inspecties civieltechnische kunstwerken
- Activiteitenanalyses NRB 2012
- Beheer- en onderhoudsprogramma's
- Trainingen en cursussen
- Bodembescherming in tankputten

Wilt u meer informatie kijk dan op onze website: www.abvhaukes.nl

4. DOSSIERONDERZOEK

4.1 INLEIDING

Voordat tot de herinspectie kon worden overgegaan zijn er een aantal gegevens gecontroleerd. In deze paragraaf treft u een samenvatting van de gegevens aan.

4.2 UITGANGSPUNTEN HERINSPECTIE

De uitgangspunten van deze herinspectie zijn ongewijzigd ten opzichte van de vorige inspectie. Voor een overzicht wordt naar de betreffende rapportage verwezen (zie 3.3255/23 d.d. 29 maart 2023).

De inspectie is volgens opdracht uitgevoerd.

4.3 INFORMATIE OVER EERDERE INSPECTIES

Op 28 februari 2023 is er een inspectie uitgevoerd. Onze bevindingen zijn gerapporteerd in de rapportage met kenmerk 3.3255/23 d.d. 29 maart 2023.

4.4 ONAFHANKELIJKHEID

Voorafgaand aan de inspectie is door ons getoetst of de onafhankelijkheidscriteria voor een type A inspectie-instelling zijn gewaarborgd ten opzichte van de opdrachtgever.

ABV Haukes is onafhankelijk ten opzichte van de opdrachtgever.

5. HERINSPECTIE EN NADER ONDERZOEK

5.1 INLEIDING

Bij een herinspectie wordt voor de in opdracht gegeven voorziening de herstelde gebreken beoordeeld. In deze paragraaf is weergegeven welke voorziening en onderdelen ervan zijn beoordeeld.

5.2 VERSLAGLEGGING RESULTATEN HERINSPECTIE

Onze waarnemingen en bevindingen staan vermeld in Bijlage 1.

De eventuele tekortkomingen zijn geclassificeerd in gebreken en onvolkomenheden.

Ook is tijdens het uitvoeren van de inspectie onderscheid gemaakt tussen kritieke en niet kritieke plaatsen van gebreken zoals aangegeven in het betreffende Protocol. De aard, hoeveelheid en de plaats van de gebreken bepalen of een herinspectie op locatie noodzakelijk is. Voor een weergave van de bedrijfssituatie wordt verwezen naar de vorige rapportage met kenmerk 3.3255/23.

5.3 NADER ONDERZOEK

Een nader onderzoek is niet aan de orde. Tijdens de herinspectie is voldoende duidelijkheid verkregen over de vloeistofdichtheid.

6. PROFESSIONELE MENING

Een professionele mening wordt door ons afgegeven voor voorzieningen waar gebreken zijn geconstateerd.

De professionele mening bestaat uit:

- een omschrijving van de technische eisen waaraan de herstelwerkzaamheden moeten voldoen om de gebreken op een duurzame wijze te herstellen
- suggesties met maatregelen of wijziging van de bedrijfsvoering om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico voor de bedrijfsactiviteit (indien de vergunning of het Activiteitenbesluit dit mogelijk maakt).

De omschrijving van de technische eisen aan de herstelwerkzaamheden zijn gebaseerd op:

- de stand der techniek zoals vastgelegd in CUR/PBV-Aanbevelingen en beoordelingsrichtlijnen voor ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte voorzieningen
- andere relevante en van toepassing te verklaren normen en technische grondslagen
- de uitvoeringsmethoden zoals omschreven in de publicatie 'Herstelmaatregelen en Vloeistofdichte Voorzieningen' van Stichting ODI/VDV.

In Bijlage 1 wordt in tabelvorm per geconstateerd gebrek de professionele mening en de totale hoeveelheid vermeld (let wel: het betreft schattingen die licht af kunnen wijken van de werkelijkheid).

Daarnaast worden de locaties van de aangetroffen gebreken op een schets en/of foto's aangegeven. Hierdoor zijn de gebreken makkelijk terug te vinden op locatie.

De uiteindelijke keuze van de herstelwijze behoort tot de verantwoordelijkheid van de houder van de voorziening/inrichting.

7. HERSTELTERMIJN

Alleen in de gevallen dat er gebreken worden geconstateerd is een hersteltermijn van toepassing. De herstelwerkzaamheden moeten uiterlijk 29 september 2023 gereed zijn gemeld. Daarna hebben wij nog 1 maand de tijd om de herinspectie in te plannen en uit te voeren.

8. GEREEDMELDING HERSTELWERKZAAMHEDEN

In Bijlage 1 zijn de technische eisen aan de herstelwerkzaamheden omschreven.

De herstelwerkzaamheden moeten uiterlijk 29 september 2023 gereed worden gemeld. U kunt dit doen door ons te bellen of een mailbericht te sturen.

OPMERKING:

Wanneer de herstelwerkzaamheden niet binnen 6 maanden na de rapportagedatum als gereed bij ons zijn afgemeld is het verplicht na de gereedmelding van de herstelwerkzaamheden een nieuwe inspectie uit te voeren waarbij alle voorzieningen opnieuw geïnspecteerd moeten worden. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een opnieuw te verrekenen afdracht aan het SIKB.

9. HERINSPECTIE

Alle herstelwerkzaamheden uit Bijlage 1 moeten uiterlijk 29 september 2023 zijn uitgevoerd en gereedgemeld.

Omdat er bij de herinspectie gebreken zijn geconstateerd is een herinspectie met locatiebezoek noodzakelijk. Bij het uitvoeren van de herinspectie worden alleen de gerapporteerde gebreken geïnspecteerd.

Wij verzoeken u, nadat de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, contact met ons op te nemen en het 'opdrachtformulier herinspectie' op te sturen. Het opdrachtformulier vindt u bij de begeleidende brief van de rapportage. Wij nemen na ontvangst contact met u op om een afspraak te maken voor het uitvoeren van de herinspectie.

10. DE VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING

Bij het verzenden van de rapportage wordt voor de voorziening die als vloeistofdicht is aangemerkt een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV) afgegeven. Op de betreffende verklaring wordt een door het SIKB verstrekt registratienummer vermeld.

Aanleidingen voor een nieuwe inspectie kunnen zijn:

1. de wettelijk gestelde keuringstermijn verstrijkt of
2. de bedrijfsinterne controles zijn niet aantoonbaar uitgevoerd en/of
3. als er zich een in de vergunning of besluit beschreven situatie voordoet waardoor er getwijfeld wordt aan de vloeistofdichtheid van de voorziening.

11. TERMIJN TOT DE VOLGENDE BEOORDELING

De geldigheidstermijn van een verklaring is 6 jaar.

> OPMERKING:
> De inspectie is een momentopname en de Deskundig Inspecteur hoeft slechts vast te stellen of de voorziening op het moment van inspecteren vloeistofdicht is en niet of de voorziening ook gedurende de keuringstermijn vloeistofdicht blijft.

12. BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Zoals gesteld in AS SIKB 6700 moet de Deskundig Inspecteur aangeven met welke frequentie de bedrijfsinterne controle moet worden uitgevoerd (zie hoofdstuk 2 en Bijlage 1). Deze frequentie volgt uit het Activiteitenbesluit.

De bedrijfsinterne controles moeten door of namens de houder van de voorziening/inrichting worden uitgevoerd. Hiervoor wordt door ons, gelijktijdig met het verzenden van de verklaring, voor de voorziening een controlelijst aangereikt.

Het kan zijn dat de nummering van de te controleren items niet logisch staat weergegeven op de controlelijst. Dit heeft te maken met het feit dat het gaat om een voorgeschreven document (basismodel uit AS SIKB 6700) waar geen tekstuele aanpassingen aan gedaan mogen worden. Wel hebben wij de verplichting om alleen die items te vermelden die van toepassing zijn op de door ons geïnspecteerde voorziening.

Als er bijvoorbeeld geen riolering aanwezig is in een vloer dan mogen wij controlepunt 3 & 4 niet vermelden op de betreffende controlelijst.

De handhaving van deze wettelijke verplichting geschiedt door het bevoegde gezag.

> OPMERKING:
> U kunt de bedrijfsinterne controle ook door ons laten verzorgen zodat u hier geen omkijken meer naar heeft. Wij plannen (in overleg) de controles in en u krijgt van ons een uitvoerige rapportage. Wij stellen met alle plezier een aanbieding voor u op.

13. AANSPRAKELIJKHEID

De persoonsgegevens van onze opdrachtgever die zijn vermeld in deze rapportage zijn door ons verwerkt volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). ABV Haukes heeft hiervoor een privacyverklaring opgesteld (klik hier).

Wij hebben de werkzaamheden met betrekking tot het uitvoeren van de herinspectie en het opstellen van de rapportage zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd; echter moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat er fouten en onvolledigheden voorkomen in de rapportage. Het gebruik van deze rapportage is geheel voor eigen risico van de gebruiker en ABV Haukes sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze rapportage en de daarin opgenomen gegevens, tenzij de schade mocht voortvloeien uit opzet of grove schuld van de zijde van ABV Haukes en/of degenen die aan deze rapportage hebben meegewerkt.

DE MILIEUSTRAAT

GEGEVENS VOORZIENING:

INSPECTIEGRONDSLAG	:	AS SIKB 6700 en Protocol 6701
VOORZIENING VRIJ VAN MATERIALEN, MATERIEEL, VERONTREINIGINGEN, MACHINES EN INSTALLATIES?	:	Ja
GEÏNSPECTEERD OPPERVLAK	:	± 4.100 m²
JAAR VAN AANLEG VAN DE VOORZIENING	:	2003
SAMENSTELLING/OPBOUW VAN DE CONSTRUCTIE	:	De asfaltconstructie
LAAG DIE DE VLOEISTOFDICHTHEID MOET WAARBORGEN	:	De asfaltconstructie
BEDRIJFSACTIVITEIT/GEBRUIK	:	Inzamelen en op- en overslag van grof huishoudelijk- en bedrijfsafval
OP DE VOORZIENING UITGEOEFENDE BELASTINGEN	:	Rollende-, vallende-, slepende- en statische belastingen
AANWEZIGE (MORS)VLOEISTOFFEN	:	Grof huishoudelijk- en bedrijfsafval, verontreinigd water en slib, chemicaliën
AANWEZIGHEID BEDRIJFSRIOLERING?	:	Ja; ter plaatse van de geïnspecteerde voorziening zijn goten en putten aanwezig die zijn afgedekt met roosters. De goten en putten zijn niet visueel beoordeeld conform Protocol 6701
BEDRIJFSRIOLERING BEOORDEELD IN DEZE OPDRACHT?	:	Nee
ONDERSTEUNING VAN WERKZAAMHEDEN TIJDENS DE INSPECTIE?	:	Ja, het boren van kernen door door Q-civiel
KRITISCHE APPARATUUR GEBRUIKT TIJDENS DE INSPECTIE?	:	Ja, de Permeability cell met nummer ABV PTC002
GEREEDMELDING HERSTELWERKZAAMHEDEN	:	Zo spoedig mogelijk, rekening houdend met de technische haalbaarheid uiterlijk 29 september 2023
DATUM VLOEISTOFDICHT	:	Niet van toepassing; te bepalen na het uitvoeren van de herinspectie
TERMIJN TOT DE VOLGENDE BEOORDELING	:	Niet van toepassing; te bepalen na het uitvoeren van de herinspectie
FREQUENTIE BEDRIJFSINTERNE CONTROLE	:	Niet van toepassing; te bepalen na het uitvoeren van de herinspectie

OVERZICHT BEDRIJFSSITUATIE



















VOORZIENING 1 VAN 1 DE MILIEUSTRAAT

OPZET VAN HET BOORKERNONDERZOEK

In Protocol 6701 wordt gesteld dat bij asfaltverhardingen de vloeistofdichte laag moet worden vastgesteld van het asfaltpakket. In de praktijk betekent dit dat de opbouw van het asfaltpakket als niet vloeistofdicht moet worden beschouwd en dat in veel gevallen een nader onderzoek naar de doorlatendheid van het asfaltpakket moet worden uitgevoerd. In situaties waarbij een bitumineus membraan in de constructie aanwezig is en de inspecteur tijdens de aanleg van de voorziening dit membraan heeft gecontroleerd is een nader onderzoek niet nodig. Conform Bijlage 1 paragraaf 4.4 van Protocol 6701 mag een dubbele kleeflaag niet worden aangemerkt als een bitumineus membraan.

Protocol 6701 geeft onder Bijlage 1 paragraaf 4.5.2 meerdere opties om een nader onderzoek naar de doorlatendheid van het asfaltpakket uit te voeren, afhankelijk van de situatie kan de deskundig inspecteur kiezen uit de volgende opties:

- bepaling van het percentage holle ruimten van de asfaltlagen door boorkernonderzoek (NEN-EN 12697-8), waarbij maximaal 3% holle ruimte mag worden gemeten
- permeatiemetingen op de gehele asfaltkern, waarbij gedurende de proef geen doorslag van vloeistoffen plaats mag vinden (CUR/PBV-aanbeveling 52)
- absorptieproeven op de gehele asfaltkern, waarbij gedurende de proef geen doorslag van vloeistoffen mag optreden (CUR/PBV-aanbeveling 88)
- doorlatendheidmeting op de gehele boorkern d.m.v. een permeability cell, waarbij er gedurende 15 minuten bij een overdruk van 0,4 bar geen drukverlies mag optreden en er geen luchtbelvorming mag plaatsvinden. Het aantal proefstukken (kernen) waarop nader onderzoek moet worden uitgevoerd, is vermeld in de Handleiding vloeistofdichte bitumineuze constructies, uitgave VBW-Asfalt.

In deze situatie is gekozen voor het uitvoeren van een onderzoek met een permeability cell. Hierbij wordt de doorlatendheid voor vloeistoffen afgeleid uit de doorlatendheid van lucht. In de Handleiding vloeistofdichte bitumineuze constructies uit 2008 staat deze opstelling beschreven. Uit praktijkervaringen met een dergelijke testopstelling in Nederland blijkt dat bij het hanteren van een overdruk van 0,4 bar gedurende 15 minuten duidelijk te onderscheiden is of een boorkern ondoorlatend is. Gedurende 15 minuten mag geen drukverlies optreden en mag geen luchtbelvorming zichtbaar zijn.

MONSTERNAME BOORKERNEN

Op 14-04-2023 zijn tijdens de inspectie op locatie door de Deskundig Inspecteur van ABV Haukes 3 locaties aangewezen waar kernen geboord moesten worden uit het asfaltterrein. De kernen zijn geboord door Q-civiel. De boorlocaties zijn willekeurig gekozen. Op de boorlocaties zijn 3 st. kernen geboord, 1 st. op 1 m^1 uit de lasnaad (nr. A), 1 st. bij een aansluiting (nr. B) en 1 st. bij een aansluiting, handwerk, aanzet of op een lasnaad (nr. C). De locaties van de geboorde kernen zijn aangegeven in de overzichtstekening.

De diameter van de boorkernen bedroeg ± 100 mm^1. De door het boren ontstane gaten in de asfaltverharding zijn direct na het boren weer afgedicht met gietasfalt. Het afdichten van de boorgaten is door ABV Haukes beoordeeld en in orde bevonden.

UITSLAG BOORKERNONDERZOEK

Op 24-04-2023 zijn de 3 st. kernen op het kantoor van ABV Haukes getest met de permeability cell. Tijdens het testen van de 3 kernen is geen drukverlies en luchtbelvorming waargenomen.

De opbouw van de asfaltconstructie is ondoorlatend en kan daarmee als vloeistofdicht worden beschouwd. Foto's van de monstername, het afdichten van de boorgaten en testen van de boorkernen zijn weergegeven op de vorige pagina.

WAARNEMINGEN EN BEVINDINGEN

De voorziening kon op het moment van de herinspectie niet als vloeistofdicht worden aangemerkt.

In § 6 is aangegeven hoe om te gaan met voorzieningen waarbij gebreken zijn geconstateerd. In de op het gebrek afgestemde omschrijving van de technische eisen aan de herstelwerkzaamheden wordt omschreven op welke wijze het herstel kan worden uitgevoerd. Tekortkomingen dienen binnen de termijn zoals omschreven in het hoofdrapport te worden hersteld en gereed gemeld. Door het uitvoeren van een herinspectie kan de voorziening dan alsnog als vloeistofdicht worden aangemerkt.

01 TEKORTKOMING (GEKWALIFICEERD ALS GEBREK OP EEN KRITIEKE PLAATS)

LOCATIE	:	ZIE SITUATIESCHETS
AANTAL OP TEKENING	:	5 ST.
TOTALE HOEVEELHEID	:	± 375 M¹

Tijdens de inspectie hebben wij geconstateerd dat vloeistoffen mogelijk in de ondergrond kunnen wegvloeien ter plaatse van de niet gevulde voegsponning/aansluiting.






OMSCHRIJVING TECHNISCHE EISEN HERSTELWERKZAAMHEDEN

Het geheel te herstellen van de voegsponning/aansluiting door een warme bitumineuze voegvullingsmassa aan te brengen volgens paragraaf 8.2, 8.3 en 9.2 van VBW-uitgave asfaltonderhoudstechnieken en paragraaf 5 van de Handleiding vloeistofdichte bitumineuze constructies.

VOORZIENING 1 VAN 1 DE MILIEUSTRAAT

De milieustraat

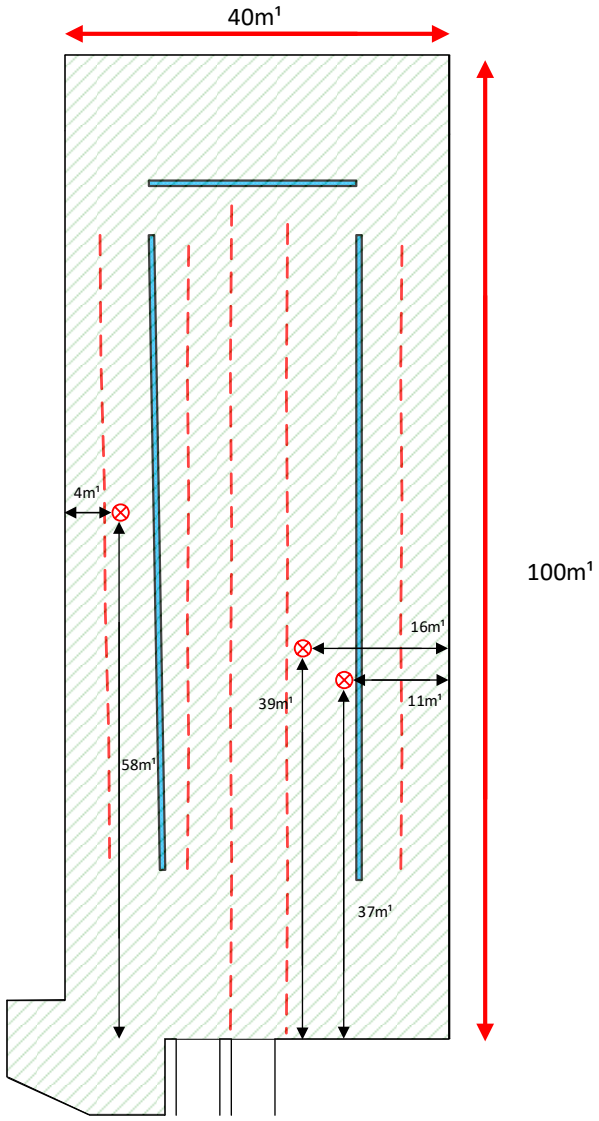

Milieustraat Laarbeek
De Stater 2
5737 RV Lieshout
