
Projectcode: IBL79034.15
Projectnaam: Park Molenveen Voorthuizen
Getekend volgens: NEN 5104

ingenieursbureau Land

Meetpunt: 201


Datum: 15-12-2025
Boormeester: B.J. Hulsbosch



0	gras
	Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, resten baksteen, neutraal bruinzwart, Edelmanboor
50	Veen, neutraal bruinrood, Edelmanboor
100	

Meetpunt: 202


Datum: 15-12-2025
Boormeester: B.J. Hulsbosch
Lengte gat/sleuf: 0,30
Breedte gat/sleuf: 0,30



0	gras
	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruinzwart, Schep
30	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, brokken baksteen, zwak glashoudend, matig aardewerkhoudend, donker bruinzwart, Schep
70	Veen, neutraal bruinrood, Edelmanboor
100	

Meetpunt: 203


Datum: 15-12-2025
Boormeester: B.J. Hulsbosch
Reden gestaakt: Obstakel puin
Lengte gat/sleuf: 0,30
Breedte gat/sleuf: 0,30



0	gras
5	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruinzwart, Schep
	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, brokken baksteen, sterk glashoudend, brokken dakpan, matig schelphoudend, matig aardewerkhoudend, donker bruinzwart, Schep
50	

Meetpunt: 204


Datum: 15-12-2025
Boormeester: B.J. Hulsbosch



0	gras
	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, resten baksteen, donker bruinzwart, Edelmanboor
100	

Meetpunt: 205


Datum: 15-12-2025
Boormeester: B.J. Hulsbosch



0	gras
	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, resten baksteen, resten aardewerk, donker bruinzwart, Schep
50	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, matig baksteenhoudend, matig aardewerkhoudend, zwak glashoudend, donker bruinzwart, Schep
70	Veen, neutraal bruinrood, Edelmanboor
100	

Meetpunt: 206

Datum: 15-12-2025
Boormeester: B.J. Hulsbosch
Reden gestaakt: Obstakel puin
Lengte gat/sleuf: 0,30
Breedte gat/sleuf: 0,30




0	gras
10	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruinzwart, Schep
	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, sterk baksteenhoudend, zwak dakpanhoudend, zwak glashoudend, zwak aardewerkhoudend, sterk roesthoudend, donker bruinrood, Schep
70	

Projectcode: IBL79034.15
Projectnaam: Park Molenveen Voorthuizen
Getekend volgens: NEN 5104

ingenieursbureau Land

Meetpunt: 207


Datum: 15-12-2025
Boormeester: B.J. Hulsbosch
Lengte gat/sleuf: 0,30
Breedte gat/sleuf: 0,30



0 gras
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, resten baksteen, resten glas, donker bruinzwart, Schep
40
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, uiterst puinhoudend, donker bruinzwart, Schep
100

Meetpunt: 208


Datum: 15-12-2025
Boormeester: B.J. Hulsbosch
Lengte gat/sleuf: 0,30
Breedte gat/sleuf: 0,30

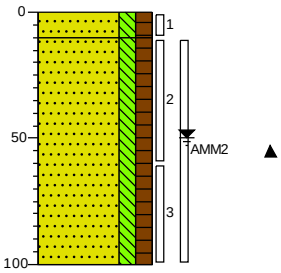

0 gras
10 Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruinzwart, Schep
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, sterk puinhoudend, donker bruinzwart, Schep
100

Meetpunt: 209


Datum: 15-12-2025
Boormeester: B.J. Hulsbosch



0 gras
Zand matig fijn, zwak siltig, matig grindig, resten baksteen, neutraal bruingrijs, Edelmanboor
50
Veen, neutraal bruinrood, Edelmanboor
150
Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
200

Meetpunt: 210

Datum: 15-12-2025
Boormeester: B.J. Hulsbosch
Lengte gat/sleuf: 0,30
Breedte gat/sleuf: 0,30

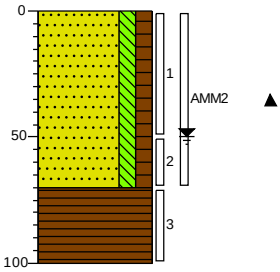


0 gras
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, matig puinhoudend, donker bruinzwart, Schep
70
Veen, neutraal bruinrood, Edelmanboor
100

Projectcode: IBL79034.15
Projectnaam: Park Molenveen Voorthuizen
Getekend volgens: NEN 5104

ingenieursbureau Land

Meetpunt: 211


Datum: 15-12-2025
Boormeester: B.J. Hulsbosch
Reden gestaakt: Obstakel puin
Lengte gat/sleuf: 0,30
Breedte gat/sleuf: 0,30



0 gras
10 Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, resten baksteen, resten glas, resten schelpen, donker bruinzwart, Schep
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, uiterst puinhoudend, matig schelphoudend, matig grindhoudend, donker zwartgrijs, Schep
70

Meetpunt: 301


Datum: 11-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug



0 grind
Zand matig fijn, matig siltig, uiterst grindig, neutraal beigebruin, Edelmanboor
20
Veen, matig zandig, donker zwartbruin, Edelmanboor
70
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal beigebruin, Edelmanboor
100
Veen, sterk zandig, donker zwartbruin, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, matig siltig, neutraal cremebeige, Zuigerboor
200

Meetpunt: 302


Datum: 11-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug



0 weiland
Veen, matig zandig, donker beigebruin, Edelmanboor
70
Veen, zwak zandig, donker zwartbruin, Edelmanboor
100

Meetpunt: 303

Datum: 11-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug




0 grind
Zand matig fijn, matig siltig, uiterst grindig, zwak lavalithhoudend, neutraal beigebruin, Edelmanboor
20
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
60
Veen, sterk zandig, donker zwartbruin, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, matig siltig, neutraal cremebeige, Edelmanboor
100

Projectcode: IBL79034.15
Projectnaam: Park Molenveen Voorthuizen
Getekend volgens: NEN 5104

ingenieursbureau Land

Meetpunt: 304


Datum: 11-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug

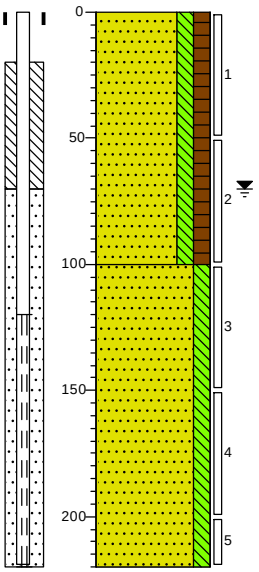

0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker zwartbruin, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, matig siltig, neutraal cremebeige, Zuigerboor
220

Meetpunt: 305


Datum: 11-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug



0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruinzwart, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, matig siltig, neutraal cremebeige, Edelmanboor
100

Meetpunt: 306


Datum: 11-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug



0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruinzwart, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, matig siltig, neutraal cremebeige, Edelmanboor
100

Meetpunt: 307


Datum: 11-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug



0 groenstrook
Zand zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruinzwart, Edelmanboor
80
Veen, matig zandig, donker bruinzwart, Edelmanboor
100

Meetpunt: 308


Datum: 11-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug



0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruinzwart, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, matig siltig, neutraal cremebeige, Edelmanboor
100

Meetpunt: 309

Datum: 11-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug




0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruinzwart, Edelmanboor
100

Projectcode: IBL79034.15
Projectnaam: Park Molenveen Voorthuizen
Getekend volgens: NEN 5104

ingenieursbureau Land

Meetpunt: 310


Datum: 11-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug



0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruinzwart, Edelmanboor
100

Meetpunt: 311


Datum: 11-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug



0 klinker
8
20 Zand matig fijn, zwak siltig, licht cremebeige, Edelmanboor, cunetzand
Zand zeer fijn, matig siltig, sterk humeus, donker beigebruin, Edelmanboor
50 Veen, matig zandig, donker bruinzwart, Edelmanboor
100

Meetpunt: 312


Datum: 11-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug



0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruinzwart, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, matig siltig, neutraal cremebeige, Zuigerboor
200

Meetpunt: 313


Datum: 11-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug



0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruinzwart, Edelmanboor
100

Meetpunt: 314


Datum: 11-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug



0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruinzwart, Edelmanboor
100

Meetpunt: 315

Datum: 11-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug



0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruinzwart, Edelmanboor
100

Projectcode: IBL79034.15
Projectnaam: Park Molenveen Voorthuizen
Getekend volgens: NEN 5104

ingenieursbureau Land

Meetpunt: 601

Datum: 12-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug

0 –

0 waterspiegel

Meetpunt: 602

Datum: 12-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug

0 –

0 waterspiegel

Meetpunt: A1.1

Datum: 12-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug

0 –

0 gras

Meetpunt: A1.2

Datum: 12-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug

0 –

0 gras

Meetpunt: A2

Datum: 12-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug

0 –

0 gras

Meetpunt: S1.1

Datum: 12-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug

0 –

0 gras

Meetpunt: S1.2

Datum: 12-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug

0 –

0 gras

Meetpunt: S2


Datum: 12-12-2025
Boormeester: W.H. Pflug

0 –

0 gras


Legenda (conform NEN 5104)

grind




Grind, siltig
Grind, zwak zandig
Grind, matig zandig
Grind, sterk zandig
Grind, uiterst zandig

zand




Zand, kleïig
Zand, zwak siltig
Zand, matig siltig
Zand, sterk siltig
Zand, uiterst siltig

veen




Veen, mineraalarm
Veen, zwak kleïig
Veen, sterk kleïig
Veen, zwak zandig
Veen, sterk zandig

peilbuis




blinde buis
casing
hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
zand afdichting
bentoniet/mikoliet/klei afdichting
grind afdichting
filter

klei




Klei, zwak siltig
Klei, matig siltig
Klei, sterk siltig
Klei, uiterst siltig
Klei, zwak zandig
Klei, matig zandig
Klei, sterk zandig

leem



Leem, zwak zandig
Leem, sterk zandig

overige toevoegingen



zwak humeus
matig humeus
sterk humeus
zwak grindig
matig grindig
sterk grindig

geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000

monsters


geroerd monster
ongeroerd monster
volumering

overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand



slib



water
