
Id	Taaknaam	Duur	Start	Eind
0	**Flexwoningen Oude Zwembad locatie**	**224,6 wkn**	**maa 3-6-24**	**din 17-4-29**
1	**Flexwoningen Oude Zwembad locatie**	**224,6 wkn**	**maa 3-6-24**	**din 17-4-29**
2	**Algemeen**	**220,6 wkn**	**vri 28-6-24**	**din 17-4-29**
3	Kapstok	215,2 wkn	woe 4-9-24	din 17-4-29
4	**Projectcontract**	**62 wkn**	**woe 4-9-24**	**din 6-1-26**
6	APO	0 wkn	din 6-1-26	din 6-1-26
7	**Fasedocument**	**4 wkn**	**woe 14-10-26**	**din 10-11-26**
8	Opstellen, toetsen, afstemmen	4 wkn	woe 14-10-26	din 10-11-26
9	APO	0 wkn	din 10-11-26	din 10-11-26
10	**Dechargedocument**	**5,8 wkn**	**don 8-3-29**	**din 17-4-29**
11	Opstellen, toetsen, afstemmen	4 wkn	don 8-3-29	woe 4-4-29
12	APO	0 wkn	din 17-4-29	din 17-4-29
13	Mijlpalen	214,8 wkn	vri 28-6-24	woe 7-3-29
14	**Mijlpalen**	**214,8 wkn**	**vri 28-6-24**	**woe 7-3-29**
16	Start Ontwerp- / Voorbereidingsfase	0 wkn	woe 6-5-26	woe 6-5-26
17	Start Realisatiefase	0 wkn	woe 30-6-27	woe 30-6-27
18	Eerste oplevering	0 wkn	woe 29-3-28	woe 29-3-28
19	Laatste oplevering	0 wkn	woe 23-8-28	woe 23-8-28
20	Start Nazorgfase	0 wkn	don 24-8-28	don 24-8-28
21	Afsluiting project	0 wkn	woe 7-3-29	woe 7-3-29
22	**Woningen en openbare ruimte**	**218,8 wkn**	**maa 3-6-24**	**woe 7-3-29**
23	Haalbaarheidsfase (Initiatieffase)	94,8 wkn	maa 3-6-24	woe 17-6-26
31	**Onderzoeken**	**62,8 wkn**	**maa 24-2-25**	**woe 17-6-26**
32	Welke onderzoeken zijn verder nodig voor planologische procedures?	0 wkn	maa 5-1-26	maa 5-1-26
35	Verkeer en veiligheid onderzoeken (uiterlijke datum)	11 wkn	don 2-4-26	woe 17-6-26
36	Geluidsonderzoek	11 wkn	maa 5-1-26	vri 20-3-26
43	**Projectvoorbereidingsbesluit + SPvE**	**36,2 wkn**	**don 15-5-25**	**don 5-3-26**
46	APO (17-12-25 stukken aanleveren)	0 wkn	din 6-1-26	din 6-1-26
47	Staf	0 wkn	maa 12-1-26	maa 12-1-26
48	B&W met briefje verdeling SFT subsidie	0 wkn	din 20-1-26	din 20-1-26
49	B&W met IOK	0 dagen	din 27-1-26	din 27-1-26
50	Presidium (8-2-26 stukken aanleveren)	0 dagen	don 12-2-26	don 12-2-26
51	**Raadsbesluit**	0 dagen	don 5-3-26	don 5-3-26
52	Kaderstellende fase (Definitiefase)	119,8 wkn	maa 2-9-24	woe 24-3-27
53	**Subsidies**	**89,8 wkn**	**maa 2-9-24**	**woe 15-7-26**
55	Stimuleringsregeling Flexwoningen aanvragen	15 wkn	don 2-4-26	woe 15-7-26
56	**Integraal Ontwerpvoorstel behelsd SO bebouwing én SO buitenruimtes (openbaar als**	**57,8 wkn**	**maa 6-1-25**	**woe 25-3-26**
60	SO toetsen	6 wkn	don 16-10-25	din 25-11-25
61	Eventueel tweede toetsing	6 wkn	woe 26-11-25	din 20-1-26
62	SO definitief	0 wkn	woe 11-3-26	woe 11-3-26
63	Vastklikken demarcatie	2 wkn	don 12-3-26	woe 25-3-26
64	**SSK raming**	**16 wkn**	**don 12-3-26**	**woe 1-7-26**
65	Opstellen SSK raming	8 wkn	don 12-3-26	woe 6-5-26
66	toetsen	8 wkn	don 7-5-26	woe 1-7-26
67	vastgesteld	0 wkn	woe 1-7-26	woe 1-7-26
68	**Voorlopig ontwerp bouw (VO Ymere)**	**8 wkn**	**don 12-3-26**	**woe 6-5-26**
69	VO opstellen	6 wkn	don 12-3-26	woe 22-4-26
70	VO toetsen	2 wkn	don 23-4-26	woe 6-5-26
71	VO definitief	0 wkn	woe 6-5-26	woe 6-5-26
72	**EO Aanbesteding VO buitenruimte**	**4 wkn**	**don 5-2-26**	**don 5-3-26**
73	Enkelvoudig Onderhandse aanbesteding ingenieursbureau	4 wkn	don 5-2-26	don 5-3-26
74	**Voorlopig ontwerp buitenruimte**	**48 wkn**	**don 12-3-26**	**woe 24-3-27**
75	VO Opstellen	8 wkn	don 12-3-26	woe 6-5-26
76	VO Toetsen	8 wkn	don 7-5-26	woe 1-7-26
77	Eventueel tweede toetsing	8 wkn	don 2-7-26	woe 23-9-26
78	Restpunten VO	6 mndn	don 24-9-26	woe 24-3-27
79	VO buiten ruimte Vastgesteld	0 wkn	woe 24-3-27	woe 24-3-27
80	**Projectuitvoeringsbesluit + GREX + SOK**	**39,2 wkn**	**don 19-2-26**	**don 17-12-26**
81	Samenwerkingsovereenkomst	29 wkn	don 19-2-26	woe 7-10-26
82	Grondexplotatie	10 wkn	don 2-7-26	woe 7-10-26
83	APO	0 wkn	din 10-11-26	din 10-11-26
84	Staf Wonen + Financiën	0 wkn	maa 16-11-26	maa 16-11-26
85	B&W	0 wkn	din 24-11-26	din 24-11-26
86	Presidium	0 wkn	don 3-12-26	don 3-12-26
87	Raadsessie	0 wkn	don 10-12-26	don 10-12-26
88	Raadsbesluit	0 wkn	don 17-12-26	don 17-12-26
89	Uitwerkingsfase (Ontwerpfase)	88 wkn	don 7-5-26	woe 5-4-28
90	**EO Aanbesteding DO buitenruimte**	**4 wkn**	**don 25-2-27**	**woe 24-3-27**
91	Enkelvoudig Onderhandse aanbesteding ingenieursbureau	4 wkn	don 25-2-27	woe 24-3-27
92	**Definitief ontwerp buitenruimte**	**48 wkn**	**don 25-3-27**	**woe 5-4-28**
93	DO Opstellen	6 wkn	don 25-3-27	woe 5-5-27
94	DO Toetsen ronde 1	8 wkn	don 6-5-27	woe 30-6-27
95	Opmerkingen verwerken	2 wkn	don 1-7-27	woe 14-7-27
96	DO Toetsen ronde 2	8 wkn	don 15-7-27	woe 6-10-27
97	Restpunten	6 mndn	don 7-10-27	woe 5-4-28
98	DO buiten ruimte Vastgesteld	0 wkn	woe 5-4-28	woe 5-4-28
99	**Definitief ontwerp (DO Ymere)**	**10 wkn**	**don 7-5-26**	**woe 15-7-26**
100	DO opstellen	7 wkn	don 7-5-26	woe 24-6-26
101	DO toetsen 1e ronde	2 wkn	don 25-6-26	woe 8-7-26
102	DO definitief	0 wkn	woe 8-7-26	woe 8-7-26
103	IR besluit (Ymere)	1 wk	don 9-7-26	woe 15-7-26
104	Overeenkomsten	147 wkn	vri 31-1-25	woe 29-3-28
105	**Intentieovereenkomst (mee met projectvoorbereidingsbesluit)**	**49 wkn**	**vri 31-1-25**	**woe 18-2-26**
106	Afstemmen/opstellen/aanpassen	49 wkn	vri 31-1-25	woe 18-2-26



B.J.

Id	Taaknaam	Duur	Start	Eind
107	**Samenwerkingsovereenkomst (mee met projectuitvoeringsbesluit)**	**29 wkn**	**don 19-2-26**	**woe 7-10-26**
108	Afstemmen/opstellen/aanpassen	29 wkn	don 19-2-26	woe 7-10-26
109	**Opstalovereenkomst**	**17,8 wkn**	**din 5-1-27**	**zat 8-5-27**
110	Afstemmen/opstellen/aanpassen	10 wkn	din 5-1-27	din 16-3-27
111	APO	0 wkn	din 23-3-27	din 23-3-27
112	Staf	0 wkn	maa 29-3-27	maa 29-3-27
113	B&W (voor zomerreces)	0 wkn	din 6-4-27	din 6-4-27
114	Levering grond	0 vwkn	zat 8-5-27	zat 8-5-27
115	**Eerste huurovereenkomst**	**0 wkn**	**woe 29-3-28**	**woe 29-3-28**
116	Eerste huurovereenkomst bewoner	0 wkn	woe 29-3-28	woe 29-3-28
117	Procedures en vergunningen	41,2 wkn	don 11-6-26	don 6-5-27
118	**Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA) planologisch**	**30 wkn**	**woe 17-6-26**	**woe 24-2-27**
119	Voorbereidende fase (vooroverleg en participa	16 vwkn	woe 17-6-26	woe 7-10-26
120	Aanvraag indienen via het DSO (Na sluiten SOK/AOK)	0 wkn	woe 7-10-26	woe 7-10-26
121	Bevoegd gezag beslist binnen 8w na een aanvr	8 wkn	don 8-10-26	woe 2-12-26
122	Verlenging	6 wkn	don 3-12-26	woe 27-1-27
123	Besluit	0 wkn	woe 27-1-27	woe 27-1-27
124	Bekendmaking	1 dag	don 4-2-27	don 4-2-27
125	Inwerkingtreding (excl beroep)	0 wkn	woe 24-2-27	woe 24-2-27
126	**LIB VVGB**	**31 wkn**	**don 11-6-26**	**woe 24-2-27**
127	Voorbereiding LIB	16 vwkn	don 11-6-26	don 1-10-26
128	Voorgesprek ILT	1 wk	don 1-10-26	woe 7-10-26
129	Aanvraag VVGB	0 dagen	woe 7-10-26	woe 7-10-26
130	Beoordeling VVGB (evt. tot 13 weken verlengin	13 wkn	don 8-10-26	woe 20-1-27
131	Afgifte VVGB	0 wkn	woe 24-2-27	woe 24-2-27
132	**Bouwvergunning (Na bouw DO en tweede toesting VO buitenruimte)**	**18 wkn**	**don 17-12-26**	**don 6-5-27**
133	Aanvraag Omgevingsvergunning	0 wkn	don 17-12-26	don 17-12-26
134	Bevoegd gezag beslist binnen 8 w na een aanvr	8 wkn	vri 18-12-26	don 25-2-27
135	Verlenging	6 wkn	vri 26-2-27	don 8-4-27
136	Besluit	0 wkn	don 8-4-27	don 8-4-27
137	Bekendmaking	1 dag	vri 16-4-27	vri 16-4-27
138	Omgevingsvergunning onherroepelijk	0 wkn	don 6-5-27	don 6-5-27
139	**Watervergunning**	**8 wkn**	**don 17-12-26**	**don 25-2-27**
140	Indienen aanvraag watervergunning	0 wkn	don 17-12-26	don 17-12-26
141	Volledige beoordeling en toetsing	8 wkn	vri 18-12-26	don 25-2-27
142	Afgifte watervergunning	0 wkn	don 25-2-27	don 25-2-27
143	Watervergunning onherroepelijk	0 wkn	don 25-2-27	don 25-2-27
144	**Kapvergunning (op basis van VO OR)**	**14 wkn**	**woe 1-7-26**	**woe 4-11-26**
145	Indienen aanvraag kapvergunning	0 wkn	woe 1-7-26	woe 1-7-26
146	Volledige beoordeling en toetsing	8 wkn	don 2-7-26	woe 23-9-26
147	Afgifte kapvergunning	6 wkn	don 24-9-26	woe 4-11-26
148	Kapvergunning onherroepelijk	0 wkn	woe 4-11-26	woe 4-11-26
149	Uitwerkingsfase (Voorbereidingsfase)	184,8 wkn	maa 3-6-24	woe 31-5-28
150	**Nuts**	**88,2 wkn**	**don 7-5-26**	**don 6-4-28**
151	Wenstracé(DTA)	18 wkn	don 7-5-26	woe 7-10-26
152	Procedure BR en WR (parallel aan VO)	8 wkn	don 7-5-26	woe 1-7-26
153	Netcheck aanvragen	2 wkn	don 2-7-26	woe 15-7-26
154	DTA akkoord	1 dag	don 8-10-26	don 8-10-26
155	Voorbereiding DTA	26 wkn	vri 9-10-26	don 22-4-27
156	Trafo bestellen	30 wkn	don 16-7-26	woe 24-3-27
157	Realisatie tracé-akkoord	6 wkn	vri 23-4-27	don 3-6-27
158	Huisaansluitingen aanvraag	30 wkn	vri 4-6-27	don 10-2-28
159	Huisaansluiting + woonrijp maken	8 wkn	vri 11-2-28	don 6-4-28
160	**Kabels en leidingen**	**112,8 wkn**	**maa 3-6-24**	**don 19-11-26**
162	Onderzoek (KLIC Melding) Kabels en leidingen)	12 wkn	don 20-8-26	don 12-11-26
163	Verplaatsen kabels en leidingen (6 maanden voor bouwrijpmaken)	1 wk	don 12-11-26	don 19-11-26
164	**Bestek en tekeningen Bouwrijp maken**	**6 wkn**	**don 11-2-27**	**woe 24-3-27**
165	Bestek en tekeningen Bouwrijp maken	6 wkn	don 11-2-27	woe 24-3-27
166	**MO Aanbesteding Bouwrijp maken**	**8 wkn**	**don 25-3-27**	**woe 19-5-27**
167	EO Aanbesteding Bouwrijp maken	6 wkn	don 25-3-27	woe 5-5-27
168	Voorbereiding	2 wkn	don 6-5-27	woe 19-5-27
169	**Bestek en tekeningen Woonrijp maken**	**6 wkn**	**don 24-2-28**	**woe 5-4-28**
170	Bestek en tekeningen Woonrijp maken	6 wkn	don 24-2-28	woe 5-4-28
171	**MO Aanbesteding Woonrijp maken**	**8 wkn**	**don 6-4-28**	**woe 31-5-28**
172	EO Aanbesteding Woonrijp maken	6 wkn	don 6-4-28	woe 17-5-28
173	Voorbereiding	2 wkn	don 18-5-28	woe 31-5-28
174	Uitwerkingsfase (Realisatiefase)	82 wkn	don 5-11-26	woe 23-8-28
175	**Bouwvoorbereiding**	**32 wkn**	**don 5-11-26**	**woe 30-6-27**
176	Bouwvoorbereiding leverancier woningen (aanbieding BA + besteltijd modules)	15 wkn	don 14-1-27	don 29-4-27
177	Prefab woningen bouwen	9 wkn	don 29-4-27	woe 30-6-27
178	Bouwrijp maken	6 wkn	don 20-5-27	woe 30-6-27
179	Bomenkap (incl. onderhands aanbesteden) (in kapseizoen: november t/m maart)	8 wkn	don 5-11-26	woe 13-1-27
180	**Realisatie**	**50 wkn**	**woe 30-6-27**	**woe 23-8-28**
181	Fundering	5 vwkn	woe 30-6-27	woe 4-8-27
182	Bouwplaatsinrichting en grondwerk	2 vwkn	woe 4-8-27	woe 18-8-27
183	Kabels en leidingen	6 wkn	don 19-8-27	woe 29-9-27
184	Stapelen modules, kernen, dakmodules en gale	14 vwkn	woe 29-9-27	woe 5-1-28
185	Afbouw binnen vanaf laatste module geplaatst	6 vwkn	woe 5-1-28	woe 16-2-28
186	Opleveren woningen (vooroplevering + opleverpunten + def. Oplevering)	6 vwkn	woe 16-2-28	woe 29-3-28
187	Woonrijp maken	8 wkn	don 1-6-28	woe 23-8-28
188	Oplevering openbare ruimte	0 wkn	woe 23-8-28	woe 23-8-28
189	Uitwerkingsfase (Nazorgfase)	26 wkn	don 24-8-28	woe 7-3-29
190	**Overdracht**	**26 wkn**	**don 24-8-28**	**woe 7-3-29**
191	Overdracht	26 wkn	don 24-8-28	woe 7-3-29

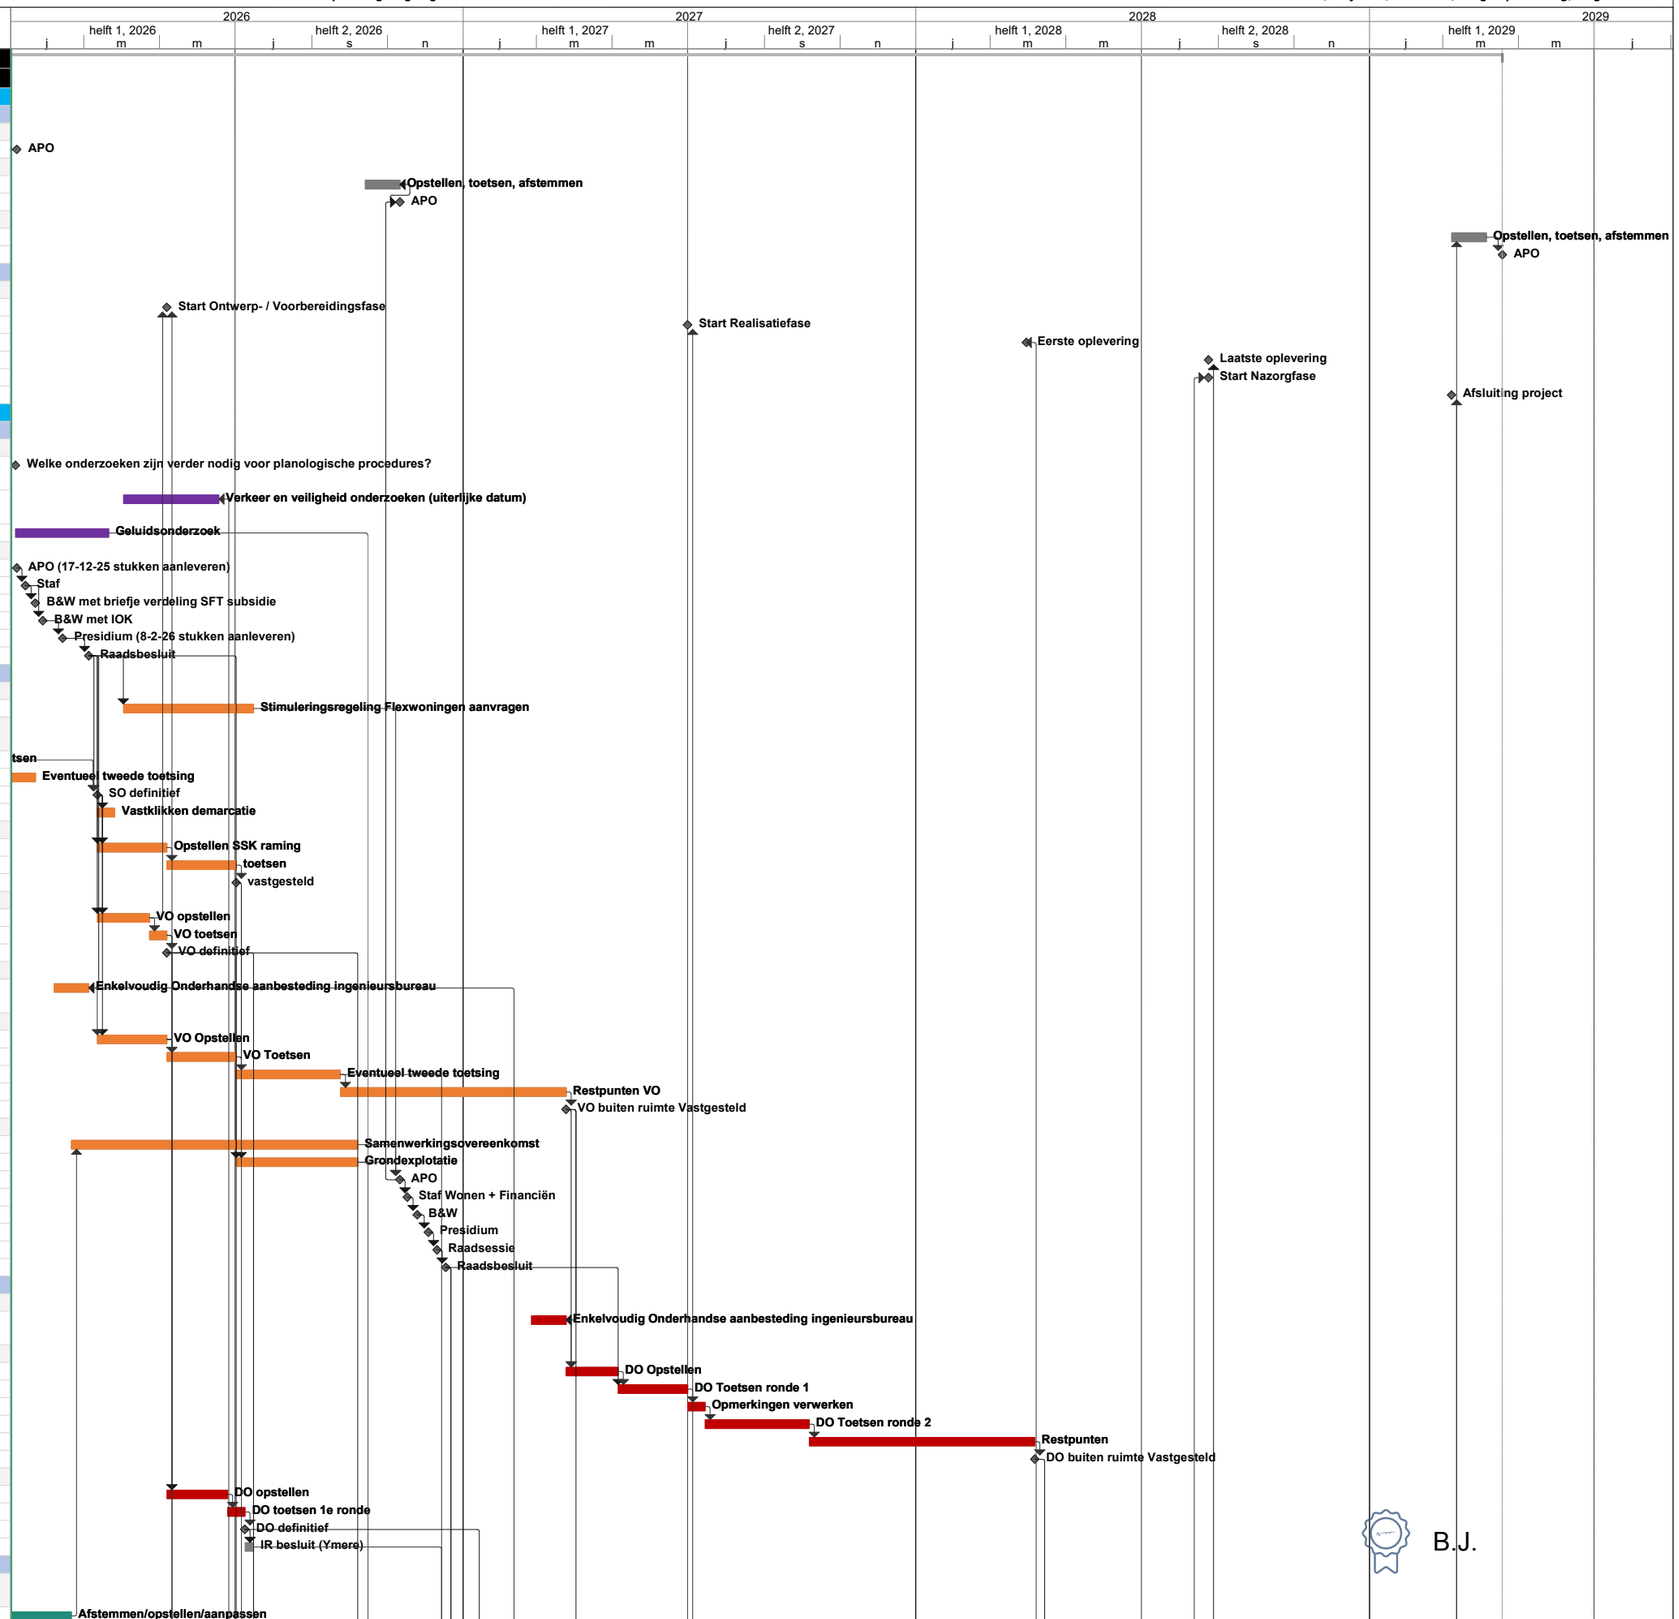
