

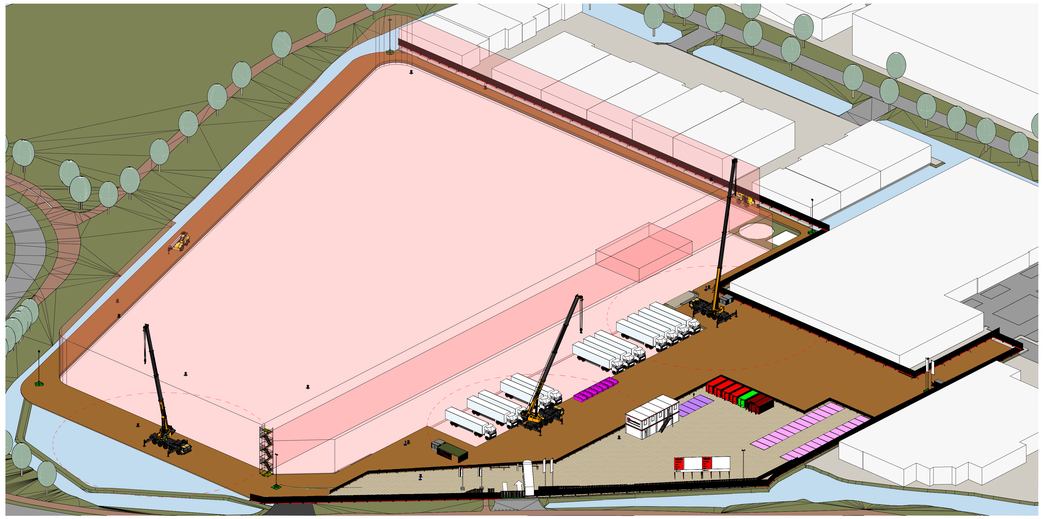



3D Bouwplaats

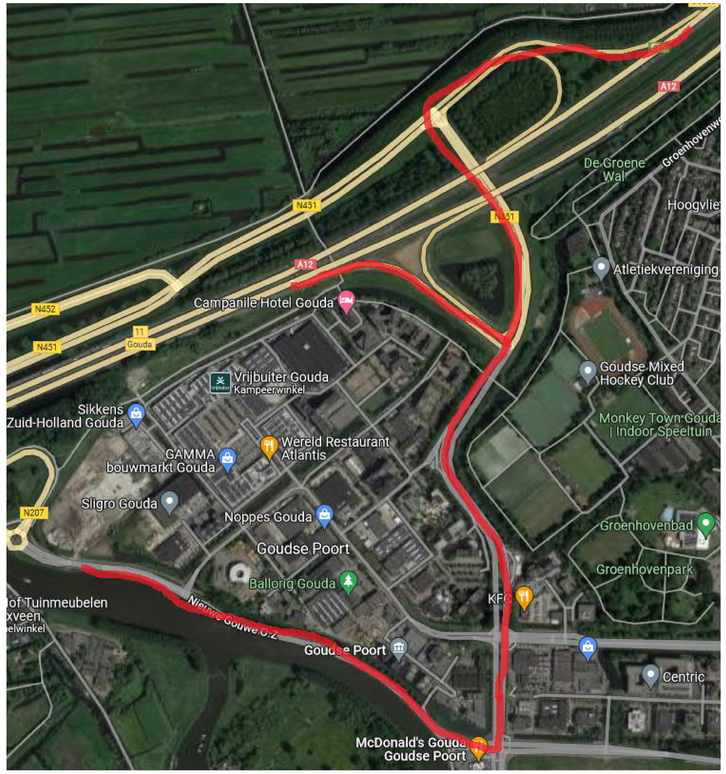

Aanrijdroute

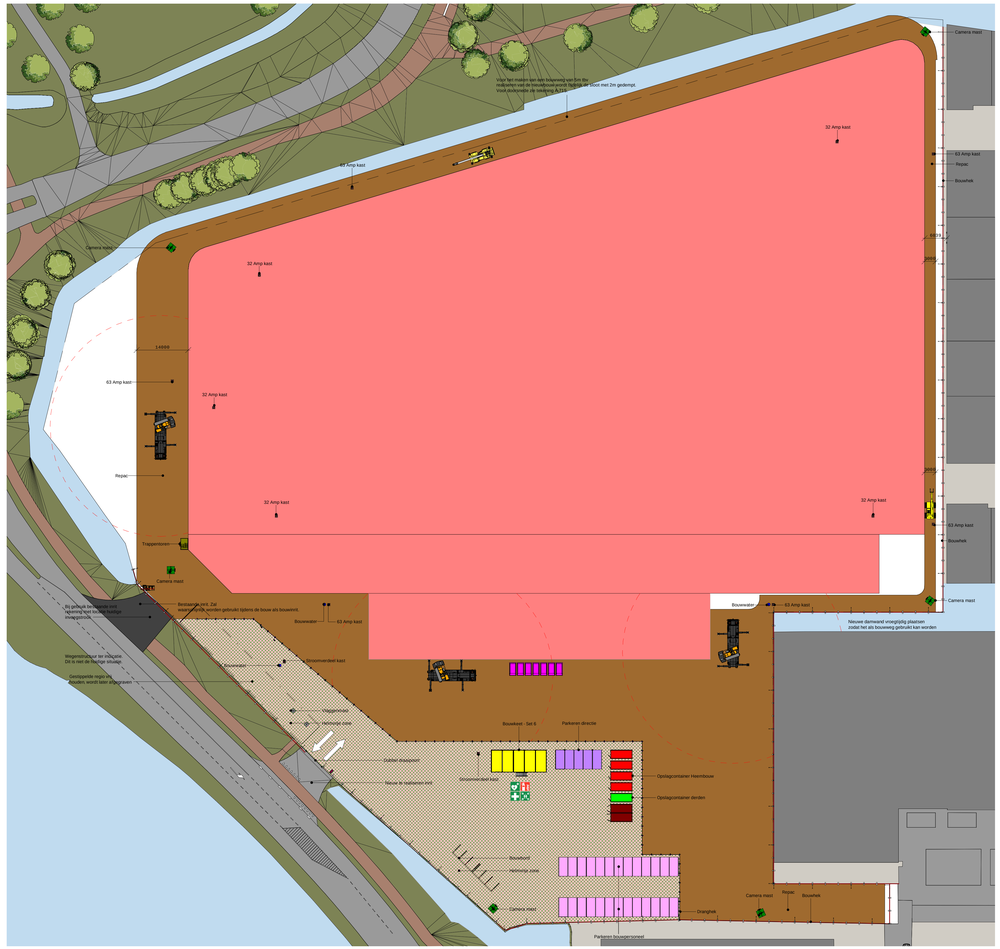

Bouwplaats

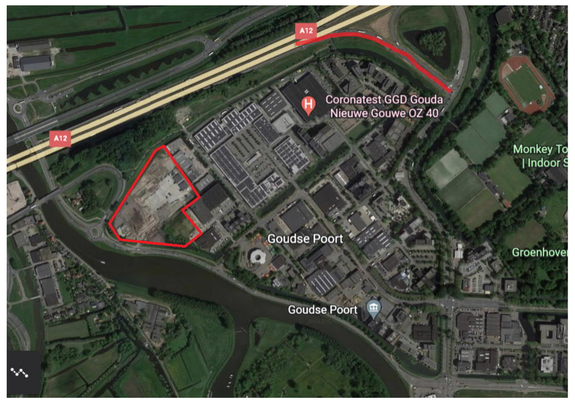

Locatie kavel

Renvooi

Werkzaamheden

Nuts
- Kabels ingraven richting Trafo's

Bouwplaats:
- Vrachtwagens t.b.v. aan en afvoer keten en containers.
- Vrachtwagens t.b.v. aan en afvoer materieel.
- Vrachtwagens t.b.v. aan en afvoer containers t.b.v. puin / bouw en sloopafval.
- Bouwplaats afzetten dmv hekken

Grondwerk:
- Rijweg gradmachine en vrachtwagens.
- Bronbemale kabels (klick melding).
- Bouwrijp maken kavel.

Straatwerk:
- Rijweg beschermen waar nodig.

Hijswerk:
- Vrachtwagens t.b.v. aan en afvoer heistelling.
- Vrachtwagens t.b.v. aan en afvoer heipalen.

Betonwerk in het werk te storten:
- Vrachtwagens t.b.v. aan en afvoer bekisting en wapeningsstaat.
- Betonpomp, kraan en betonmixerwagens t.b.v. storten vloer / fundering.

Prefab beton:
- Vrachtwagens t.b.v. aanvoer prefab betonplint.
- Kraan t.b.v. montage prefab betonplint.

Staalconstructie:
- Vrachtwagens t.b.v. aanvoer staalconstructie.
- Kraan t.b.v. montage staalconstructie.

Prefab beton vloeren:
- Vrachtwagens t.b.v. aanvoer vloeren (kanaalplaten).
- Kraan t.b.v. montage vloeren (kanaalplaten).

Hoogwerker:
- Vrachtwagens t.b.v. aan- en afvoer hoogwerker.

Gevelbekleding:
- Vrachtwagens t.b.v. aanvoer dak- en gevelbekleding.
- Vrachtwagens t.b.v. aanvoer isolatie.
- Vrachtwagens t.b.v. aanvoer kozijnen.
- Vrachtwagens t.b.v. aanvoer hang- en randbeveiliging.
- Kraan of vermiker t.b.v. vertoual transport.
- Kraan voor het leggen van dak- en plaatsten gevelbekleding.

Dakbedekking:
- Vrachtwagens t.b.v. aanvoer dakisolatie en dakbedekking.
- Kraan of vermiker t.b.v. vertoual transport.

Dekvloeren:
- Vrachtwagens met pomp t.b.v. aanvoer en storten dekvloeren.

Gipswanden, plafonds, binnendeuren en kozijnen:
- Vrachtwagens t.b.v. aanvoer van systeemwanden en plafonds.
- Vrachtwagens t.b.v. aanvoer binnenkozijnen.
- Vrachtwagens t.b.v. aanvoer binnendeuren.
- Hoogwerker en rolsteiger t.b.v. montage.

Straatwerk:
- Vrachtwagens t.b.v. aanvoer bestrating.
- Materieel t.b.v. aanhengen bestrating.

Bouwplaatsonderdelen

- Gebouw
- Camera positie
- Keterpark
- Lichtmast
- Opslag container Heembouw
- Licht- en cameramast (Combi)
- Opslag container derden
- IN / UIT checken
- Milieustraat
- Trappentoren
- Parkeren directie
- Opslag materialen
- Parkeren bouwpersoneel
- Zaagloods
- Bouwwater
- Verzamelplaats
- Stroomverdeelkast
- Helmvrije zone
- Bouwmeterkast
- Verzamelplaats calamiteiten
- Locatie E.H.B.O. spullen
- Locatie AED
- Locatie brandblusser

Projectgegevens

Omschrijving project:	Logistic Centre 1220 - Gouda
Adres:	Nieuwe Gouwe O.Z. 40
Postcode:	2803 RA

Heembouw Architecten | Wij creëren plekken waar mensen willen zijn

Project: Ligistics Centre 1220 - Gouda

Onderdeel: Bouwveiligheidsplan

Contactpersoon: C. Schoenmakers

QR code:

Datum: 27-07-2022
Schaal:
Formaat: A0+
Fase: Omgevingsvergunning
Tekeningnummer: A-750

www.heembouw.nl
