Deze factsheet wordt elk kwartaal uitgegeven en geeft een rapportage van het project gemeentehuis uitgezet in product, geld en tijd.

gemeente Rheden

Factsheet project gemeentehuis Q2 2024

Product



Gemeentehuis


Tijdens de dag van de bouw op 8 juni stelde bouwend aannemer Van Wijnen de bouwplaats in De Steeg open voor geïnteresseerden. De interesse was groot met 324 bezoekers waarbij men tijdens de rondleiding het werk in uitvoering gedeeltelijk kon aanschouwen. Dit werd door de bezoekers gewaardeerd.

Terrein

Lokaal ondernemerschap hebben we hoog in het vaandel staan. Voor de realisatie van het terreinontwerp hebben we hier al op ingezet. Met de nieuwe opdracht voor het ontwerp van de fietsenstalling zijn lokale partijen benaderd en hopen we zo het lokale ondernemerschap een stimulans te geven.

Budget



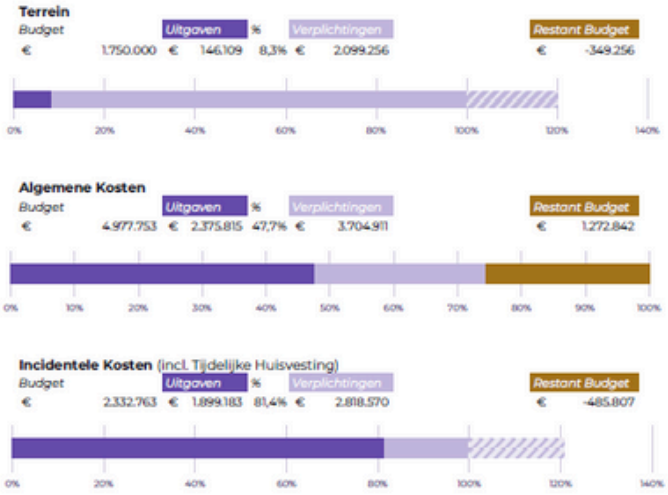

Planning

De vele regen van afgelopen periode zorgt voor uitdagingen op de planning. Daarom is er een gewijzigde afbouwplanning gemaakt om de achterstand in te lopen. Ook de wateraansluiting verloopt moeizaam waardoor de huidige planning na de opleverdatum is. We zetten ons in om de aansluitdatum naar voren te halen.

