# Herinrichting Groote Vink *(kruispunt Haagweg - Leidseweg, Ontsluiting Intratuin-locatie en aanleg Velostrada)*

*Start DO na vaststellen SOK in B en W Leiden én Voorschoten*

| Id | Taaknaam | Begindatum | Duur | Einddatum |
|---|---|---|---|---|
| 142 | **Voorbereidingsfase** | **woe 14-6-23** | **185 wkn** | **din 29-12-26** |
| 143 | **Civieltechnische onderzoeken** | **woe 20-12-23** | **13 wkn** | **din 19-3-24** |
| 144 | Asfaltadvies / verhardingsonderzoek | woe 21-2-24 | 4 wkn | din 19-3-24 |
| 145 | Grondonderzoek | woe 20-12-23 | 13 wkn | din 19-3-24 |
| 146 | **Kabels & Leidingen** | **woe 14-6-23** | **118 wkn** | **din 16-9-25** |
| 147 | Vooroverleg netbeheerder | woe 14-6-23 | 43 wkn | din 9-4-24 |
| 148 | Voorbereiding SI (versturen brieven tot intrekken vergunning, verzoek tot aanpassingen, reactie netbeheerder, maken ramingen en tekeningen door netbeheerder) | woe 17-4-24 | 8 wkn | din 11-6-24 |
| 149 | Voorbereiding netbeheerder (aanvragen vergunningen, mogelijke aanbesteding door netbeheerder, inkoop materialen) | woe 12-6-24 | 14 wkn | din 17-9-24 |
| 150 | Voorbereiding niet-telecom beheerder (gas, water, stroom) | woe 12-6-24 | 14 wkn | din 17-9-24 |
| 151 | Verleggen K&L | woe 18-9-24 | 52 wkn | din 16-9-25 |
| 152 | **Hogere waarde besluit - rotonde i.r.t. Leidseweg 559 en definitieve ontsluiting Het Fortuyn** | **din 16-4-24** | **30,2 wkn** | **woe 13-11-24** |
| 153 | Aanvraag besluit HW (indien van toepassing) | din 16-4-24 | 0 wkn | din 16-4-24 |
| 154 | Opstellen ontwerp besluit | woe 17-4-24 | 8 wkn | din 11-6-24 |
| 155 | ev. Verlenging | woe 12-6-24 | 6 wkn | din 23-7-24 |
| 156 | Vrijgave ontwerp besluit | woe 12-6-24 | 1,6 wkn | vri 21-6-24 |
| 157 | Ter visie legging | maa 24-6-24 | 6 wkn | vri 2-8-24 |
| 158 | Verwerken zienswijzen en opstellen zienswijzenrapport (2w bij geen zienswijzen) | maa 5-8-24 | 6 wkn | vri 13-9-24 |
| 159 | Vrijgave definitief besluit HW | maa 16-9-24 | 1,6 wkn | woe 25-9-24 |
| 160 | Beroep volgens Awb | don 26-9-24 | 6 wkn | woe 6-11-24 |
| 161 | Wachttijd | don 7-11-24 | 1 wk | woe 13-11-24 |
| 162 | Besluit onherroepelijk bij geen beroep | woe 13-11-24 | 0 wkn | woe 13-11-24 |
| 163 | **Watervergunning - watercompensatie en duiker definitieve ontsluiting Het Fortuyn** | **woe 17-4-24** | **141 wkn** | **din 29-12-26** |
| 164 | Procedure watervergunning (incl. ter inzagelegging) | woe 17-4-24 | 26 wkn | din 15-10-24 |
| 165 | Wettelijke uitloop | woe 16-10-24 | 6 wkn | din 26-11-24 |
| 166 | Afgifte watervergunning en publicatie | din 26-11-24 | 0 wkn | din 26-11-24 |
| 167 | Awb beroepstermijn | woe 27-11-24 | 6 wkn | din 7-1-25 |
| 168 | Wachtperiode | woe 8-1-25 | 1 wk | din 14-1-25 |
| 169 | Vergunning onherroepelijk bij geen bezwaar | din 14-1-25 | 0 wkn | din 14-1-25 |
| 170 | ev. Procedure Bezwarencommissie | woe 15-1-25 | 24 wkn | din 1-7-25 |
| 171 | ev. Bodemprocedure | woe 2-7-25 | 78 wkn | din 29-12-26 |
| 172 | Vergunning onherroepelijk | din 29-12-26 | 0 wkn | din 29-12-26 |
| 173 | **Bestekken etc.** | **woe 17-4-24** | **38,61 wkn** | **maa 13-1-25** |
| 174 | Bestekken (onder voorbehoud aanbestedingsstrategie) | maa 21-10-24 | 12 wkn | maa 13-1-25 |
| 175 | PvA archeologie (indien van toepassing) | woe 17-4-24 | 12 wkn | din 9-7-24 |
| 176 | Maatregelen Wet natuurbescherming (indien van toepassing) | woe 17-4-24 | 12 wkn | din 9-7-24 |
| 177 | Saneringsplan (indien van toepassing) | woe 17-4-24 | 12 wkn | din 9-7-24 |
| 178 | **Aanbesteding (nationaal openbaar)** | **maa 13-1-25** | **23,79 wkn** | **don 26-6-25** |
| 179 | Opstellen aanbestedingsdocumenten | maa 13-1-25 | 13 wkn | maa 14-4-25 |
| 180 | Start aanbesteding | maa 14-4-25 | 0 wkn | maa 14-4-25 |
| 181 | Indienen vragen | maa 14-4-25 | 2 wkn | maa 28-4-25 |
| 182 | Versturen Nota van Inlichtingen (6 dagen voor sluiting inschrijving) | maa 28-4-25 | 1 wk | maa 5-5-25 |
| 183 | Indienen Inschrijving (27 dagen open) | maa 14-4-25 | 27 vdagen | zon 11-5-25 |
| 184 | Beoordelen Inschrijvingen | maa 12-5-25 | 3 wkn | vri 30-5-25 |
| 185 | Opstellen brieven voorlopige gunning | maa 2-6-25 | 1 wk | vri 6-6-25 |
| 186 | Versturen voornemen tot gunning | vri 6-6-25 | 0 wkn | vri 6-6-25 |
| 187 | Bezwaartermijn (20 dagen) | vri 6-6-25 | 20 vdagen | don 26-6-25 |
| 188 | Versturen definitieve gunning (na uitvoeringsbesluit) | don 26-6-25 | 0 wkn | don 26-6-25 |
| 189 | **Verkeersbesluit rotonde en ontsluiting Het Fortuyn** | **woe 17-4-24** | **16 wkn** | **din 6-8-24** |
| 190 | Verkeersbesluit | woe 17-4-24 | 10 wkn | din 25-6-24 |
| 191 | Awb beroepstermijn | woe 26-6-24 | 6 wkn | din 6-8-24 |

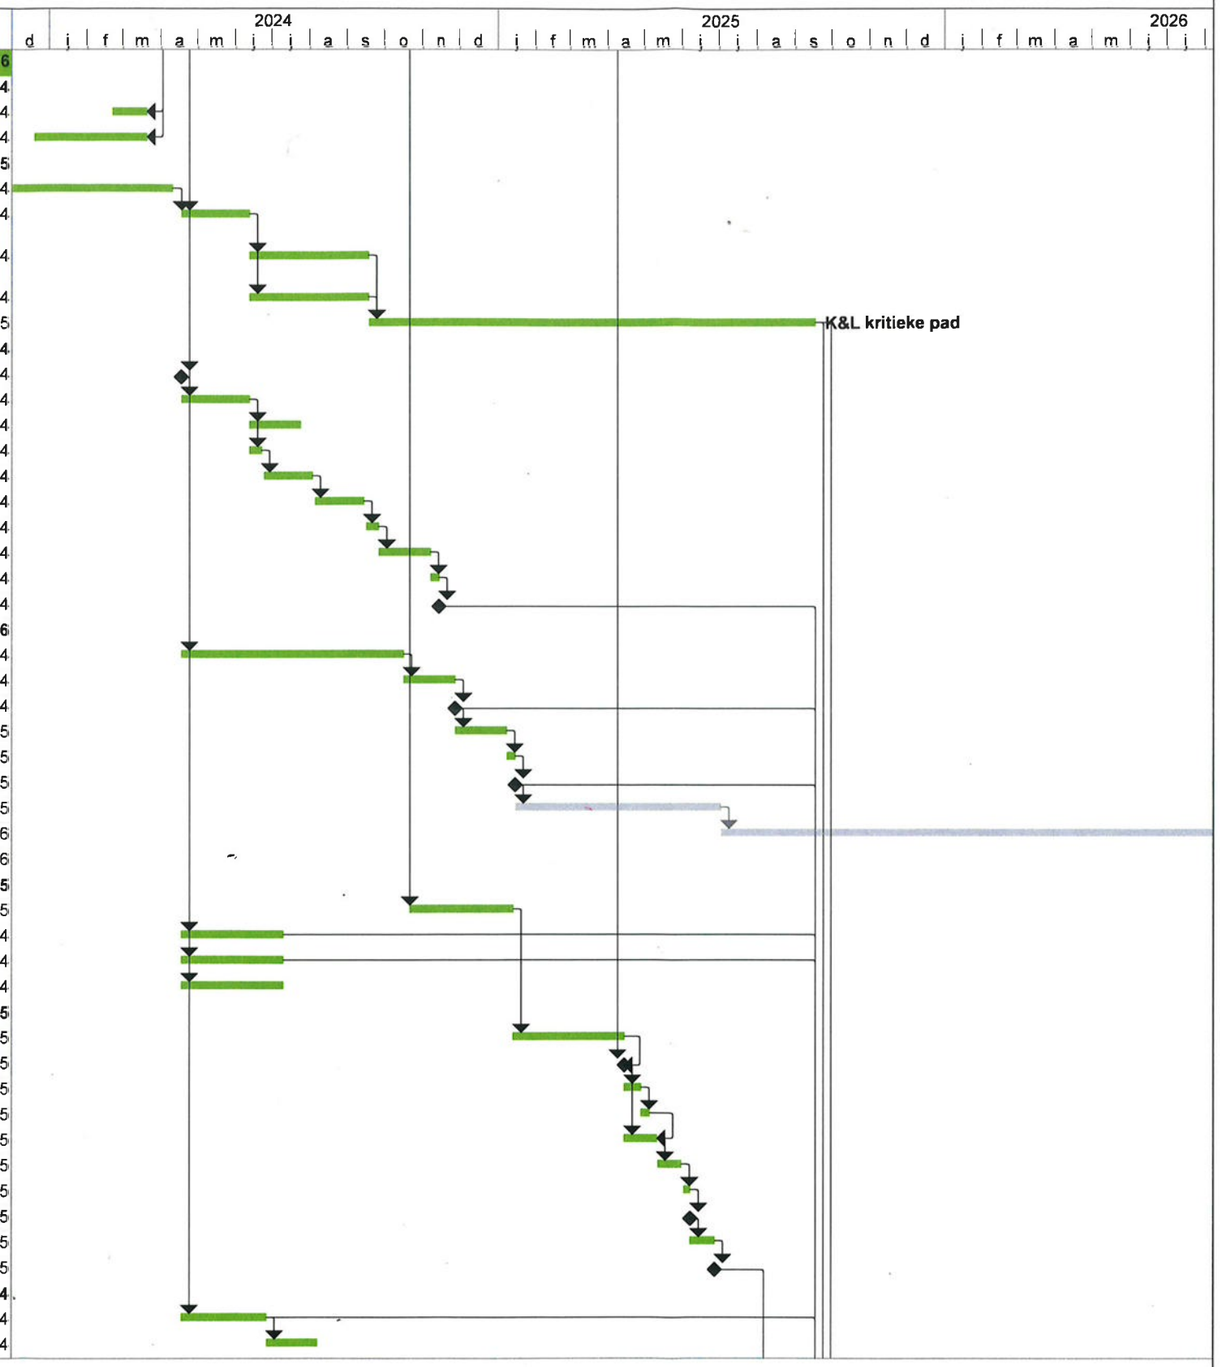


Projectfases: initiatief — definitie — ontwerp — voorbereiding — realisatie — beheer



AN 46
