Ontwikkeling Zuidwand Gemeente Boekel

Planning op hoofdlijnen

Id	WBS	Taaknaam	Duur	Start	EInd	Voorgangers	Opvolgers
1	**1**	**BESLUITVORMING**	**49 w**	**5/02/18**	**1/01/19**		
2	1.1	Go-no go besluit door Gemeenteraad	2 w	6/02/18	9/02/18		26,6,12,13,1
3	1.2	Besluit verkoop door Gemeenteraad	3 w	5/12/18	4/01/19	12,13,14	15
4							
5	**2**	**BESTEMMINGSPLAN/VERGUNNINGEN/ONTEI**	**202 w**	**)/02/18**	**3/01/22**		
6	2.1	Aanvullende onderzoeken	21 w	0/02/18	5/07/18	2	
7	2.2	Keuze 1 of 2 bestemmingsplan(nen)	2 w	5/12/18	7/01/19	12	8
8	2.3	Opstellen Bestemmingsplan(nen)	52 w	8/01/19	5/01/20	7	9,10
9	2.4	Vergunningen	12 w	7/01/20	0/03/20	8	19
10	2.5	Eventuele onteigening	104 w	7/01/20	3/01/22	8	
11	**3**	**ZUIDWAND**	**246 w**	**)/02/18**	**7/11/22**		
12	3.1	Uitwerken SO naar VO naar DO	44 w	0/02/18	4/12/18	2	3,7
13	3.2	Verwerving panden en grond	44 w	0/02/18	4/12/18	2	3
14	3.3	Opstellen concept Koopovereenkomst	44 w	0/02/18	4/12/18	2	3
15	3.4	Sluiten Koopovereenkomst	1 w	5/01/19	1/01/19	3	16,17
16	3.5	Voorbereiding projectontwikkelaar	60 w	2/01/19	5/03/20	15	20
17	3.6	Voorbereiding gemeente	50 w	2/01/19	5/01/20	15	19
18	3.7	Functievrij maken t.b.v. fase 1	4 w	3/03/20	0/03/20		19
19	3.8	Uitvoering fase 1 - Sloop en bouwrijp maken	13 w	1/03/20	9/06/20	18,17,9,28	20
20	3.9	Uitvoering fase 1 - Bouw winkels en woninge	52 w	0/06/20	8/06/21	19,16	21
21	3.10	Inhuizen fase 1	2 w	9/06/21	2/07/21	20	22
22	3.11	Functievrij maken t.b.v. fase 2	4 w	3/07/21	9/08/21	21	23
23	3.12	Uitvoering fase 2 - Sloop en bouwrijp maken	13 w	0/08/21	8/11/21	22	24
24	3.13	Uitvoering fase 2 - Bouw winkels en woninge	52 w	9/11/21	7/11/22	23	34GE
25	**4**	**PLEIN**	**246 w**	**)/02/18**	**7/11/22**		
26	4.1	Contracteren adviseur(s)	6 w	0/02/18	2/04/18	2	29,27
27	4.2	Voorbereiden tijdelijke inrichting t.b.v. bouw	39 w	7/01/19	4/10/19	26	28
28	4.3	Uitvoeren tijdelijke inrichting	20 w	7/10/19	1/02/20	27	19
29	4.4	Initiatieffase - functies en scenario's	12 w	1/01/20	4/03/20	26	30GE+2 w
30	4.5	Definitiefase - opstellen PvE	12 w	5/01/20	7/04/20	29GE+2 w	31
31	4.6	Ontwerpfase - SO/VO/DO	30 w	8/04/20	3/11/20	30	32
32	4.7	Bestek en tekeningen	13 w	4/11/20	2/02/21	31	33
33	4.8	Contractering aannemer	13 w	3/02/21	4/05/21	32	34
34	4.9	Uitvoering	26 w	0/05/22	7/11/22	33,24GE	

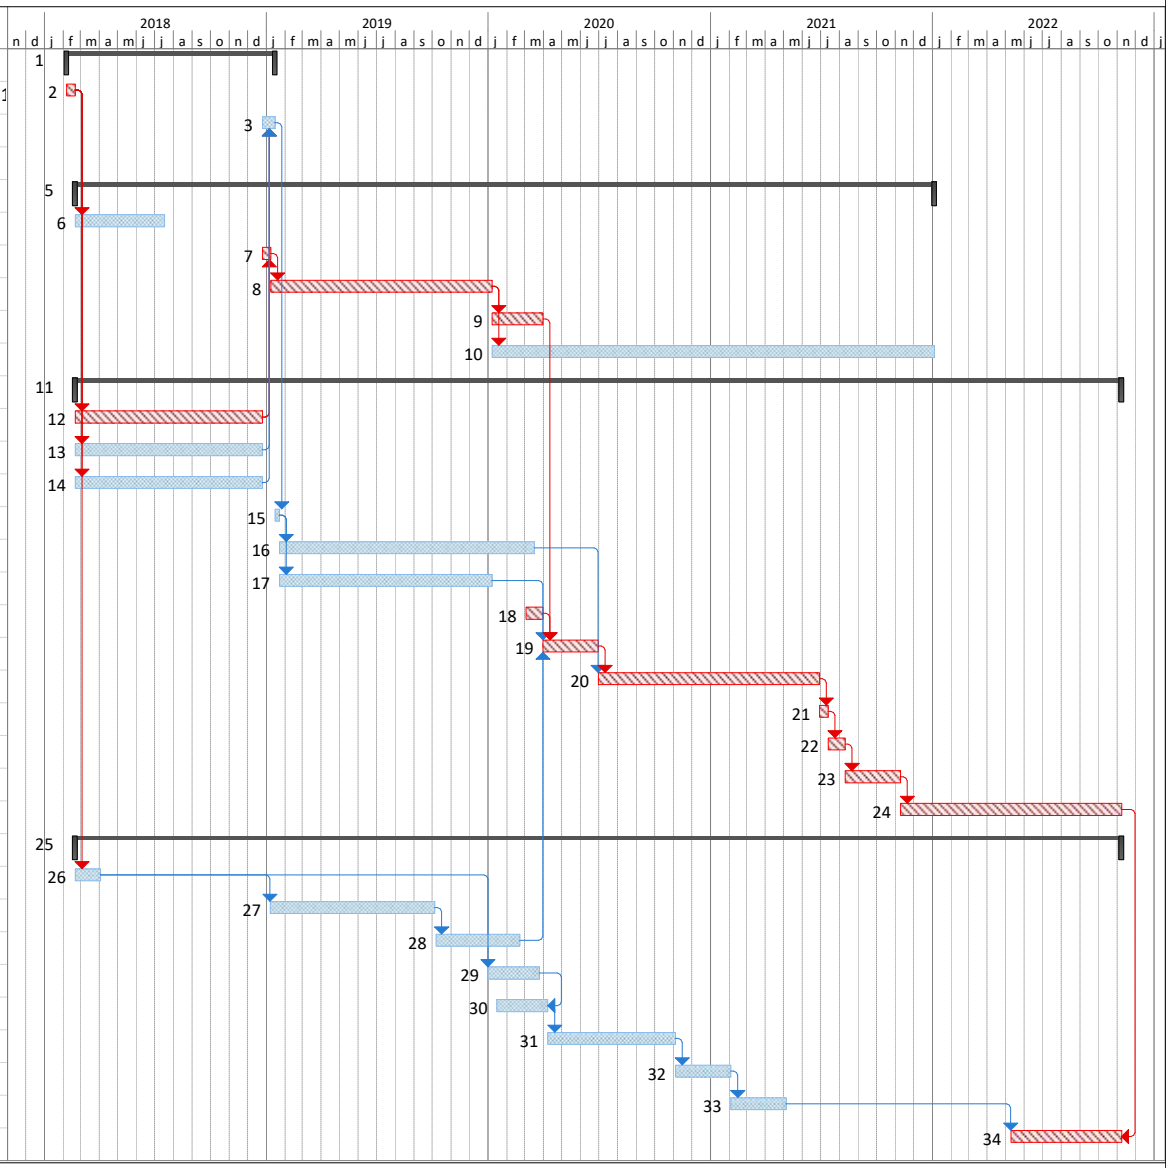

Taak | Kritieke taak | Mijlpaal | Samenvatting
