Kruising van de Mondeweg – Nispenlaan
Stand van Zaken

Donderdag 8 januari 2025

Reneé Lubbers

Doel

- Raadsvoorstel afzien bindend advies

  Hierdoor een vertraging voorkomen zodat sneller (zonder bindend advies) omgevingsvergunning verleend kan worden.


- Informeren over project kruising Van der Mondeweg- Van Nispenlaan

Kader

- Maatregelenprogramma GMP-Plus, nr. 2 top 10
  - Totale kosten ca. € 4 miljoen waarvan provincie € 2 miljoen betaald
  - Samenwerking met provincie: provinciale weg, dus provincie in the Lead
  - Rotonde wordt omgebouwd tot een kruising met VRI
- Ontwerp opgesteld, grond verwerven, onderzoeken, omgevingsvergunning (BOPA) aanvragen




Ontwerp - fietspaden

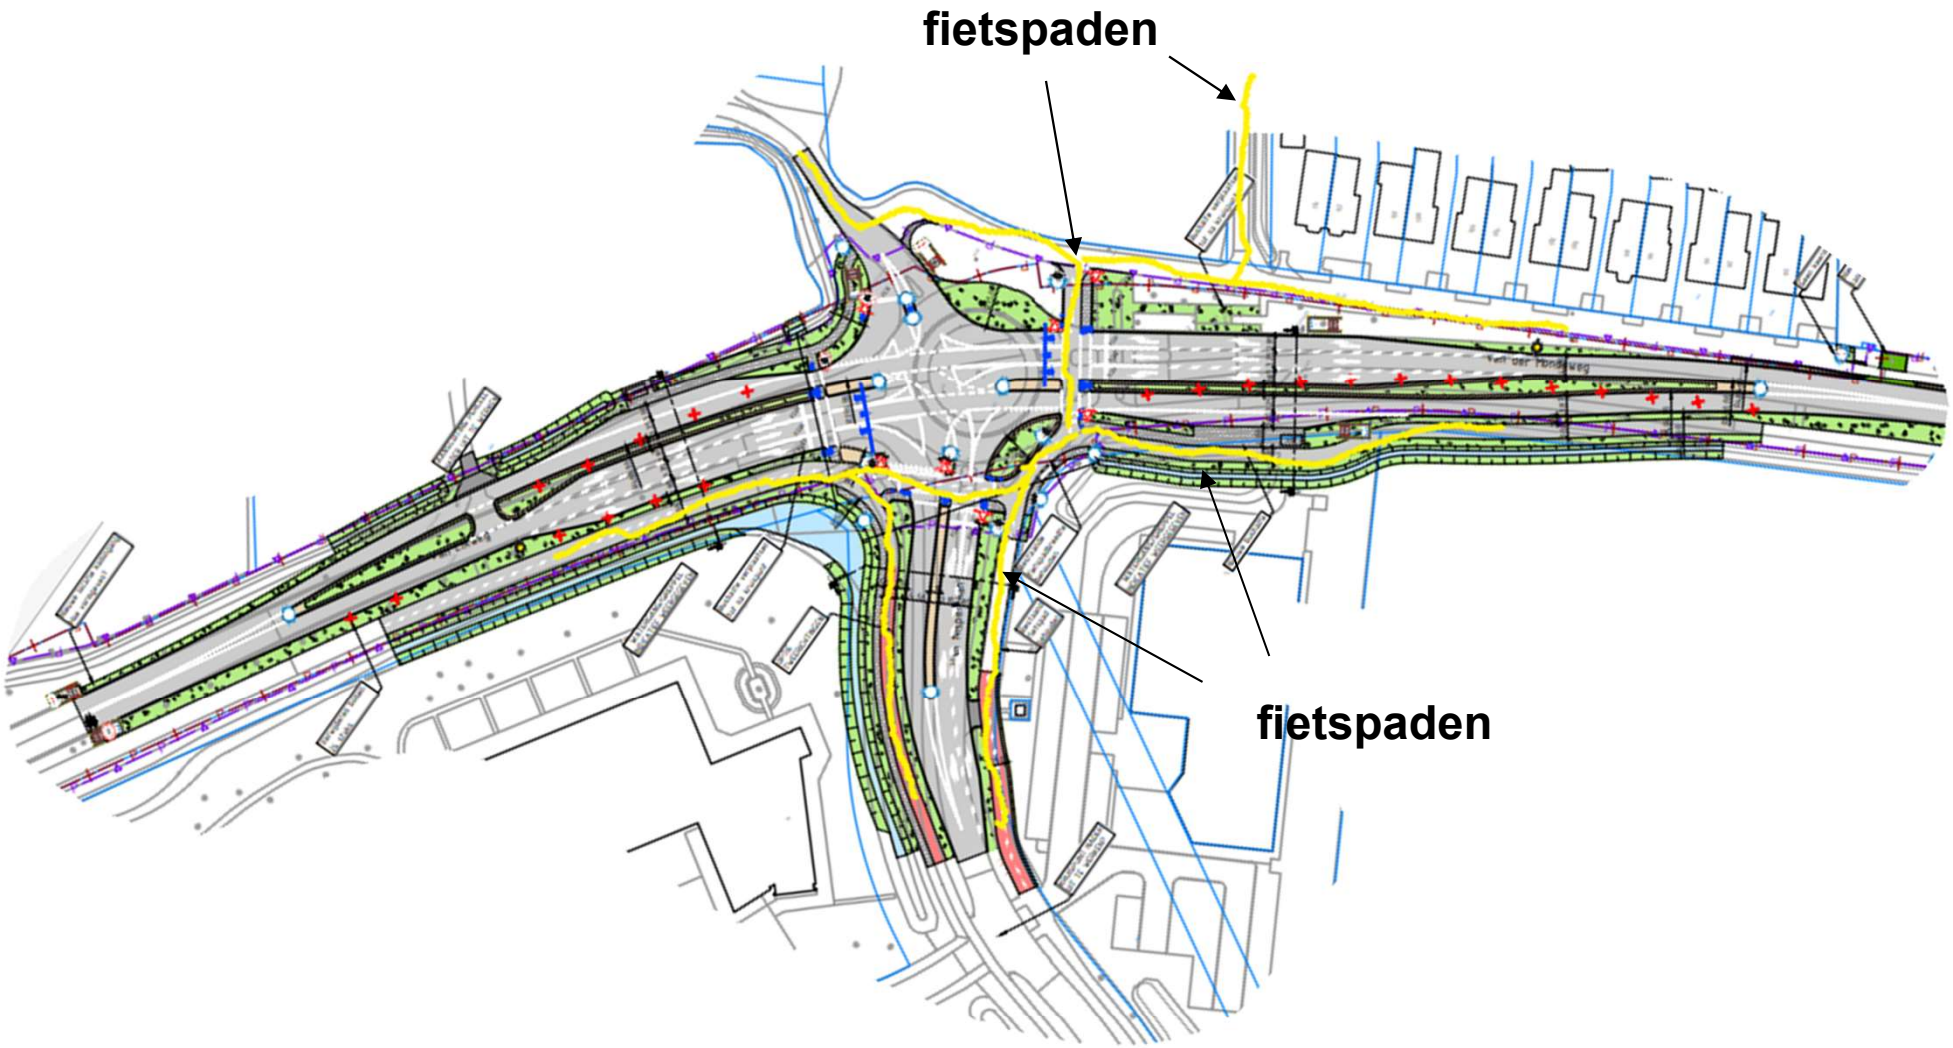


Ontwerp

gemeente lingewaard

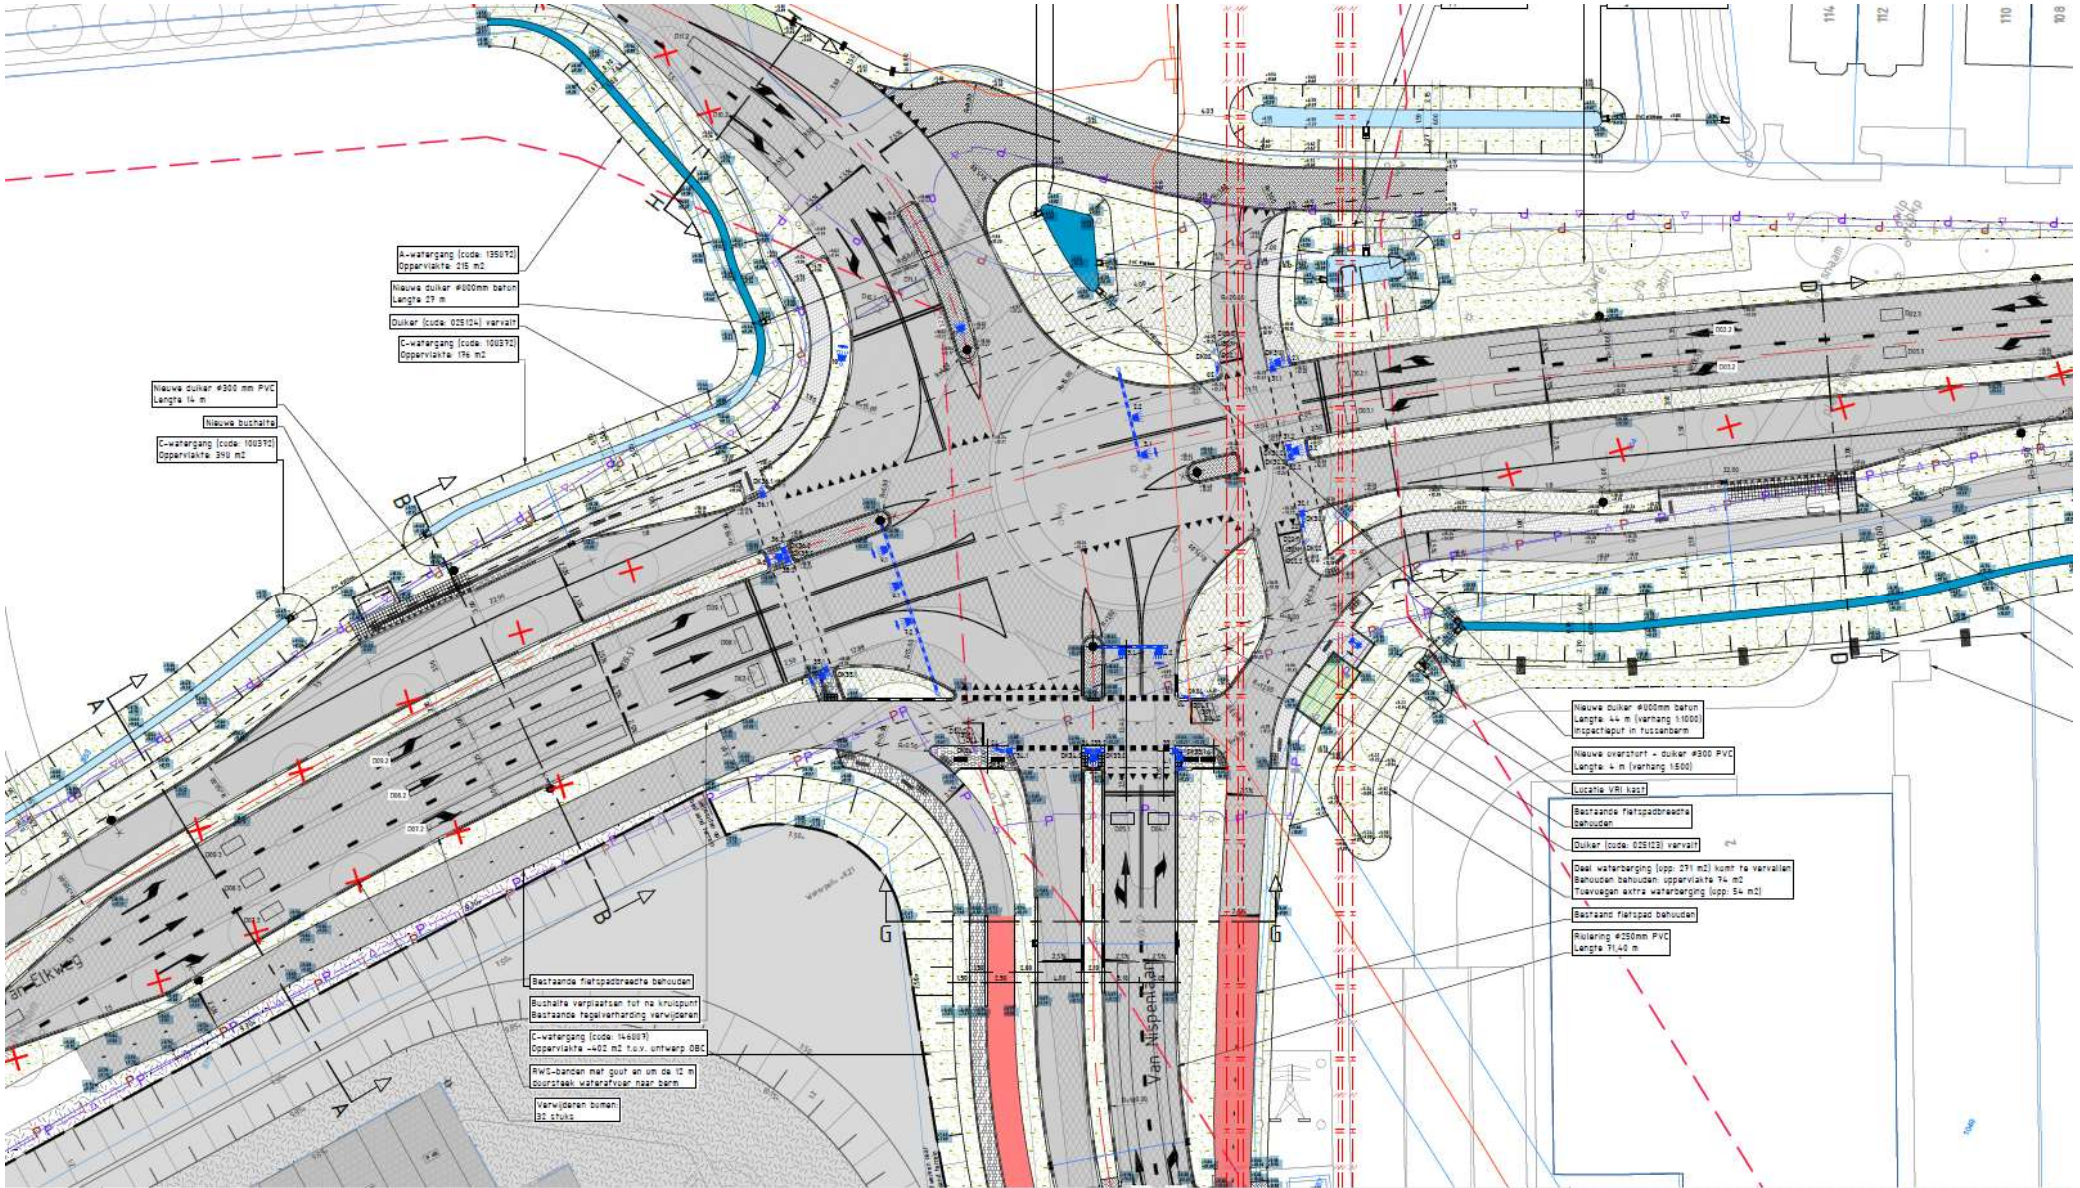

Planning

- Planvoorbereiding gereed februari 2026
- Aanvraag BOPA januari- februari 2026
- Grondverwerving afgerond oktober 2026
- aanbesteding en gunning oktober 2026 – februari 2027
- Realisatie mei 2027 – november 2027

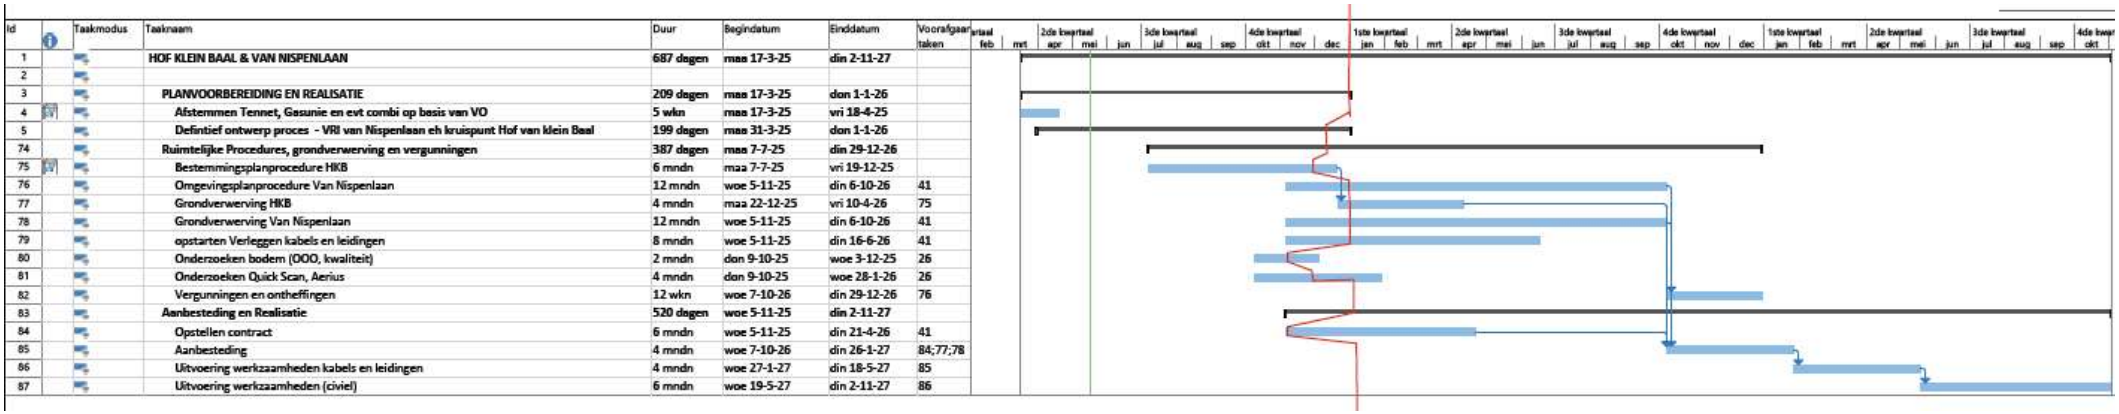

Id	Taakmodus	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1		**HOF KLEIN BAAL & VAN NISPENLAAN**	**687 dagen**	**maa 17-3-25**	**din 2-11-27**	
2						
3		**PLANVOORBEREIDING EN REALISATIE**	**209 dagen**	**maa 17-3-25**	**don 1-1-26**	
4		**Afstemmen Tennet, Gasunie en evt combi op basis van VO**	**5 wkn**	**maa 17-3-25**	**vri 18-4-25**	
5		**Definitief ontwerp proces - VRI van Nispenlaan eh kruispunt Hof van klein Baal**	**199 dagen**	**maa 31-3-25**	**don 1-1-26**	
74		**Ruimtelijke Procedures, grondverwerving en vergunningen**	**387 dagen**	**maa 7-7-25**	**din 29-12-26**	
75		**Bestemmingsplanprocedure HKB**	**6 mndn**	**maa 7-7-25**	**vri 19-12-25**	
76		Omgevingsplanprocedure Van Nispenlaan	12 mndn	woe 5-11-25	din 6-10-26	41
77		Grondverwerving HKB	4 mndn	maa 22-12-25	vri 10-4-26	75
78		Grondverwerving Van Nispenlaan	12 mndn	woe 5-11-25	din 6-10-26	41
79		opstarten Verleggen kabels en leidingen	8 mndn	woe 5-11-25	din 16-6-26	41
80		Onderzoeken bodem (OOO, kwaliteit)	2 mndn	don 9-10-25	woe 3-12-25	26
81		Onderzoeken Quick Scan, Aerius	4 mndn	don 9-10-25	woe 28-1-26	26
82		Vergunningen en ontheffingen	12 wkn	woe 7-10-26	din 29-12-26	76
83		**Aanbesteding en Realisatie**	**520 dagen**	**woe 5-11-25**	**din 2-11-27**	
84		Opstellen contract	6 mndn	woe 5-11-25	din 21-4-26	41
85		Aanbesteding	4 mndn	woe 7-10-26	din 26-1-27	84;77;78
86		Uitvoering werkzaamheden kabels en leidingen	4 mndn	woe 27-1-27	din 18-5-27	85
87		Uitvoering werkzaamheden (civiel)	6 mndn	woe 19-5-27	din 2-11-27	86

Vragen

