
BIJLAGE 2: VELDWAARNEMINGEN

BIJLAGE 2A: BOORPROFIELEN


Legenda (conform NEN 5104)

grind




Grind, siltig
Grind, zwak zandig
Grind, matig zandig
Grind, sterk zandig
Grind, uiterst zandig

zand




Zand, kleïig
Zand, zwak siltig
Zand, matig siltig
Zand, sterk siltig
Zand, uiterst siltig

veen




Veen, mineraalarm
Veen, zwak kleïig
Veen, sterk kleïig
Veen, zwak zandig
Veen, sterk zandig

klei




Klei, zwak siltig
Klei, matig siltig
Klei, sterk siltig
Klei, uiterst siltig
Klei, zwak zandig
Klei, matig zandig
Klei, sterk zandig

leem



Leem, zwak zandig
Leem, sterk zandig

overige toevoegingen



zwak humeus
matig humeus
sterk humeus
zwak grindig
matig grindig
sterk grindig

geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000


monsters



geroerd monster
ongeroerd monster
volumering


overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand



slib
water


peilbuis

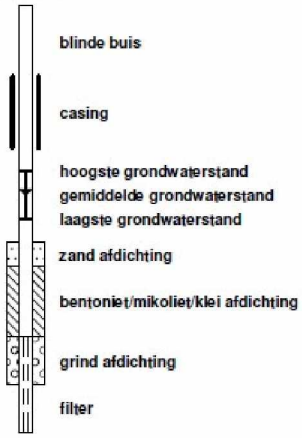


blinde buis
casing
hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
zand afdichting
bentoniet/mikoliet/klei afdichting
grind afdichting
filter

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 01
Datum: 8-12-2021

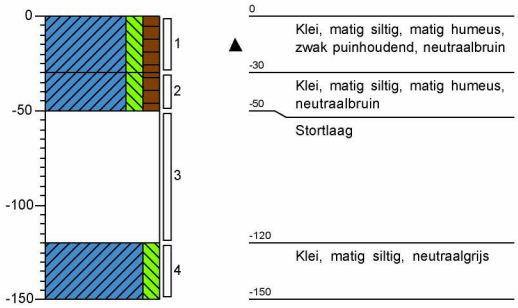


Boormeester: -
Boring: 02
Datum: 8-12-2021

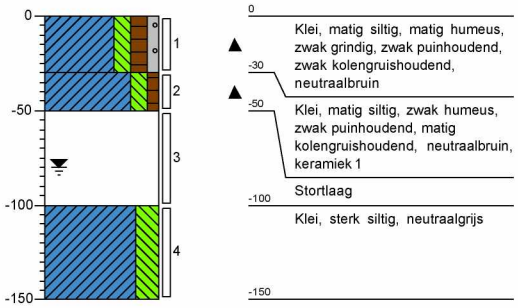


Boormeester: -
Boring: 03
Datum: 8-12-2021

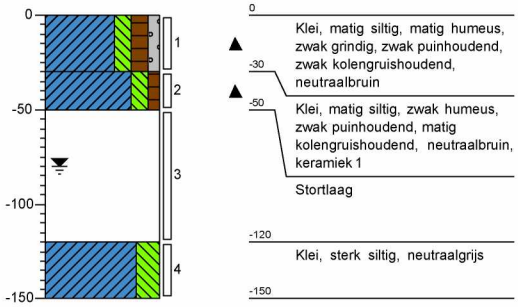


Boormeester: -
Boring: 04
Datum: 8-12-2021

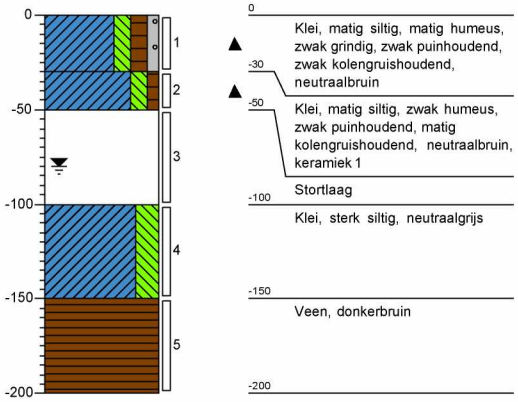

Boormeester: -
Boring: 05
Datum: 8-12-2021

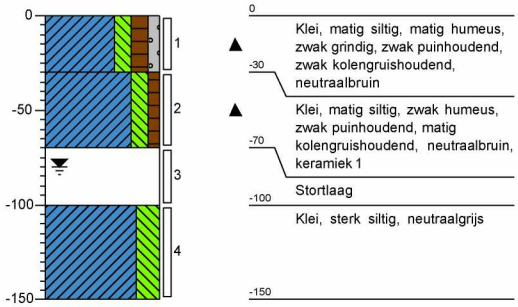


Boormeester: -
Boring: 06
Datum: 8-12-2021

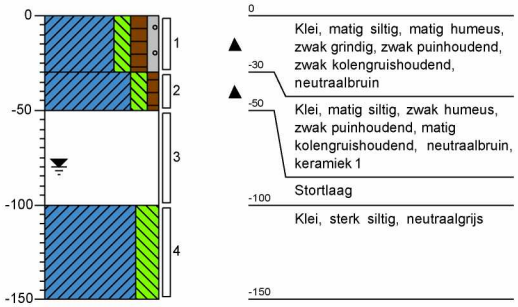


Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 07
Datum: 8-12-2021

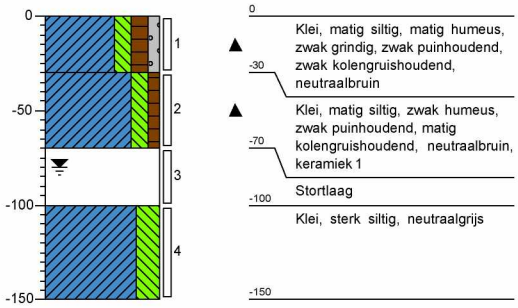


Boormeester: -
Boring: 08
Datum: 8-12-2021

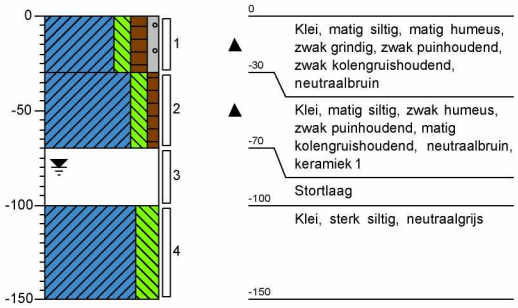


Boormeester: -
Boring: 09
Datum: 8-12-2021

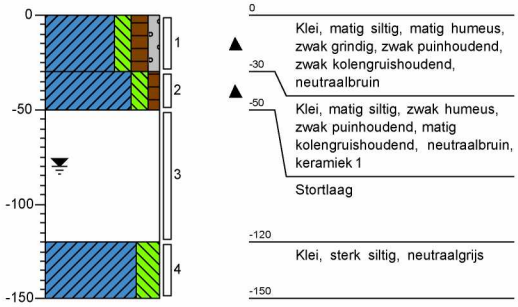


Boormeester: -
Boring: 10
Datum: 8-12-2021

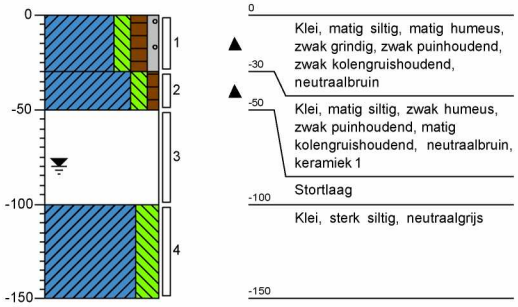

Boormeester: -
Boring: 11
Datum: 8-12-2021

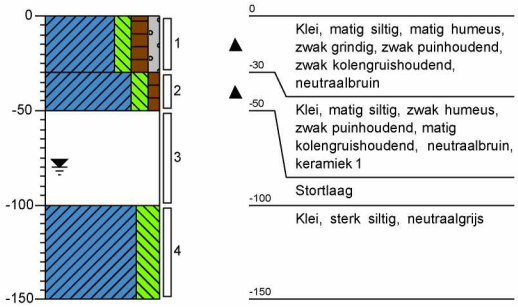


Boormeester: -
Boring: 12
Datum: 8-12-2021

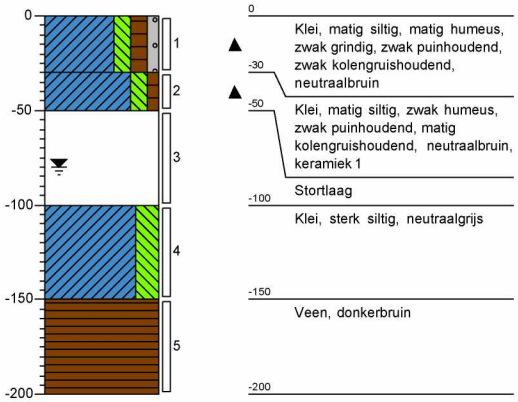


Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 13
Datum: 8-12-2021

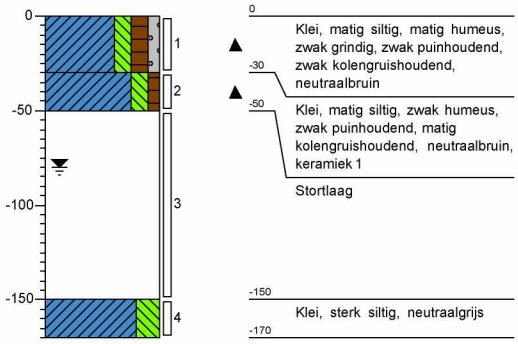


Boormeester: -
Boring: 14
Datum: 8-12-2021

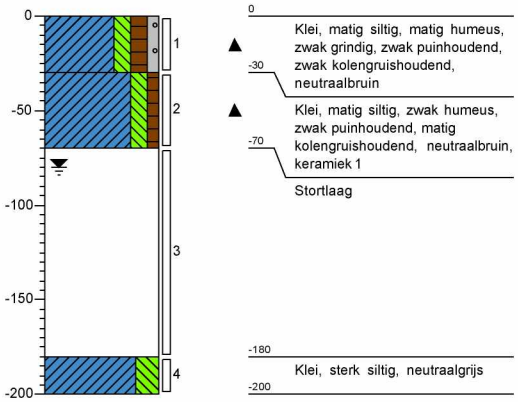


Boormeester: -
Boring: 15
Datum: 8-12-2021

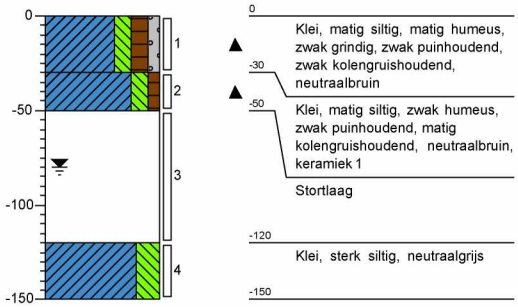


Boormeester: -
Boring: 16
Datum: 8-12-2021

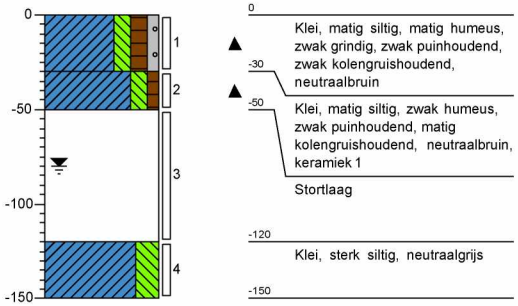

Boormeester: -
Boring: 17
Datum: 8-12-2021

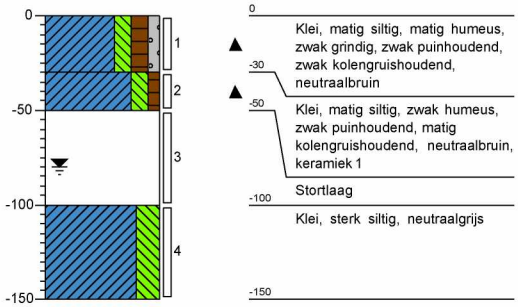


Boormeester: -
Boring: 18
Datum: 8-12-2021

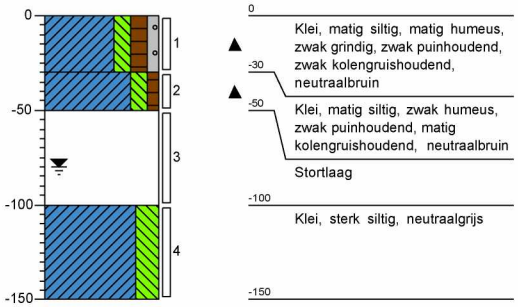


Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 19
Datum: 8-12-2021

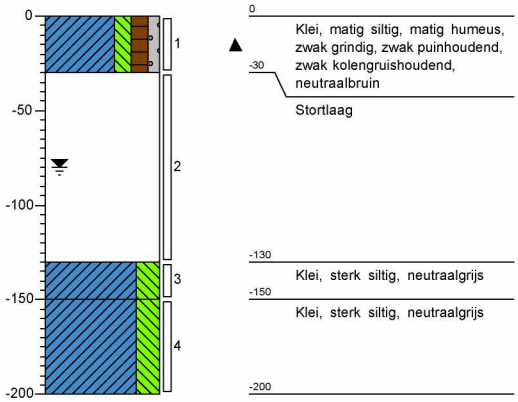


Boormeester: -
Boring: 20
Datum: 8-12-2021

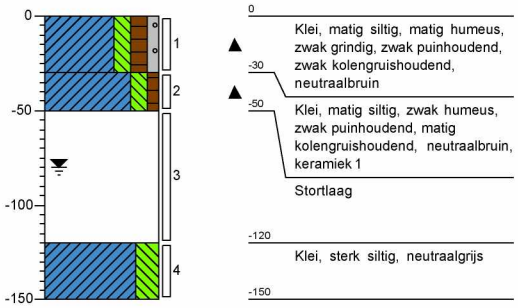


Boormeester: -
Boring: 21
Datum: 8-12-2021

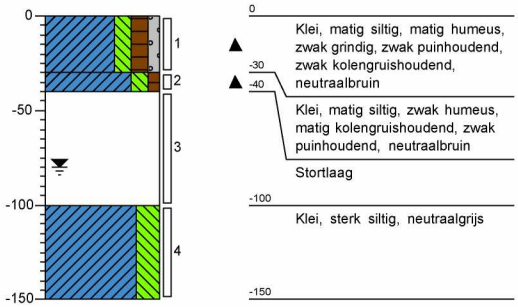


Boormeester: -
Boring: 22
Datum: 8-12-2021

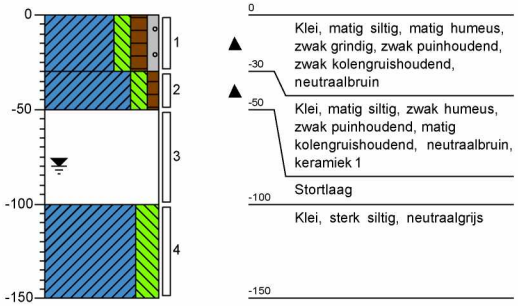

Boormeester: -
Boring: 23
Datum: 8-12-2021

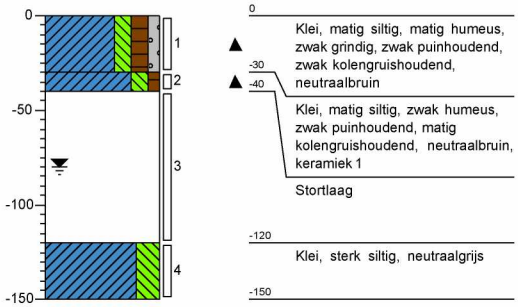


Boormeester: -
Boring: 24
Datum: 8-12-2021

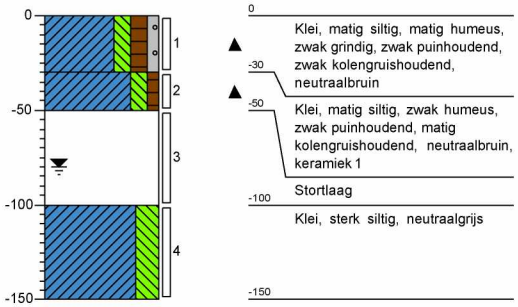


Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: Vak1-1
Datum: 21-4-2022




Boormeester: -
Boring: Vak1-2
Datum: 21-4-2022

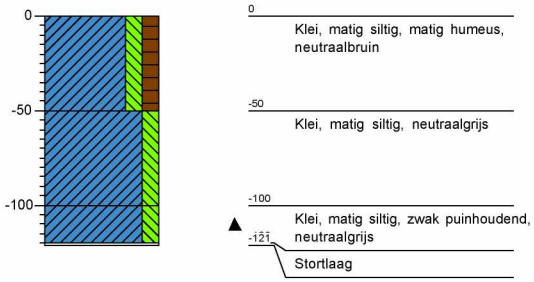


Boormeester: -
Boring: Vak2-1
Datum: 21-4-2022




Boormeester: -
Boring: Vak2-2
Datum: 21-4-2022




Boormeester: -
Boring: Vak2-3
Datum: 21-4-2022




Boormeester: -
Boring: Vak2-4
Datum: 21-4-2022



Boormeester: -
Boring: Vak3-1
Datum: 21-4-2022




Boormeester: -
Boring: Vak3-2
Datum: 21-4-2022




Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: Vak3-3
Datum: 21-4-2022

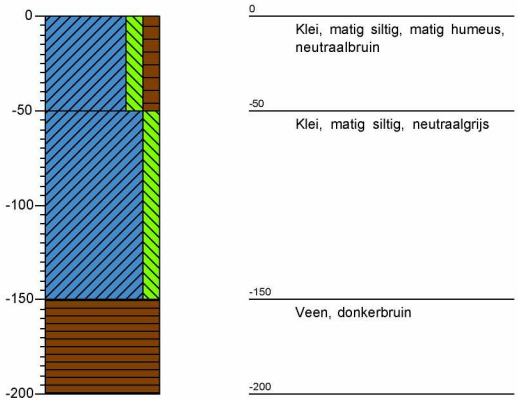


Boormeester: -
Boring: Vak3-4
Datum: 21-4-2022




Boormeester: -
Boring: Vak4-1
Datum: 21-4-2022

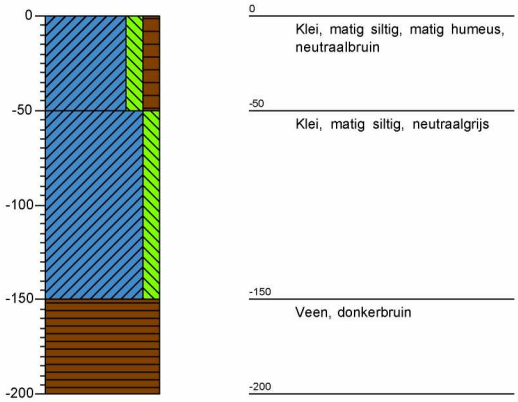


Boormeester: -
Boring: Vak4-2
Datum: 21-4-2022

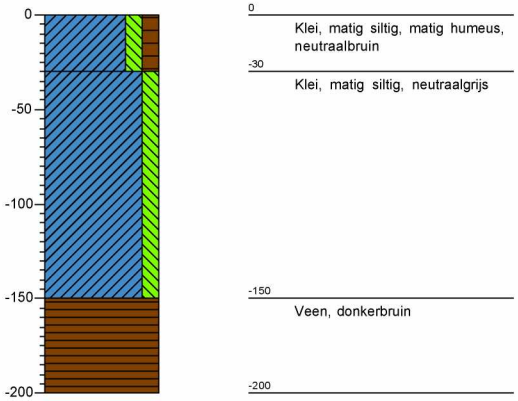

Boormeester: -
Boring: Vak4-3
Datum: 21-4-2022

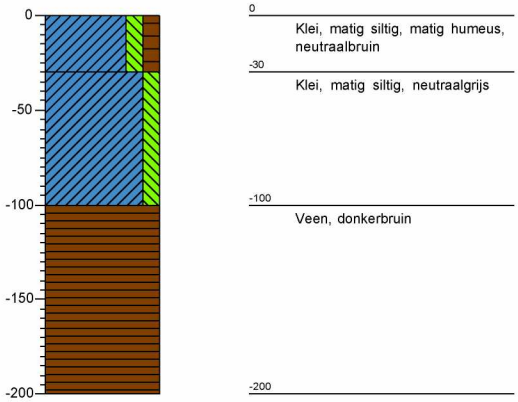


Boormeester: -
Boring: Vak4-4
Datum: 21-4-2022

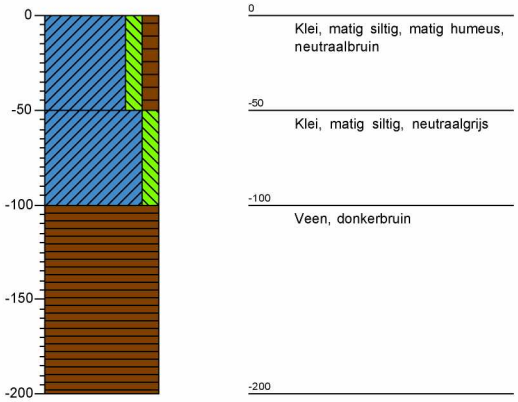


Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 86-1
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 86-2
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 86-3
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 86-4
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 87-1
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 87-2
Datum: 12-5-2022



Boormeester: -
Boring: 87-3
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 87-4
Datum: 12-5-2022




Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 90-1
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 90-2
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 90-3
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 90-4
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 91-1
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 91-2
Datum: 12-5-2022



Boormeester: -
Boring: 91-3
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 91-4
Datum: 12-5-2022




Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 99-1
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 99-2
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 99-3
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 99-4
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 100-1
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 100-2
Datum: 12-5-2022



Boormeester: -
Boring: 100-3
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 100-4
Datum: 12-5-2022




Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 101-1
Datum: 20-4-2022




Boormeester: -
Boring: 101-2
Datum: 20-4-2022




Boormeester: -
Boring: 101-3
Datum: 20-4-2022




Boormeester: -
Boring: 101-4
Datum: 20-4-2022




Boormeester: -
Boring: 102-1
Datum: 20-4-2022




Boormeester: -
Boring: 102-2
Datum: 20-4-2022



Boormeester: -
Boring: 102-3
Datum: 20-4-2022




Boormeester: -
Boring: 102-4
Datum: 20-4-2022



Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 103-1
Datum: 20-4-2022




0 Klei, matig siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin, keramiek 1
-71 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 103-2
Datum: 20-4-2022




0 Klei, matig siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin, keramiek 1
-61 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 103-3
Datum: 20-4-2022




0 Klei, matig siltig, matig humeus, zwak grindig, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin, keramiek 1
-61 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 103-4
Datum: 20-4-2022




0 Klei, matig siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin, keramiek 1
-50
-61 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend,

Boormeester: -
Boring: 104-1
Datum: 20-4-2022




0 Klei, matig siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin, keramiek 1
-50
-71 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin

Boormeester: -
Boring: 104-2
Datum: 20-4-2022




0 Klei, matig siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin, keramiek 1
-71 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 104-3
Datum: 20-4-2022



0 Klei, matig siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin, keramiek 1
-61 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 104-4
Datum: 20-4-2022




0 Klei, matig siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin, keramiek 1
-51 Stortlaag


Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 105-1
Datum: 20-4-2022




Boormeester: -
Boring: 105-2
Datum: 20-4-2022




Boormeester: -
Boring: 105-3
Datum: 20-4-2022




Boormeester: -
Boring: 105-4
Datum: 20-4-2022




Boormeester: -
Boring: 106-1
Datum: 20-4-2022




Boormeester: -
Boring: 106-2
Datum: 20-4-2022



Boormeester: -
Boring: 106-3
Datum: 20-4-2022




Boormeester: -
Boring: 106-4
Datum: 20-4-2022



Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 107-1
Datum: 20-4-2022




0
Klei, matig siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin, keramiek 1
-61
Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 107-2
Datum: 20-4-2022




0
Klei, matig siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30
Stortlaag
-51

Boormeester: -
Boring: 107-3
Datum: 20-4-2022




0
Klei, matig siltig, matig humeus, zwak grindig, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin, keramiek 1
-51
Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 107-4
Datum: 20-4-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin, keramiek 1
-71
Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 108-1
Datum: 20-4-2022




0
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin, keramiek 1
-71
Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 108-2
Datum: 20-4-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin, keramiek 1
-51
Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 108-3
Datum: 20-4-2022



0
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin, keramiek 1
-71
Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 108-4
Datum: 20-4-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin, keramiek 1
-71
Stortlaag


Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 109-1
Datum: 20-4-2022




Boormeester: -
Boring: 109-2
Datum: 20-4-2022




Boormeester: -
Boring: 109-3
Datum: 20-4-2022




Boormeester: -
Boring: 109-4
Datum: 20-4-2022




Boormeester: -
Boring: 110-1
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 110-2
Datum: 12-5-2022



Boormeester: -
Boring: 110-3
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 110-4
Datum: 12-5-2022




Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 115-1
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 115-2
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 115-3
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 115-4
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 116-1
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 116-2
Datum: 12-5-2022



Boormeester: -
Boring: 116-3
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 116-4
Datum: 12-5-2022




Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 119-1
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 119-2
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 119-3
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 119-4
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 120-1
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 120-2
Datum: 12-5-2022



Boormeester: -
Boring: 120-3
Datum: 12-5-2022




Boormeester: -
Boring: 120-4
Datum: 12-5-2022



Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 125-1
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, grijsbruin
-51 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 125-2
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, grijsbruin
-51 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 125-3
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30
-36 Klei, matig zandig, donkerbruin
Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 125-4
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30
-41 Klei, matig zandig, grijsbruin
Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 126-1
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, grijsbruin
-51 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 126-2
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, grijsbruin
-51 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 126-3
Datum: 7-6-2022



0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, bruingrijs
-46 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 126-4
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, bruingrijs
-46 Stortlaag


Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 127-1
Datum: 7-6-2022




Boormeester: -
Boring: 127-2
Datum: 7-6-2022




Boormeester: -
Boring: 127-3
Datum: 7-6-2022




Boormeester: -
Boring: 127-4
Datum: 7-6-2022




Boormeester: -
Boring: 128-1
Datum: 7-6-2022




Boormeester: -
Boring: 128-2
Datum: 7-6-2022



Boormeester: -
Boring: 128-3
Datum: 7-6-2022




Boormeester: -
Boring: 128-4
Datum: 7-6-2022



Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 129-1
Datum: 7-6-2022



0 Klei, matig zandig, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, donkerbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 129-2
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
-41 Klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin
Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 129-3
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-31 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 129-4
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30
-41 Klei, matig siltig, bruingrijs, Stortlaag
Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 150-1
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 150-2
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 150-3
Datum: 8-6-2022



0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 150-4
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 151-1
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 151-2
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 151-3
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 151-4
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 152-1
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 152-2
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 152-3
Datum: 7-6-2022



0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 152-4
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 153-1
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 153-2
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 153-3
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 153-4
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 154-1
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin
-51 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 154-2
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 154-3
Datum: 7-6-2022



0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 154-4
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, matig grindhoudend, neutraalbruin
-50

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 155-1
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 155-2
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 155-3
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 155-4
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 156-1
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig siltig, grijsbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 156-2
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 156-3
Datum: 7-6-2022



0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 156-4
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 157-1
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 157-2
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 157-3
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, matig puinhoudend, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 157-4
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 158-1
Datum: 7-6-2022



0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 158-2
Datum: 7-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 158-3
Datum: 7-6-2022



0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-31 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 158-4
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-30 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbruin, Stortlaag
-50

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 159-1
Datum: 7-6-2022




0 — Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 — Klei, matig siltig, bruingrijs, Stortlaag
-50

Boormeester: -
Boring: 159-2
Datum: 7-6-2022




0 — Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 — Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs, Stortlaag
-45

Boormeester: -
Boring: 159-3
Datum: 7-6-2022




0 — Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 — Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs, Stortlaag
-50

Boormeester: -
Boring: 159-4
Datum: 7-6-2022




0 — Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 — Klei, matig zandig, neutraalbruin, Stortlaag
-50

Boormeester: -
Boring: 160-1
Datum: 7-6-2022




0 — Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 — Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin, Stortlaag
-41 — Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 160-2
Datum: 7-6-2022




0 — Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-31 — Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 160-3
Datum: 7-6-2022



0 — Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 — Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-41 — Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 160-4
Datum: 7-6-2022




0 — Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 — Klei, matig zandig, grijsbruin
-50

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 161-1
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 161-2
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 161-3
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 161-4
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 162-1
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 162-2
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 162-3
Datum: 7-6-2022



0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 162-4
Datum: 7-6-2022




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 164-1
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-51
Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 164-2
Datum: 8-6-2022



0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 164-3
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 164-4
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-31
Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 165-1
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 165-2
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 165-3
Datum: 8-6-2022



0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 165-4
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 166-1
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-51 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 166-2
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 166-3
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 166-4
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-51 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 167-1
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 167-2
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 167-3
Datum: 8-6-2022



0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 167-4
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 168-1
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 168-2
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 168-3
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 168-4
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 169-1
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 169-2
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 169-3
Datum: 8-6-2022



0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 169-4
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 170-1
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 170-2
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 170-3
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 170-4
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 171-1
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 171-2
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 171-3
Datum: 8-6-2022



0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 171-4
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 172-1
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 172-2
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 172-3
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 172-4
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 173-1
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 173-2
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 173-3
Datum: 8-6-2022



0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 173-4
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-41 Stortlaag

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 174-1
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 174-2
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 174-3
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 174-4
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-41 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 175-1
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 175-2
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-41 Stortlaag

Boormeester: -
Boring: 175-3
Datum: 8-6-2022



0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 175-4
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-41 Stortlaag

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 176-1
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 176-2
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 176-3
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 176-4
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 177-1
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 177-2
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 177-3
Datum: 8-6-2022



0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 177-4
Datum: 8-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 178-1
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 178-2
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 178-3
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 178-4
Datum: 8-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 179-1
Datum: 14-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 179-2
Datum: 14-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 179-3
Datum: 14-6-2022



0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 179-4
Datum: 14-6-2022




0 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 180-1
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 180-2
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 180-3
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 180-4
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 181-1
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 181-2
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 181-3
Datum: 14-6-2022



0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 181-4
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50


Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 182-1
Datum: 14-6-2022




Boormeester: -
Boring: 182-2
Datum: 14-6-2022




Boormeester: -
Boring: 182-3
Datum: 14-6-2022




Boormeester: -
Boring: 182-4
Datum: 14-6-2022




Boormeester: -
Boring: 183-1
Datum: 14-6-2022




Boormeester: -
Boring: 183-2
Datum: 14-6-2022



Boormeester: -
Boring: 183-3
Datum: 14-6-2022




Boormeester: -
Boring: 183-4
Datum: 14-6-2022



Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 184-1
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 184-2
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 184-3
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 184-4
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 185-1
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 185-2
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 185-3
Datum: 14-6-2022



0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 185-4
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 186-1
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 186-2
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 186-3
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 186-4
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 187-1
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 187-2
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 187-3
Datum: 14-6-2022



0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 187-4
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 188-1
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 188-2
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 188-3
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 188-4
Datum: 14-6-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-30
Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 1000-1
Datum: 30-6-2021




0
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30

Boormeester: -
Boring: 1000-2
Datum: 30-6-2021




0
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend, neutraalbruin
-30
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 1000-3
Datum: 30-6-2021



0
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend, neutraalbruin
-30
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: 1000-4
Datum: 30-6-2021



0
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend, neutraalbruin
-30
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-50

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 1000-5
Datum: 30-6-2021




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30

Boormeester: -
Boring: 1000-6
Datum: 30-6-2021




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30

Boormeester: -
Boring: 1000-7
Datum: 30-6-2021




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30

Boormeester: -
Boring: 1000-8
Datum: 30-6-2021




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30

Boormeester: -
Boring: 1000-9
Datum: 30-6-2021




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30

Boormeester: -
Boring: 1000-10
Datum: 30-6-2021




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30

Boormeester: -
Boring: 1000-101
Datum: 11-8-2021



0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Zand, matig fijn, kleïg, matig humeus, neutraalbruin
-50 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-120 Klei, zwak zandig, neutraalgrijs
-150

Boormeester: -
Boring: 1000-102
Datum: 11-8-2021




0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-30 Zand, matig fijn, kleïg, matig humeus, neutraalbruin
-50 Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-120 Klei, zwak zandig, neutraalgrijs
-150


Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 1000-103
Datum: 11-8-2021

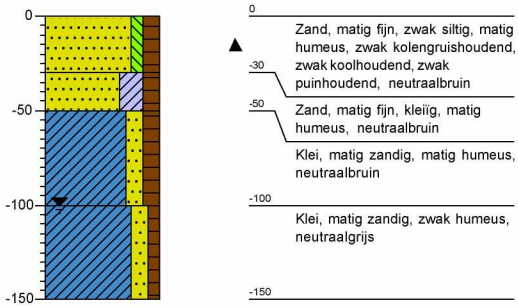


Boormeester: -
Boring: 1000-104
Datum: 11-8-2021

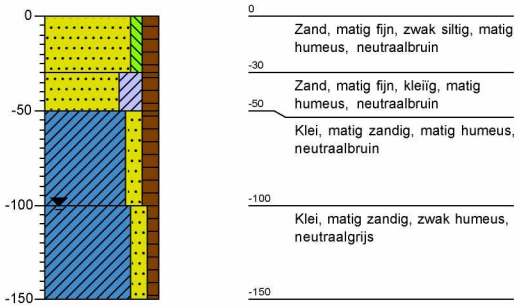


Boormeester: -
Boring: 1000-ref1
Datum: 30-6-2021




Boormeester: -
Boring: 1000-ref2
Datum: 30-6-2021




Boormeester: -
Boring: 1002
Datum: 30-6-2021




Boormeester: -
Boring: 1003
Datum: 30-6-2021



Boormeester: -
Boring: 1019
Datum: 30-6-2021




Boring: 3074
Datum: 30-6-2021




Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 3074-1
Datum: 30-6-2021

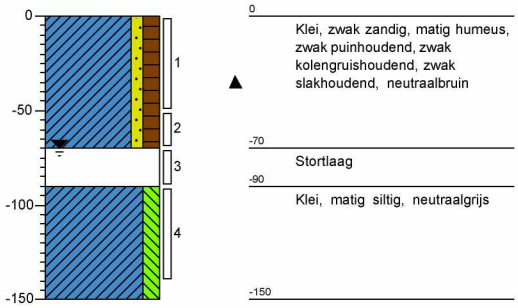


Boormeester: -
Boring: 3074-2
Datum: 30-6-2021




Boormeester: -
Boring: 3074-3
Datum: 30-6-2021




Boormeester: -
Boring: 3074-4
Datum: 30-6-2021




Boormeester: -
Boring: 3074-5
Datum: 30-6-2021




Boormeester: -
Boring: 3074-6
Datum: 30-6-2021



Boormeester: -
Boring: 3074-7
Datum: 30-6-2021




Boormeester: -
Boring: 3074-8
Datum: 30-6-2021




Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 3074-9
Datum: 30-6-2021




Boormeester: -
Boring: 3074-10
Datum: 30-6-2021




Boormeester: -
Boring: 3074-11
Datum: 30-6-2021




Boormeester: -
Boring: 3074-12
Datum: 30-6-2021




Boormeester: -
Boring: 3074-13
Datum: 30-6-2021




Boormeester: -
Boring: 3074-14
Datum: 30-6-2021



Boormeester: -
Boring: 3074-15
Datum: 1-7-2021



Boormeester: -
Boring: 3074-16
Datum: 1-7-2021



Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 3074-17
Datum: 1-7-2021



0
-30
Klei, zwak siltig, matig humeus, zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, neutraalbruin

Boormeester: -
Boring: 3074-18
Datum: 1-7-2021



0
-30
Klei, zwak siltig, matig humeus, zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, neutraalbruin

Boormeester: -
Boring: 3074-101
Datum: 11-8-2021



0
-30
Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin

Boormeester: -
Boring: 3074-102
Datum: 11-8-2021




0
-30
Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin

Boormeester: -
Boring: 3074-103
Datum: 11-8-2021



0
-30
Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin

Boormeester: -
Boring: 3074-104
Datum: 11-8-2021



0
-30
Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin

Boormeester: -
Boring: 3102-1
Datum: 1-7-2021



0
-30
Klei, zwak siltig, matig humeus, zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, neutraalbruin

Boormeester: -
Boring: 3102-2
Datum: 1-7-2021




0
-30
Klei, zwak siltig, matig humeus, zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, neutraalbruin


Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 3102-3
Datum: 1-7-2021




Boormeester: -
Boring: 3102-4
Datum: 1-7-2021




Boormeester: -
Boring: 3102-5
Datum: 1-7-2021




Boormeester: -
Boring: 3102-6
Datum: 1-7-2021




Boormeester: -
Boring: 3102-7
Datum: 1-7-2021




Boormeester: -
Boring: 3102-8
Datum: 1-7-2021



Boormeester: -
Boring: 3102-9
Datum: 1-7-2021




Boormeester: -
Boring: 3102-10
Datum: 1-7-2021




Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 3102-11
Datum: 1-7-2021




Boormeester: -
Boring: 3102-12
Datum: 1-7-2021




Boormeester: -
Boring: 3102-101
Datum: 11-8-2021

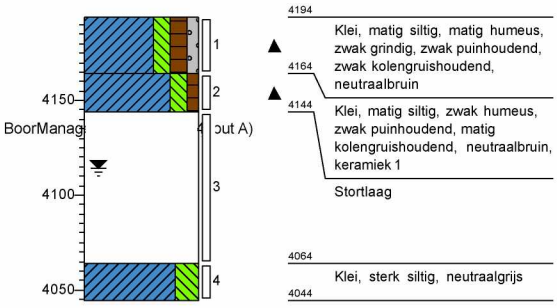


Boormeester: -
Boring: 3102-102
Datum: 11-8-2021

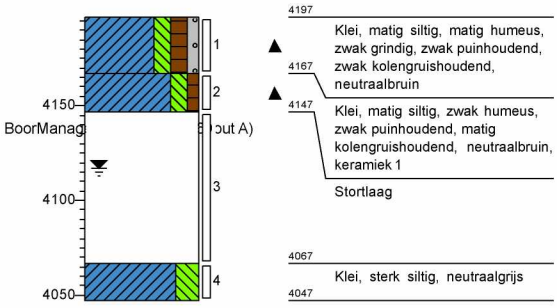


Boormeester: -
Boring: 3102-103
Datum: 11-8-2021

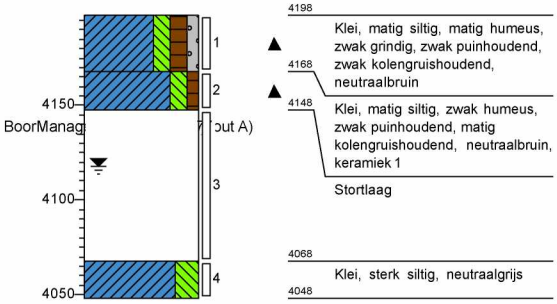


Boormeester: -
Boring: 3102-104
Datum: 11-8-2021

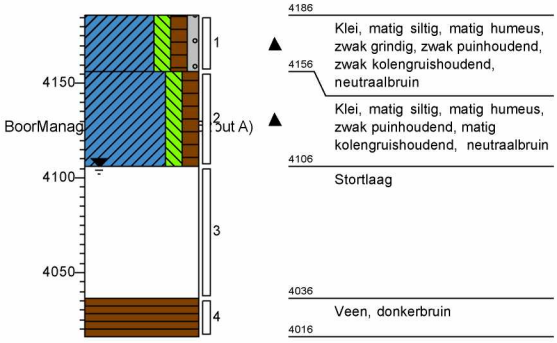

Boormeester: -
Boring: 4006
Datum: 13-5-2020




Boormeester: -
Boring: 4006-1
Datum: 29-6-2021




Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 4006-2
Datum: 29-6-2021




Boormeester: -
Boring: 4006-3
Datum: 29-6-2021




Boormeester: -
Boring: 4006-4
Datum: 29-6-2021




Boormeester: -
Boring: 5035
Datum: 3-7-2020




Boormeester: -
Boring: 5035-1
Datum: 29-6-2021

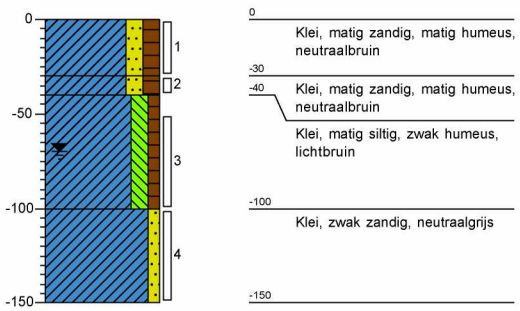


Boormeester: -
Boring: 5035-2
Datum: 29-6-2021

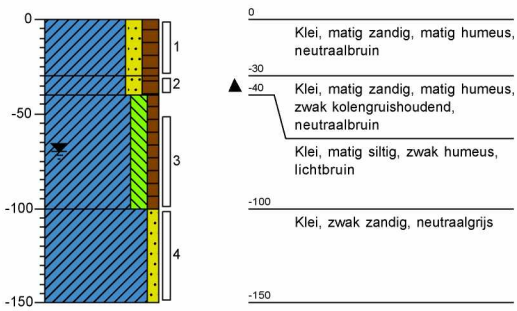

Boormeester: -
Boring: 5035-3
Datum: 29-6-2021

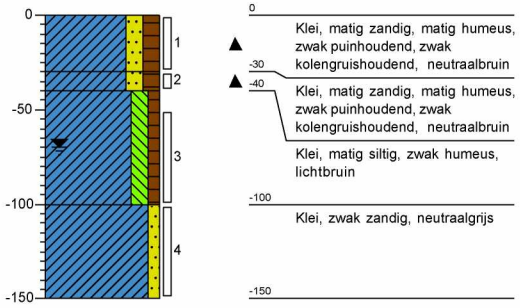


Boormeester: -
Boring: 5035-4
Datum: 29-6-2021

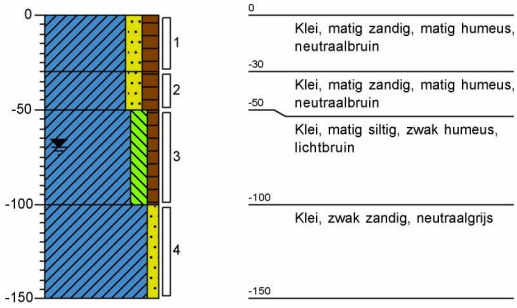


Projectcode: ODRY20201307

Boorprofielen


Boormeester: -
Boring: 5035-5
Datum: 29-6-2021




Boormeester: -
Boring: 5035-6
Datum: 29-6-2021




Boormeester: -
Boring: 5035-7
Datum: 29-6-2021




Boormeester: -
Boring: 5035-8
Datum: 29-6-2021




Boormeester: -
Boring: 5035-9
Datum: 29-6-2021




Boormeester: -
Boring: 5039-10
Datum: 29-6-2021



Boormeester: -
Boring: 6045
Datum: 18-6-2020




Boormeester: -
Boring: 6045-1
Datum: 29-6-2021



Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: 6045-2
Datum: 29-6-2021




0
-30
Klei, sterk zandig, matig humeus, matig kolengruishoudend, neutraalbruin, Grondsoort in BM = H: K, T1: Z, T1GRAD: 3, T2: H, T2GRAD: 2

Boormeester: -
Boring: 6045-3
Datum: 29-6-2021




0
-30
Klei, sterk zandig, matig humeus, matig kolengruishoudend, neutraalbruin, Grondsoort in BM = H: K, T1: Z, T1GRAD: 3, T2: H, T2GRAD: 2

Boormeester: -
Boring: 6045-4
Datum: 29-6-2021




0
-30
Klei, sterk zandig, matig humeus, matig kolengruishoudend, neutraalbruin, Grondsoort in BM = H: K, T1: Z, T1GRAD: 3, T2: H, T2GRAD: 2

Boormeester: -
Boring: B103
Datum: 11-8-2021




0
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak kolengruishoudend, zwak sintelhoudend, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-50
Klei, zwak siltig, zwak humeus, donker bruingrijs
-150

Boormeester: -
Boring: H109-1
Datum: 12-5-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30
-41
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
Stortlaag

Boormeester: -
Boring: H109-2
Datum: 12-5-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-50

Boormeester: -
Boring: H109-3
Datum: 12-5-2022



0
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30
-51
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
Stortlaag

Boormeester: -
Boring: H109-4
Datum: 12-5-2022




0
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-30
-51
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin
Stortlaag

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: Pb01
Datum: 21-4-2022




0	Klei, matig siltig, matig humeus, matig puinhoudend, neutraalbruin
-50	Klei, matig siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalgrijs
-70	Stortlaag
-120	Klei, matig siltig, neutraalgrijs
-170	Veen, donkerbruin
-230	

Boormeester: -
Boring: b1
Datum: 30-6-2021




0	Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak kolengruishoudend, zwak sintelhoudend, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-50	Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-100	Klei, zwak siltig, zwak humeus, donker bruingrijs
-150	

Boormeester: -
Boring: b3
Datum: 30-6-2021




0	Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak kolengruishoudend, zwak sintelhoudend, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-50	Klei, zwak siltig, zwak humeus, donker bruingrijs
-150	

Boormeester: -
Boring: b101
Datum: 11-8-2021



0	Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak kolengruishoudend, zwak sintelhoudend, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-50	Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-100	Klei, zwak siltig, zwak humeus, donker bruingrijs
-150	

Boormeester: -
Boring: pb2
Datum: 30-6-2021




0	Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak kolengruishoudend, zwak sintelhoudend, zwak puinhoudend, neutraalbruin
-50	Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin
-100	Klei, zwak siltig, zwak humeus, donker bruingrijs
-180	Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak veenhoudend, lichtbruin
-230	

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: A01
Datum: 11-10-2022




0 Klei, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin
-50 Klei, zwak siltig, matig humeus, neutraalgrijs
-100 Veen, donkerbruin
-200

Boormeester: -
Boring: A02
Datum: 11-10-2022




0 Klei, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin
-50 Stortlaag
-70 Klei, matig siltig, neutraalbruin
-150 Veen, donkerbruin
-200

Boormeester: -
Boring: A03
Datum: 11-10-2022




0 Klei, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin
-50 Stortlaag
-70 Klei, matig siltig, neutraalbruin
-150 Veen, donkerbruin
-200

Boormeester: -
Boring: A04
Datum: 11-10-2022




0 Klei, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin
-50 Stortlaag
-70 Klei, matig siltig, neutraalbruin
-150 Veen, donkerbruin
-200

Boormeester: -
Boring: A05
Datum: 11-10-2022



0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-70 Klei, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin
-150 Veen, donkerbruin
-200

Boormeester: -
Boring: A06
Datum: 11-10-2022




0 Klei, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin
-50 Veen, donkerbruin
-150 Klei, matig siltig, neutraalgrijs
-180 Veen, donkerbruin
-200

Projectcode: ODRY20201307


Boorprofielen

Boormeester: -
Boring: A07
Datum: 11-10-2022




0 Klei, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin
-50 Klei, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin
-80 Veen, donkerbruin
-180 Klei, matig siltig, neutraalgrijs
-200

Boormeester: -
Boring: A08
Datum: 11-10-2022



0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-50 Klei, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin
-70 Klei, matig siltig, neutraalgrijs
-100 Veen, donkerbruin
-200

Boormeester: -
Boring: A09
Datum: 11-10-2022



0 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin
-50 Klei, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin
-150 Veen, donkerbruin
-200

Projectcode: ODRY20201307
