


# Financiële evaluatie

## Veerstoep Bergambacht



# 2015

- Wens RWS overnachtingshavens
- Bijdrage gemeente 321.250 euro voor vervangen kistdam
- College wil hele gebied integraal verbeteren

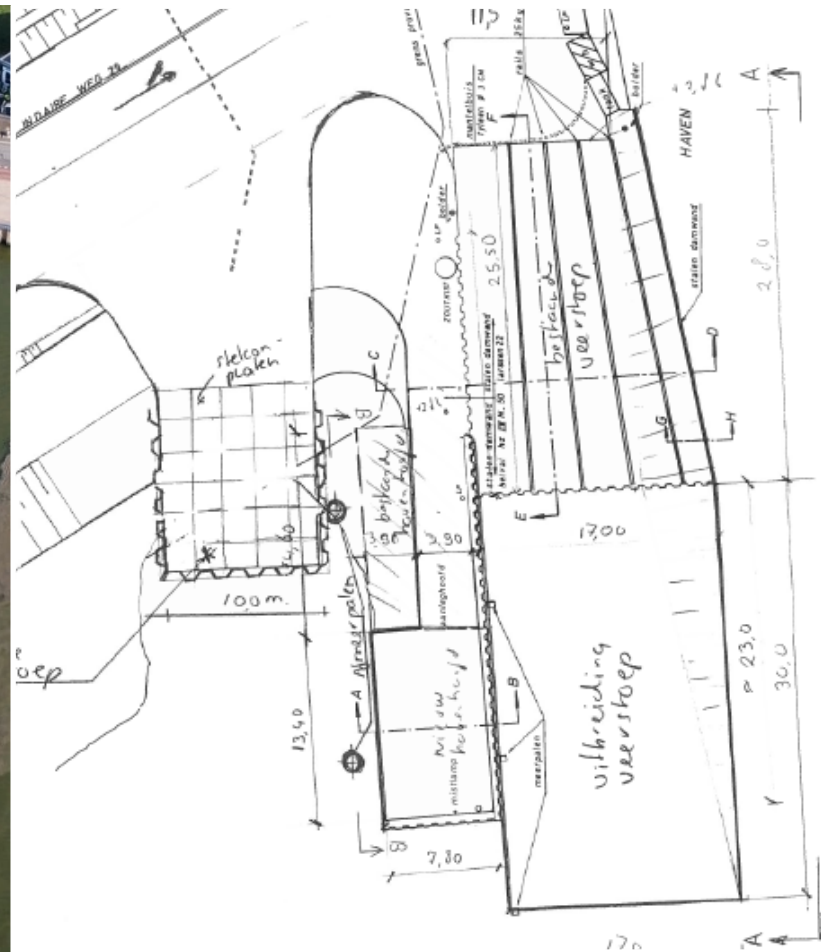


# 2017

- Samenwerkingsovereenkomst
- Gemeente schuift op
- Gemeente gaat hele gebied integraal aanpakken
- Inbreng RWS 727.000 euro



## 2019

- 1<sup>e</sup> Budgetraming o.b.v. schetsen 2.1 miljoen euro
- Raad stelt krediet van 2.1 miljoen euro beschikbaar
- Start engineering RPS

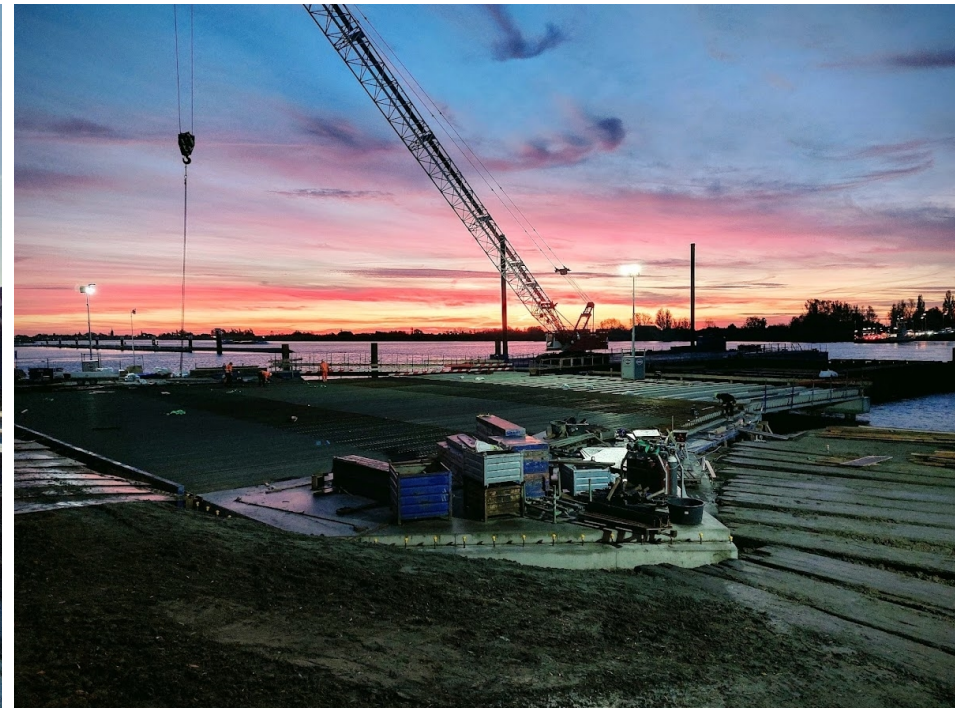

## 2020

- Definitief Ontwerp vastgesteld door college
- DO raming 2.695.000 euro
- Extra krediet 595.000 euro (september)
- Subsidiegelden PZH en HHSK 415.000 euro
- Subsidiegelden RWS 727.000 euro
- 2<sup>e</sup> helft 2020 engineering en aanbesteding van het werk




## 2021

- Aanbesteding valt tegen
- Extra krediet 720.000 euro
- Belangrijkste oorzaak: Corona
- Gunning werk aan aannemer


| aanbesteding    |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Gebr. De Koning | € | 2.815.000,00 |
| Nr. 2           | € | 3.100.000,00 |
| Nr. 3           | € | 4.100.000,00 |
| Nr. 4           | € | 4.450.000,00 |

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Gebr. De Koning | € | 2.815.000,00 |
| Nr. 2           | € | 3.100.000,00 |
| Nr. 3           | € | 4.100.000,00 |
| Nr. 4           | € | 4.450.000,00 |

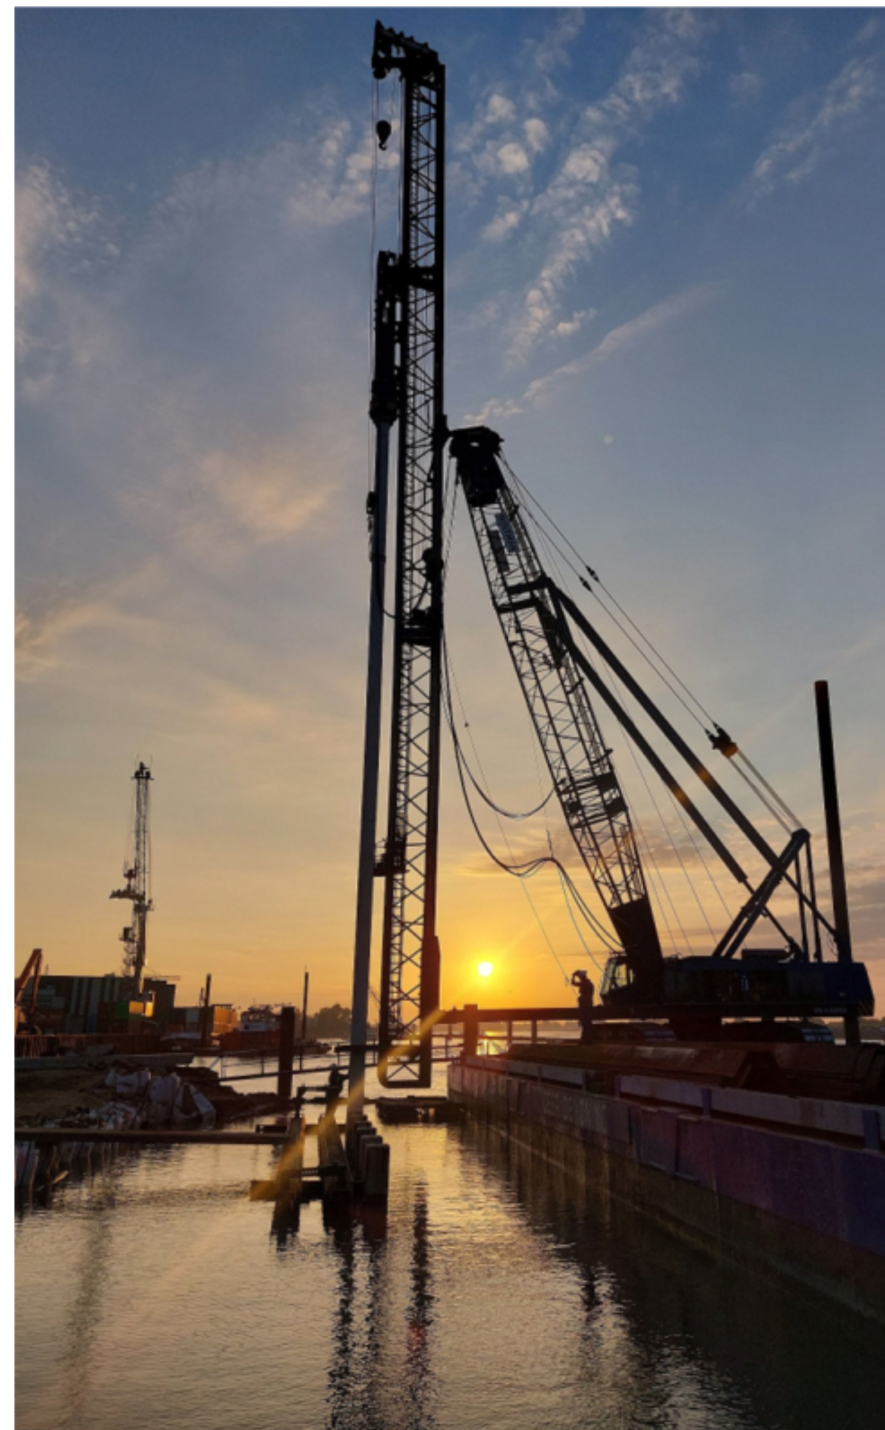

# 2022

- Sonderingen dijkdoorbraak
- Gehele constructie zwaarder. Duurdere uitvoeringswijze
- Presentatie aan commissie over kredietaanvraag + 1 miljoen
- Extra krediet 1 miljoen (nu echt laatste keer!?)
- In dezelfde maand: Oorlog breekt uit in Oekraïne (februari 2022)
- Doorstart werkvoorbereiding aannemer
- Start uitvoering juni 2022

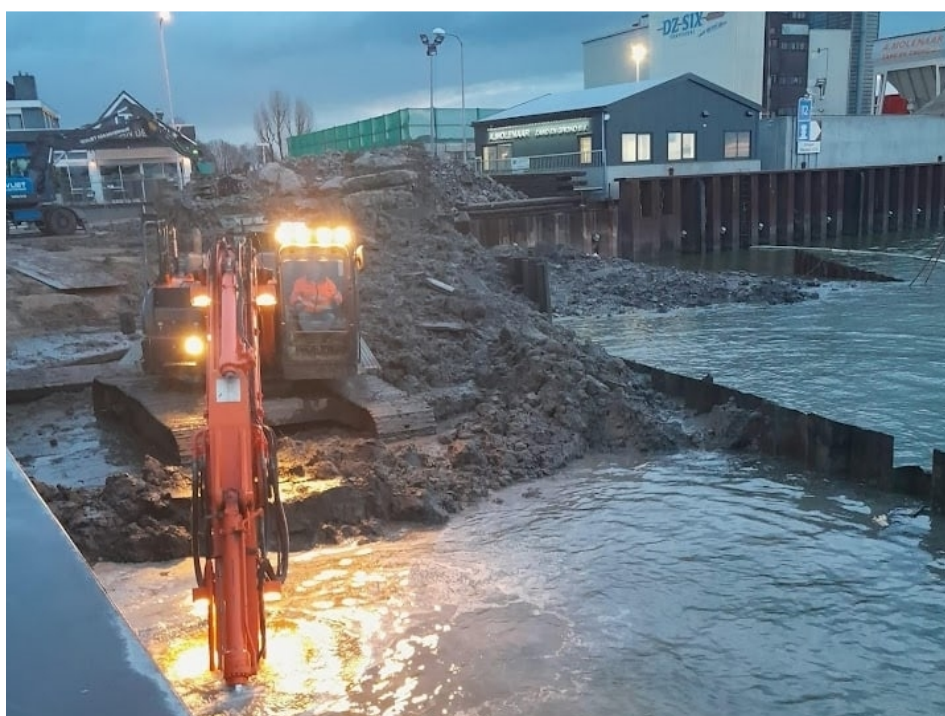

# 2023

- Hoge niet voorziene meerkosten door oorlog (staal)
- Subsidie van PZH +342.000 euro
- Extra krediet tussenrapportage 342.000 euro
- Oplevering project 30 juni 2023



2024

Zaken die nog aandacht nodig hebben vanuit gebruik veerdienst:

- Aanpassing overnachtingshaven veerdienst
- Diverse voorzieningen

Aanvullend krediet benodigd: 315.000 (1<sup>e</sup> TRP van 2024)

## Samenvatting financiële evaluatie

| Jaar | Aanvullend krediet | Totaal krediet |
|------|--------------------|----------------|
| 2019 |                    | € 2.100.000,00 |
| 2020 | € 595.000,00       | € 2.695.000,00 |
| 2021 | € 720.000,00       | € 3.415.000,00 |
| 2022 | € 1.000.000,00     | € 4.415.000,00 |
| 2023 | € 342.000,00       | € 4.757.000,00 |
| 2024 | € 315.000,00       | € 5.072.000,00 |
|      |                    |                |
|      | Subsidiant         | Subsidie       |
|      | RWS                | € 727.000,00   |
|      | PZH 1              | € 200.000,00   |
|      | PZH 2              | € 174.000,00   |
|      | PZH 3              | € 342.000,00   |
|      | HHSK               | € 50.000,00    |
|      |                    | € 1.493.000,00 |
|      |                    |                |
|      | Kosten gemeente    | € 3.579.000,00 |
