


BIJLAGE 2: Stappenplan definitief RES

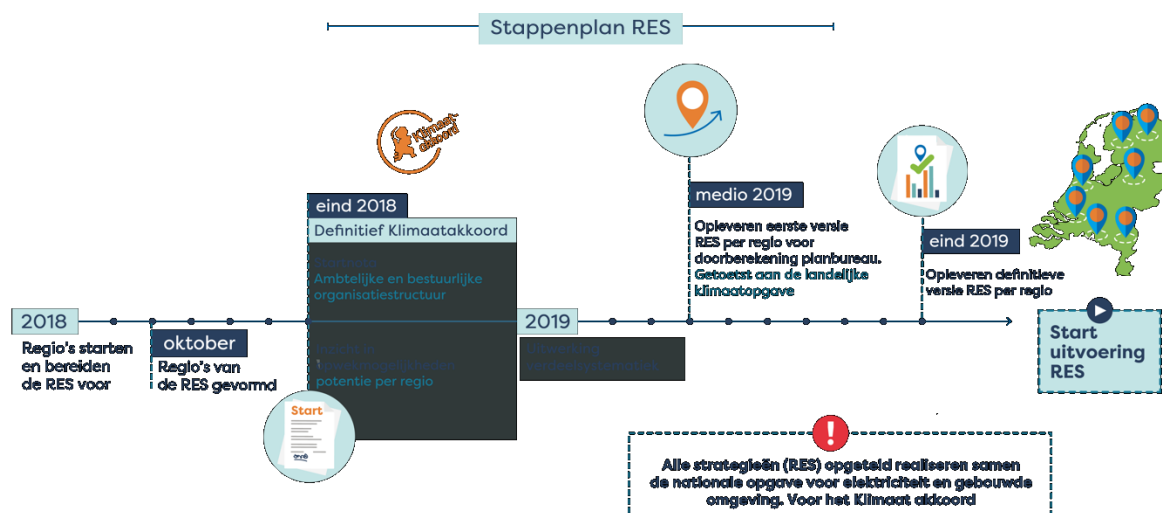

De volgende vier stappen worden onderscheiden om tot een definitieve RES voor de Metropool Regio Eindhoven te komen.

1. Inrichten werkstructuur en vaststellen startnotitie en plan van aanpak (oktober 2018 – februari 2019)

Er wordt een werkstructuur ingericht, die werkt met een opdracht vanuit de decentrale overheden. De eerste stap is het formeren van een Stuurgroep RES voor de Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit bestuurders van alle subregio's, de gemeenten Eindhoven en Helmond, provincie, waterschappen en Enexis. De Stuurgroep RES is in feite de regionale 'koplopersgroep' voor het thema energietransitie. In de Stuurgroep werken overheden en netbeheerder samen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Ook komt er een ambtelijke werkgroep RES, waarin dezelfde partijen zijn vertegenwoordigd.

Essentieel is dat naast overheden ook andere partijen/sectoren, zoals woningcorporaties, lokale energiecoöperaties, kennisinstellingen, het lokale bedrijfsleven, ZLTO en natuur- en milieuverenigingen goed zijn aangehaakt in het proces. Ook de samenwerking met de ODZOB en Brainport Development zal worden gezocht.

In december 2018 levert de Stuurgroep RES een startnotitie met plan van aanpak op. Alle gemeenteraden stellen vervolgens deze startnotitie vast (doorlooptijd t/m februari 2019). De startnotitie wordt ook voorgelegd aan Gedeputeerde Staten, het Dagelijks Bestuur van de waterschappen en de netbeheerder.

2. Inventarisatie en analyse (november 2018 – februari 2019)

Er wordt een uitgebreide actualisatie- en concretiseringslag van de regionale kanskaart energietransitie gemaakt, mede op basis van de data die de gemeenten

en subregio's al hebben uitgewerkt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een dynamisch model waarmee voor alle gemeenten de potentie voor duurzame warmte- en elektriciteitsopwekking in beeld wordt gebracht. De keuze voor het model wordt samen met Enexis, provincie en waterschappen gemaakt. De gemeenten die al een onderzoek hebben uitgevoerd, delen hun data voor deze inventarisatie.

3. Opstellen RES en formele besluitvorming voor regionaal bod (tot juni 2019)

In de periode tot juni 2019 wordt vervolgens aan een concept-RES gewerkt die zal worden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving¹.

Deze derde fase betreft een onderhandelingsproces, met als inzet het aantal windmolens, hectaren zonnenveld en overige energiebronnen in de regio, inclusief een duiding waar deze gaan worden opgesteld en wat dit betekent voor investeringen in energie-infrastructuur.

4. Uitwerken definitieve RES en uitvoeringsprogramma (tweede helft 2019)

Tussen juni en december 2019 wordt de definitieve RES uitgewerkt, met daarin heldere afspraken wat de opgave is voor elke regio en gemeente. Ook stellen we een regionaal uitvoeringsprogramma op. De definitieve RES wordt vastgesteld door alle gemeenteraden in de regio.

Vanaf 2020 begint de inpassing van regionale plannen in het omgevingsbeleid van provincies, gemeenten en waterschappen.

¹ Deze voorstellen worden in de zomer van 2019 als de regionale inzet geschakeld met de nationale opgave én afgewogen in het omgevingsbeleid van gemeenten en provincies. Dit betekent concreet dat op dat moment bezien wordt of alle RESsen samen op dat moment voldoende zijn om de nationale opgave te halen en passend zijn binnen de overige publieke belangen. De regio's krijgen dan, indien nodig, tot eind 2019 de tijd om de gehele nog resterende ambitie onderling te verdelen en de afweging te maken met de andere maatschappelijke opgaven. Indien de regio's niet tot een verdeling komen zal de opgave op basis van de door decentrale overheden in samenwerking met PBL te ontwikkelen verdeelsystematiek eind 2019 worden verdeeld. Eind 2019 moet de definitieve RES gereed zijn. In 2020 zullen gemeenten en provincies besluitvorming starten zodat de regionale inzet RES in het omgevingsbeleid kan worden opgenomen en verder worden uitgewerkt.
