



Pastoriebos

Participatieproces

Vooraf

Achtergrond

- Het Pastoriebos en de NH Kerk zijn al jaren een ruimtelijke eenheid.
- Het gebied is veranderd van agrarisch gebied, tot tuin, naar bos
- In het gebied hebben verschillende gebouwen gestaan waarvan sommige zijn gebleven en andere verdwenen
- Er ligt een bouwplan voor appartementen. Hiervoor moeten bomen worden gekapt
- Er is een ziekte in de sparren gekomen, waardoor alle sparren moeten worden gekapt.

Probleem

- Een gedeelte van Voorthuizen heeft zich tegen het bouwplan en de kap van de bomen gekeerd

Vooraf

Doel

- Zorgen dat in samenspraak met betrokkenen de natuurwaarden van het Pastoriebos hersteld worden

Resultaat

- Een hersteld pastoriebos waar het goed toeven is

A large orange circle is positioned on the left side of the slide, partially cut off by the edge.

Opzet projectplan

- Participatie thermometer
- Afbakening en kaders
- Belangengroepen
- Het participatieproces
- De planning
- De kosten



Participatie Thermometer Pastoriebos

Regulier proces

Algemeen belang:	weinig (2)
Media/politieke aandacht:	niet (1)
Impact op mens en leefomgeving:	weinig (2)
<u>Kring van Belanghebbenden:</u>	<u>buurt (3) +</u>
Participatie trede:	Informereren (of raadplegen)

Huidige proces

Algemeen belang:	weinig (2)
Media/politieke aandacht:	heel veel (5)
Impact op mens en leefomgeving:	weinig (2)
<u>Kring van Belanghebbenden:</u>	<u>dorp (4) +</u>
Participatie trede:	Adviseren (of co-creatie)

Wat betekent adviseren of co-creatie voor proces

- Gemeente bepaald kaders voor het project (en houdt deze zo simpel mogelijk)
- Omgeving kleurt samen met ons de ruimte binnen de kaders in.
- Dit houdt in dat wij:
 - Zonder ontwerp het planproces in gaan
 - Ideeën en wensen van de omgeving serieus nemen
 - De dilemma's die wij tegenkomen bespreken met omgeving



Afbakening en kaders

Afbakening en kaders

- Het plan wordt alleen voor het gemeentelijk deel van het Pastoriebos gemaakt
- Het plan moet voldoen aan de wettelijke kaders (o.a. flora en fauna, archeologie, bodem)
- Het moet veilig zijn (veilig om te spelen en te verblijven)
- Het moet beheersbaar zijn door onze dienst (tijd, apparatuur, geld)
- Het moet uitvoerbaar zijn (werken in bestaande groene omgeving geeft beperkingen)
- Het moet toekomst gericht zijn (opgewassen tegen de klimaatverandering en voldoende levensduur hebben)
- Het moet passen binnen het beschikbare budget
- Het moet aansluiten bij de historische waarden in het gebied



Belangengroepen

- Mensen die in het gebied wonen / werken
- Omwonenden van de Jan Steenstraat, Rembrandtstraat en Kerkstraat
- 3 wijkplatforms
- Plaatselijk belang
- IVN
- Geïnteresseerden Voorthuizen
- Voorthuizen algemeen



Welk verschil zou ik daarin willen maken?

Mensen/ groepen die actief mee willen doen


- Deelnemen aan de omgevingswerkgroep

Mensen/ groepen die passief geïnformeerd willen worden via andere kanalen


- Projectpagina gemeentelijke website, nieuwsbrief en /of Informatie middag/ avond
- 

Indeling belangengroepen

1. Mee-ontwerpen
2. Mee-denken
3. Mee-weten

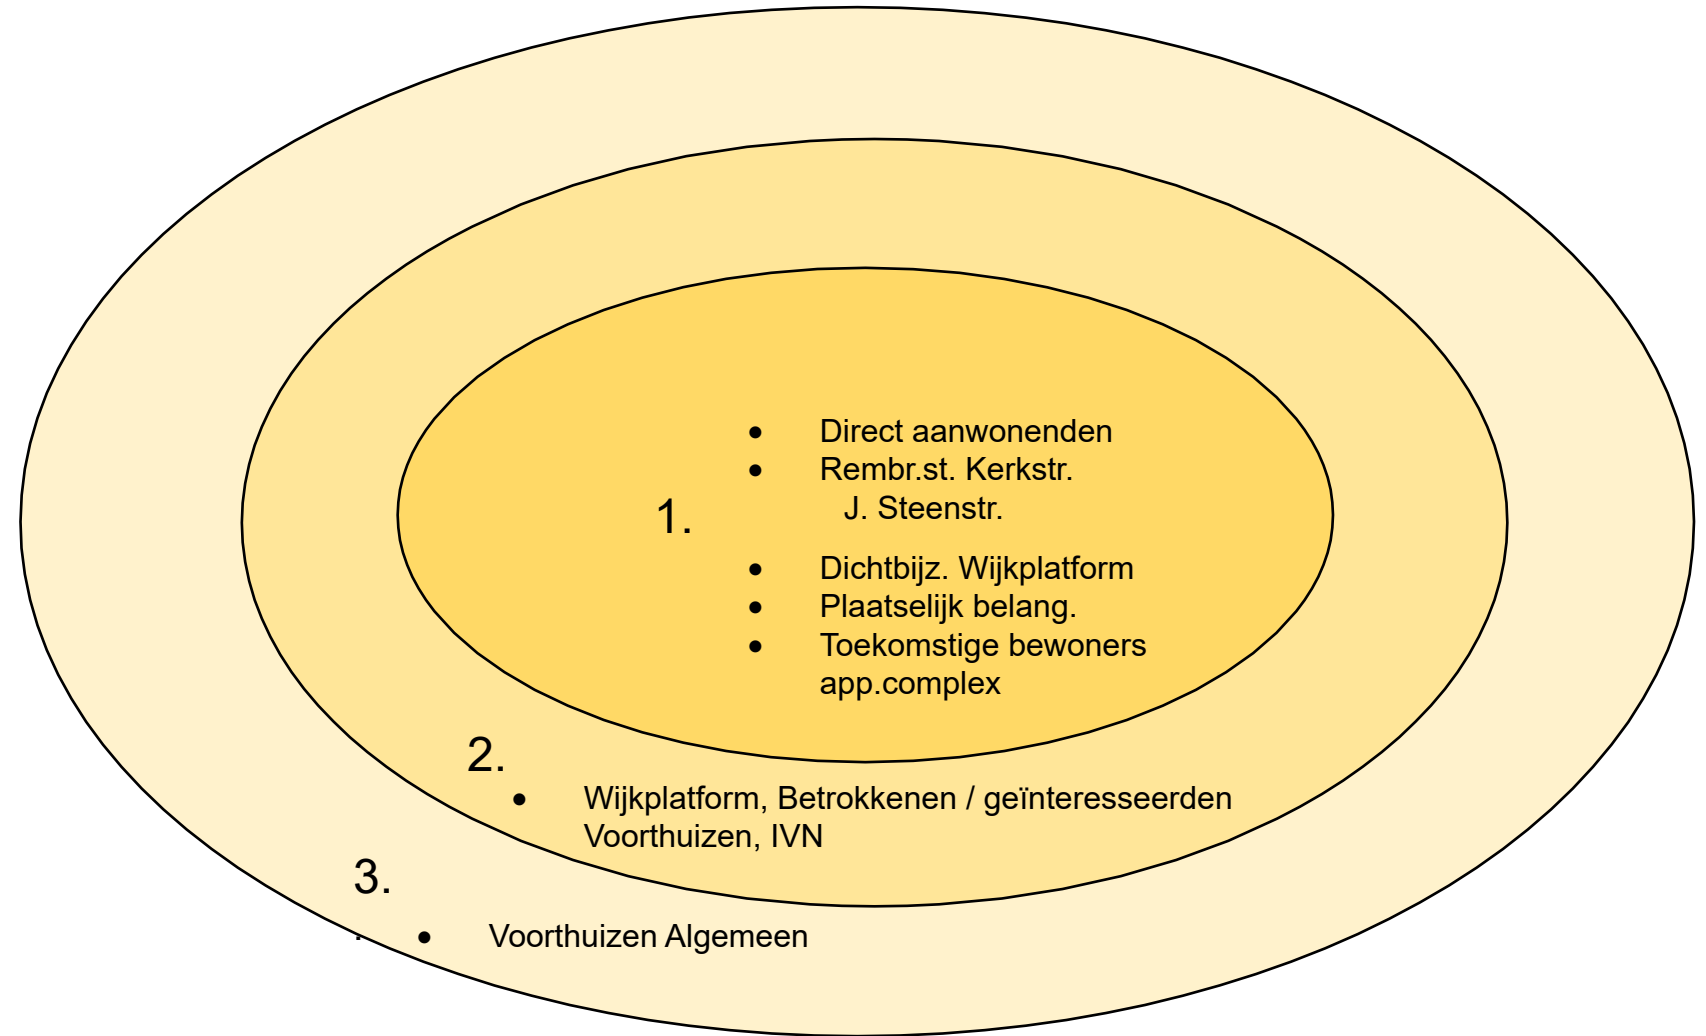


Het participatieproces

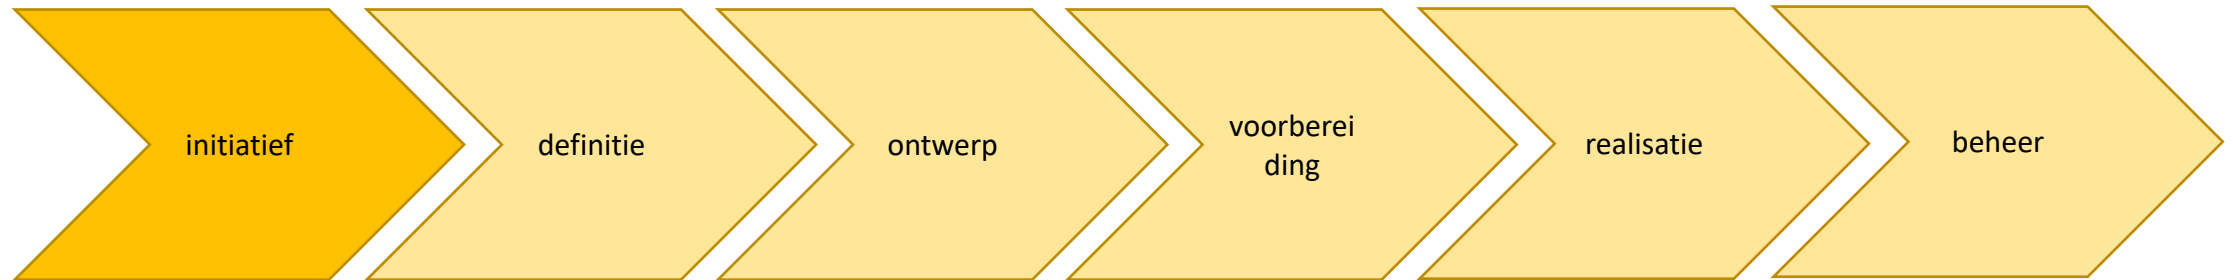

Initiatieffase en participatie

- Contacten leggen en oproep om deel te nemen aan werkgroep
- Samenstellen van de werkgroep


Het participatieproces

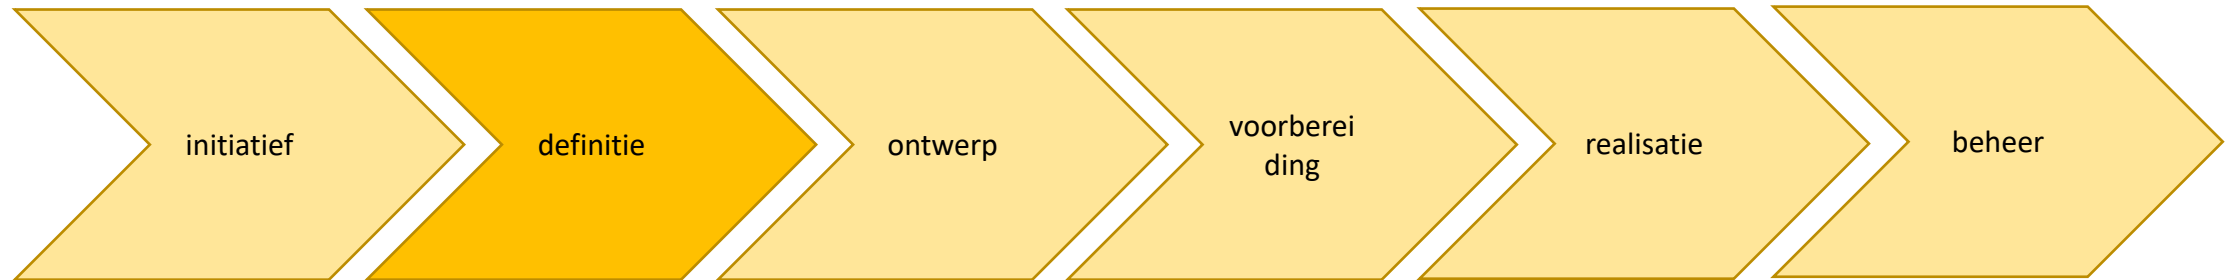

Definitiefase en participatie:

- Uitleggen van de spelregels van het participatieproces en vaststellen van de rollen (wij gaan aanslag met de input van de groep en bespreken de resultaten met de werkgroep)
- Met de werkgroep aanvullen van het programma van eisen (dit kan informeel, door het delen van dromen, wensen en irritaties en een wandeling door het gebied)
- Bepalen van de voorzittersrol van de omgevingswerkgroep

Het participatieproces

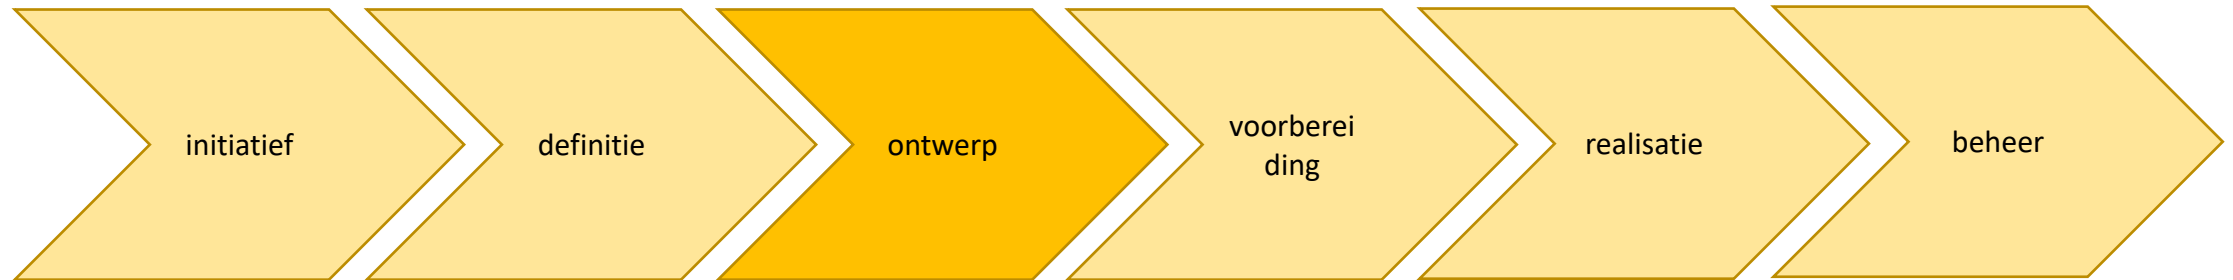


Ontwerpfase en participatie (mogelijke opzet, afhankelijk van inzet deelnemers)

- 3 bijeenkomsten voor ontwikkelen voorlopig ontwerp (ideeën, concept VO en definitief VO)
- Informatiemoment Voorhuizen
- 2 bijeenkomsten voor ontwikkelen definitief ontwerp (concept DO en definitief DO)
- Informatiemoment Voorhuizen

Optie excursie met werkgroep


Het participatieproces

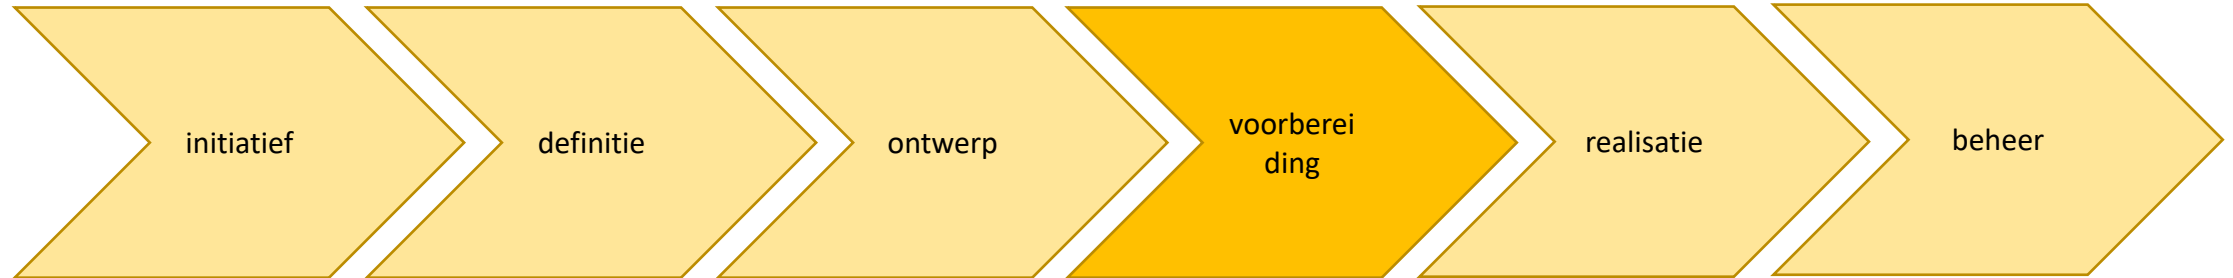

Vorbereidingsfase en participatie:

- Het ontwerp wordt uitgewerkt in een contract en het contract wordt aanbesteed
- Geen participatie in deze fase (intern proces), tenzij er grote inhoudelijke wijzigingen nodig zijn


Het participatieproces

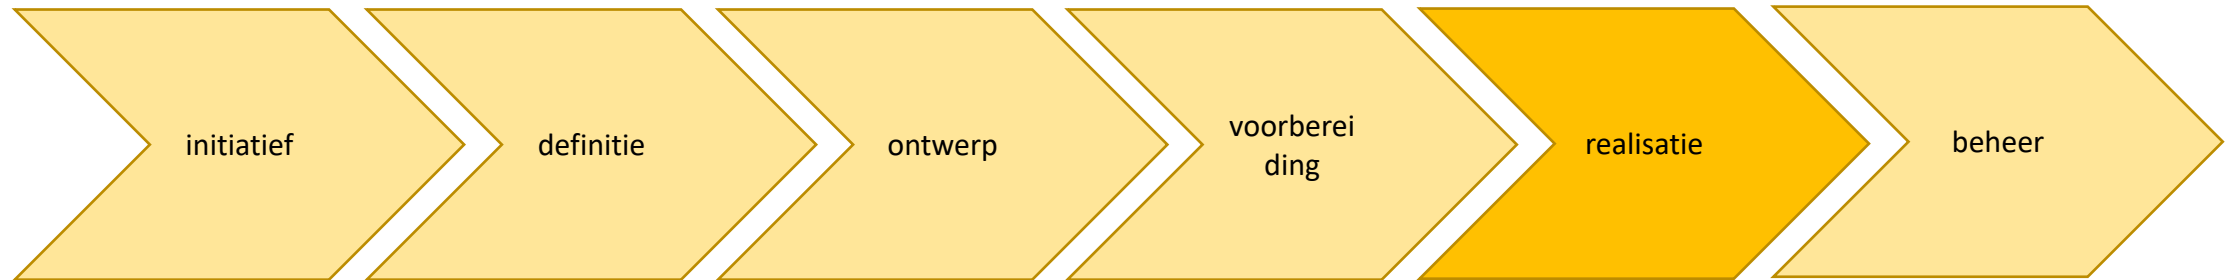

Realisatiefase en participatie:

- Informeren omwonenden over de start van de uitvoering
- Kennis maken met de omgevingsmanager of voorman van de aannemer

Het participatieproces

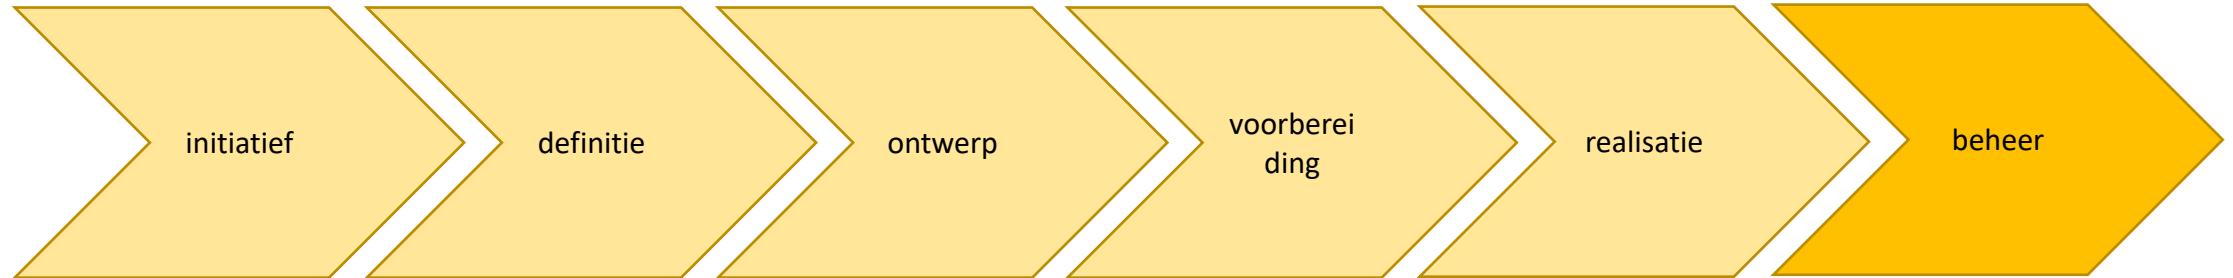

Beheerfase en participatie:

- Eindactiviteit om de herinrichting te vieren
- In de beheerfase zijn er geen bijzonderheden ten aanzien van participatie, tenzij afgesproken is dat de omgeving een deel van het gebied zelf wil beheren
