

Aan colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de 21 deelnemende gemeenten

uw kenmerk	uw brief van	ons kenmerk 100176-4253/BMA/WBR	datum 9 juli 2026
onderwerp Versnellingsafspraken MRE-gemeenten en Enexis voor het laag- en middenspanningsnetwerk		e-mailadres [REDACTED]	

Geachte colleges en raden,

Hierbij informeren we u over de gemaakte samenwerkings- en versnellingsafspraken tussen de 21 MRE-gemeenten en netbeheerder Enexis. Deze zijn vastgelegd in de Nadere Overeenkomst (NOK). Het doel van de afspraken is om de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk te versnellen door de werkprocessen van Enexis en de gemeenten op elkaar af te stemmen en de afspraken tussen gemeenten te harmoniseren. Om een 'rijdende trein' te creëren, waarmee we de beoogde uitbreidingen op zo snel en efficiënt mogelijk in de regio kunnen uitvoeren. Dit is onderdeel van de Brainportaanpak netcongestie, waarbinnen we in de regio werken aan een maatregelenpakket voor snellere netuitbreiding en beter benutten van het net. Zie hiervoor ook de informatiebrieven vanuit MRE van 16 maart en 14 april 2026.

De samenwerking is gericht op een snellere netuitbreiding

Enexis, MRE en Brainport Development zijn eind 2024 een samenwerking aangegaan met het doel om de uitbreiding van het laag- en middenspanningsnetwerk van Enexis¹ te versnellen. De ambitie is om de doorlooptijd van infrastructurele projecten minimaal te halveren. Ook zoeken we samen naar slimme oplossingen om het huidige elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken.

Naast uitbreiding van het hoogspanningsnet van TenneT is immers ook de snelle uitbreiding van het laag- en middenspanningsnetwerk essentieel. Via dit deel van het netwerk komt stroom naar de wijken en buurten. Om de groei in de regio mogelijk te maken zijn grote investeringen nodig. De ontwikkeling van de regio vraagt om ruim 4.000 kilometer extra kabel in de grond, meer dan 80 transportverdeel- en regelstations, 2.900 nieuwe netstations en 2.600 transformatorverzwaringen. Hiervoor moet elke buurt aangepakt worden en zal 1 op de 3 straten open moeten.

¹ Het hoogspanningsnetwerk van TenneT zit niet in de scope van de afspraken.

Er zijn afspraken per processtap gemaakt

De doorlooptijd van deze projecten wordt bepaald door de samenwerking tussen gemeenten en Enexis. Hoe snel we samen geschikte locaties vinden, planologische procedures doorlopen en de buurt betrekken, et cetera. In de afspraken maken we expliciet welke rol gemeente en Enexis hebben in elke processtap, welke verwachtingen er over en weer zijn en hoe we elkaar hier op mogen aanspreken. Zo voorkomen we dat discussies per project herhaald worden. Er zijn afspraken gemaakt over:

- hoe we tot geschikte locaties komen;
- de inzet van publieke gronden;
- reserveren van gronden in toekomstige gebiedsontwikkelingen;
- voorwaarden voor grondverkoop of erfpacht in voor laagspanning en verkoop voor middenspanning.
- op welke manier en waarover de buurt kan participeren of geïnformeerd wordt;
- hoe gemeente en Enexis samen de volgorde van uit te breiden buurten bepalen;
- wanneer gecombineerde werkzaamheden wel of niet mogelijk zijn;
- behandeling van vergunningsaanvragen.

Gemeenten worden ondersteund vanuit het Realisatiebedrijf MRE

Om het beoogde doel van een minimale halvering van de doorlooptijd van realisatie van infrastructurele projecten in de gemeenten te bereiken, is per 1 januari 2026 vanuit Enexis en MRE een regionaal realisatieteam energie-infrastructuur vanuit Enexis en MRE gestart. Dit realisatieteam maakt deel uit van het Realisatiebedrijf MRE. Het realisatieteam ondersteunt gemeenten en Enexis bij het behalen van de beoogde realisatie. Door bijvoorbeeld capaciteit te leveren als dit lokaal niet beschikbaar is, projecten aan te jagen of kennisoverdracht tussen de projecten en haar deelnemers te faciliteren.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is daarnaast een apart team georganiseerd dat, als gemeenten daar gebruik van willen maken, de beoordeling gaat doen van alle Enexis-projecten in die gemeente. Zo zorgen we voor een snelle en herkenbare vergunningverlening, binnen het takenpakket van de Omgevingsdienst per gemeente.

Met deze afspraken zetten we een belangrijke stap naar versnelling

Met deze afspraken halen we de beoogde ambitie nog niet; er is meer nodig. In de komende periode werken we aan afspraken tussen Enexis en gemeenten over aanvullende thema's. Hierbij kunt u denken aan het financieel kader voor planologische procedures, integreren van vergunningsprocedures, of ruimtelijke en/of landschappelijke inpassing. We informeren u wanneer dit leidt tot een volgende fase van versnellingsafspraken tussen de MRE-gemeenten en Enexis.

Tegelijkertijd blijven we ook werken aan de andere acties die zijn opgenomen in de Brainportaanpak netcongestie. Over de voortgang daarvan houden wij u uiteraard ook periodiek op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

het Dagelijks Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven,

de secretaris,


de voorzitter,

G.A.G.H. Wouters.

J.R.V.A. Dijssebloem.

Bijlage: visualisatie laag- en middenspanningsnetwerk

Wilt u meer weten of het laag- en middenspanningsnetwerk dan kunt u informatie vinden op de website van Enexis via: [Middenspanningsstations](#) | [Enexis Netbeheer](#) of [Elektriciteitshuisjes in uw buurt](#) | [Enexis Netbeheer](#).

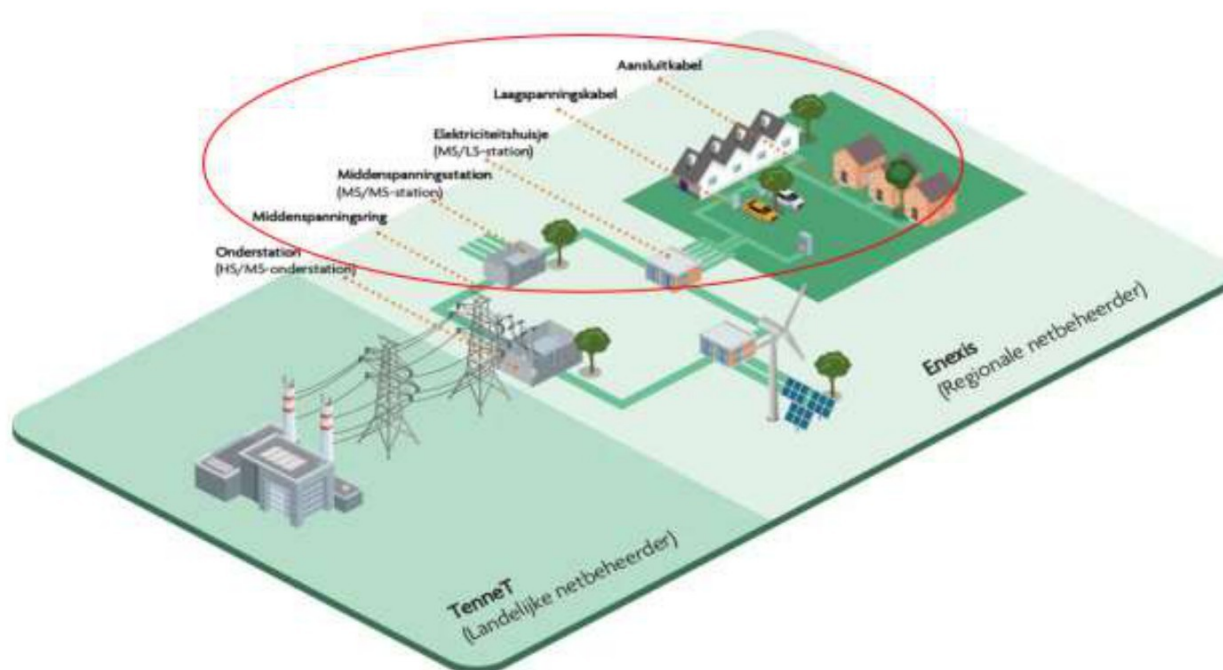

Afbeelding:

Transport van elektriciteit. Van hoogspanning naar laagspanning. In het rood is weergegeven waar de afspraken betrekking op hebben.
