

**Presentatie Raad en Commissie
27 Juni 2022**

Sociaal Domein in Balans


27 Juni 2022



AGENDA



Project



Terugblik



Voortgang & Vooruitblik

Hoofdpdracht Project

Opdracht van de raad (18-02-2021):

Akkoord te gaan met de inrichting van een vervolgfase voor een samenhangende projectmatige aanpak voor de uitwerking en uitvoering van de 14 beheersmaatregelen (*Rapport: Sociaal domein financieel in balans*).

Dit betekent: gericht op meer grip en sturing in het Sociaal Domein

Waarom project *Sociaal Domein in Balans*?

Startpunt: Rapport *Sociaal Domein financieel in Balans*

- Analyse op meest kritieke vraagstukken in Sociaal Domein vertaald in 14 beheersmaatregelen
- Besluit in de raad voor het programma Sociaal Domein in Balans
- Omvang programma en projecten

Project 1
Organisatie en Inrichting

Project 2
Managen van informatie


Van 4 stromen met 12 beheersmaatregelen naar 4 projecten

Project 3
Focus in
(Preventie)Beleid

Project 4
Lokale samenwerking
binnen regionale
Inkoopssystematiek

Project 1

Organisatie en Inrichting

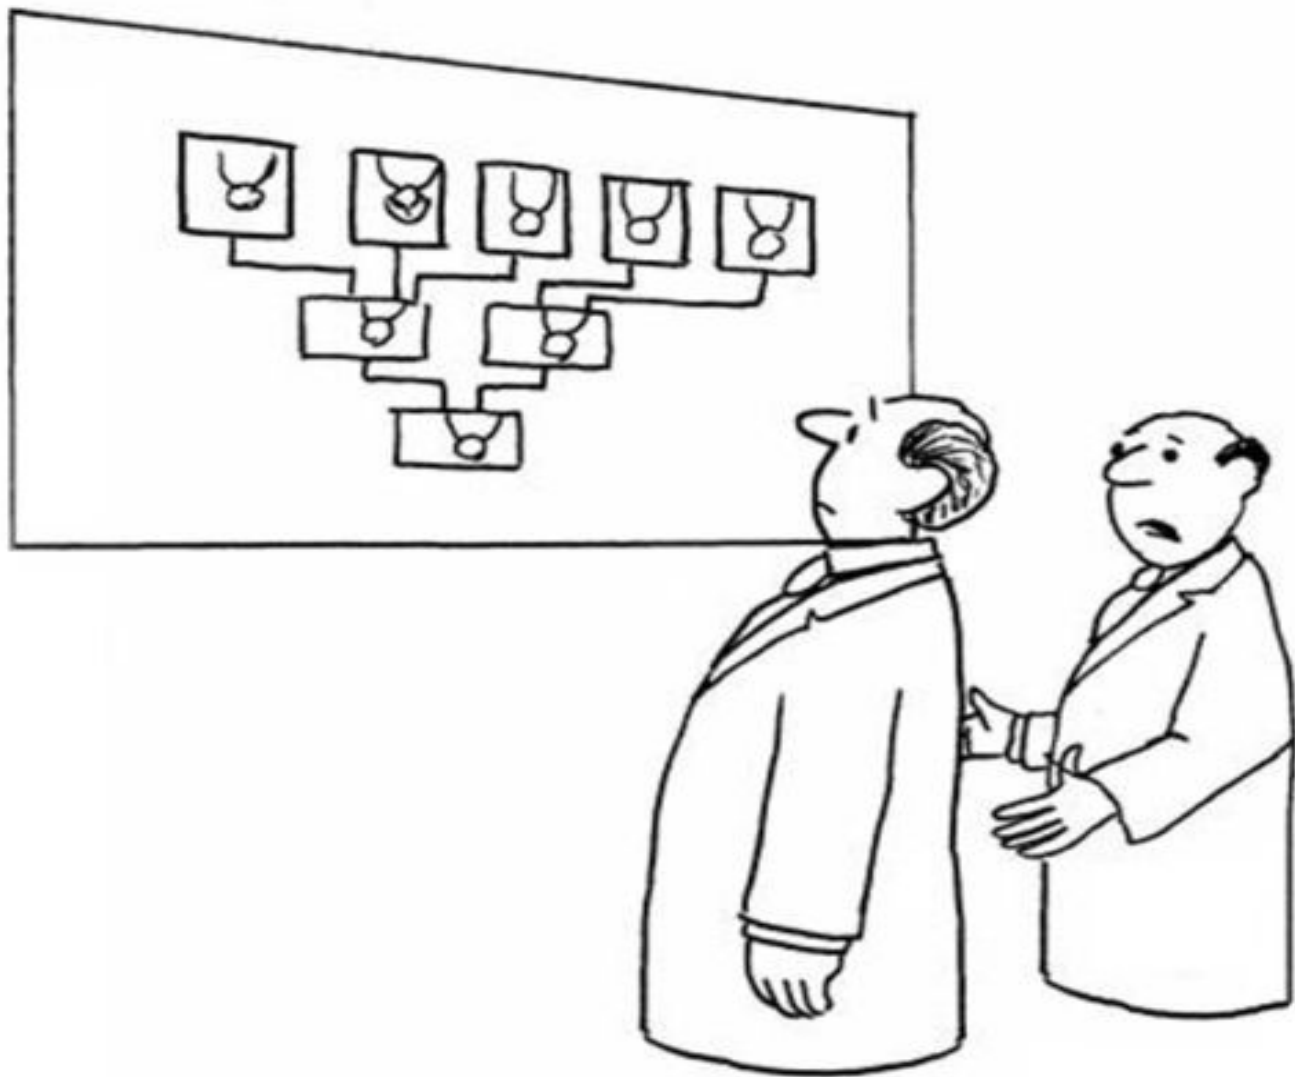


"It was accidentally reversed one day and our profits immediately skyrocketed"

De deelresultaten

- Herontwikkeling en herinrichting toegang
- Financieel Beheer op orde
- Continuïteit, kwaliteit en werkplezier bij professionals in het Sociaal Domein op gewenst niveau

Project 1

Organisatie en Inrichting

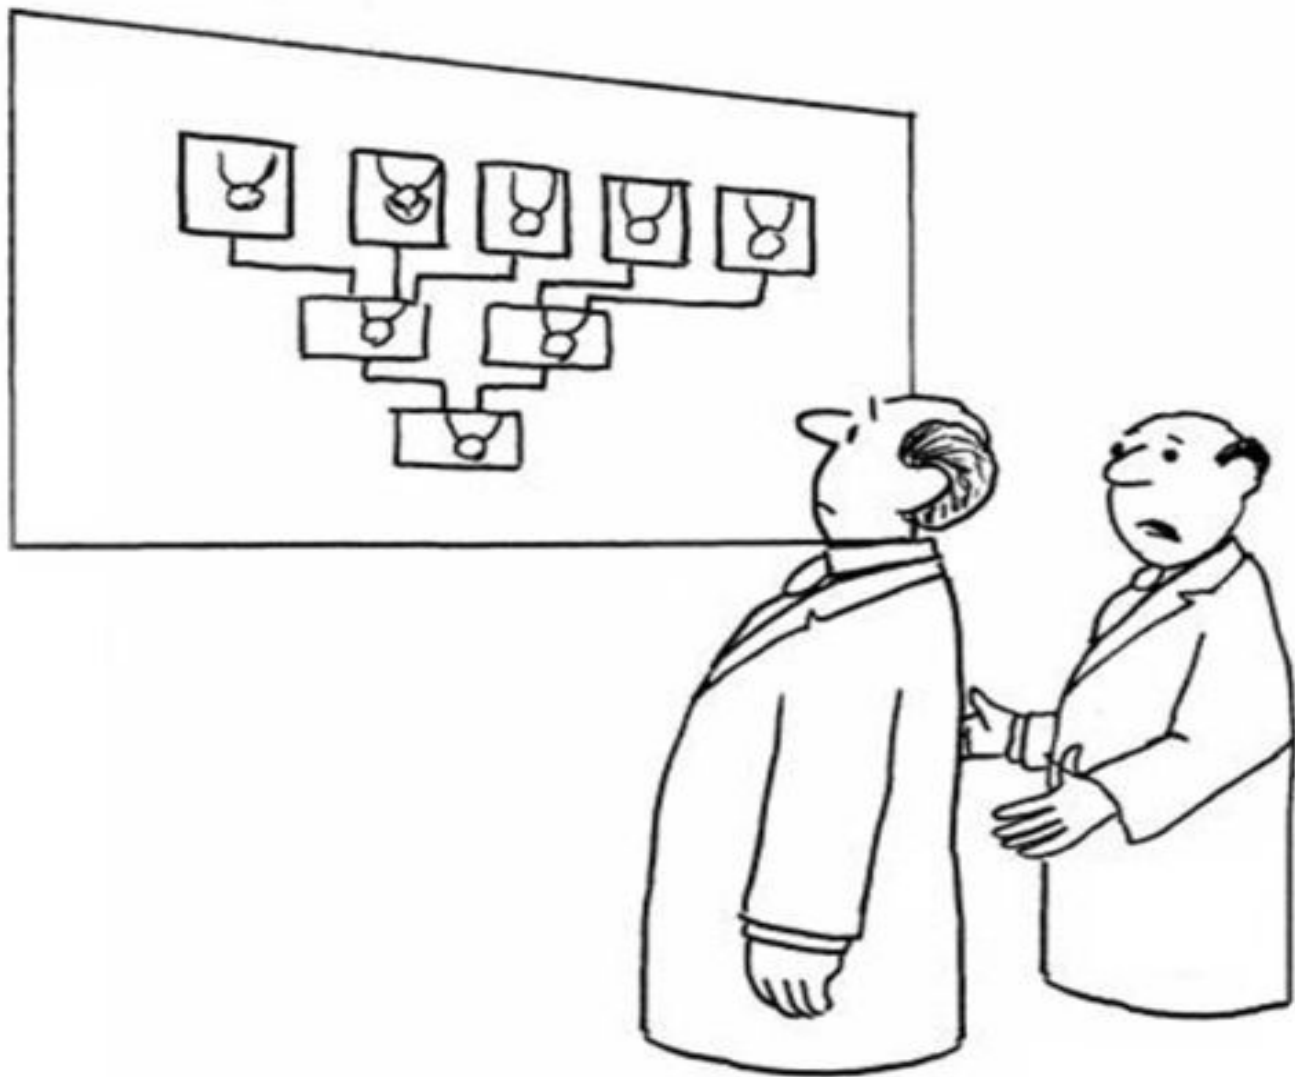


"It was accidentally reversed one day and our profits immediately skyrocketed"

Voortgang

- Herontwikkeling en herinrichting toegang: twee scenario's & toetsen stakeholders
- Financieel Beheer op orde: deelprojectleider gestart
- Continuïteit, kwaliteit en werkplezier bij professionals in het Sociaal Domein op gewenst niveau: Opstarten planning na gekozen model

Project 1

Organisatie en Inrichting

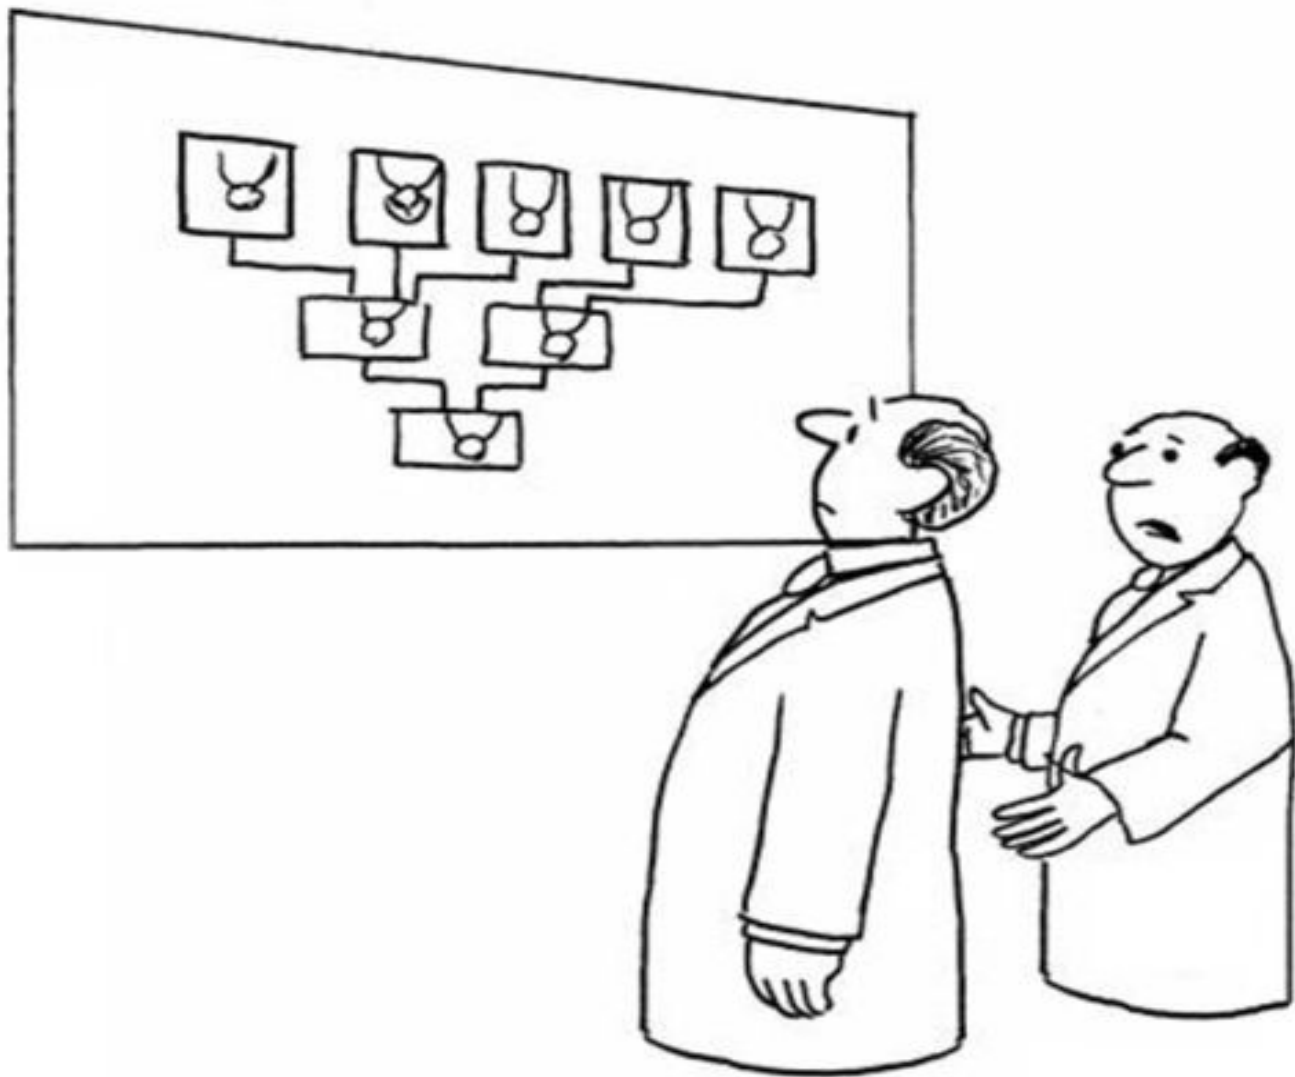

"It was accidentally reversed one day and our profits immediately skyrocketed"

Vooruitblik

- Herontwikkeling en herinrichting toegang: keuze model voor zomerreces genomen, aansluiting bij organisatieontwikkeling
- Financieel Beheer op orde: deelprojectplan voor zomer gereed
- Continuïteit, kwaliteit en werkplezier voor alle professionals in het Sociaal Domein op gewenst niveau: nulmeting start na het zomerreces

Project 1

Organisatie en Inrichting

Tijdspad

Kwartaal 3 2021	Kwartaal 4 2021	Kwartaal 1 2022	Kwartaal 2 2022	Kwartaal 3 2022
September: Start project projectbrief	Oktober, november, december: - Projectplan - Nulmeting huidige situatie - Onderzoek andere gemeenten naar inrichting toegang	januari, februari, maart: Afronding onderzoek andere gemeenten	april, mei, juni: - Twee scenario's voor inrichting toegang - Nulmeting huidige processen - Klankbord sessies inrichting toegang - Start deelproject financieel beheer op orde	juli, augustus september: - Besluitvorming inrichtingsmodel toegang - Implementatieplan inrichtingsmodel en migratieplan (tot en met 1^e kwartaal 2023 (=einde project) en verder) - Advies en rapportage financieel beheer op orde - Start nulmeting Professionele cultuur (kwaliteit en kwantiteit formatie)

Project 2

Managen van informatie

Deelresultaten

- ICT oplossingen op orde:
- Processen op orde
- Dashboard



Project 2

Managen van informatie


Voortgang

- ICT oplossingen op orde: implementatie bij de Jeugd gerealiseerd
- Processen op orde: externe ondersteuning gestart, pakket vastlegging processen aangeschaft
- Dashboard: aanvraag systemen datamanagement bij Informatie Management & samenwerking data analyst wordt gezocht



Project 2

Managen van informatie

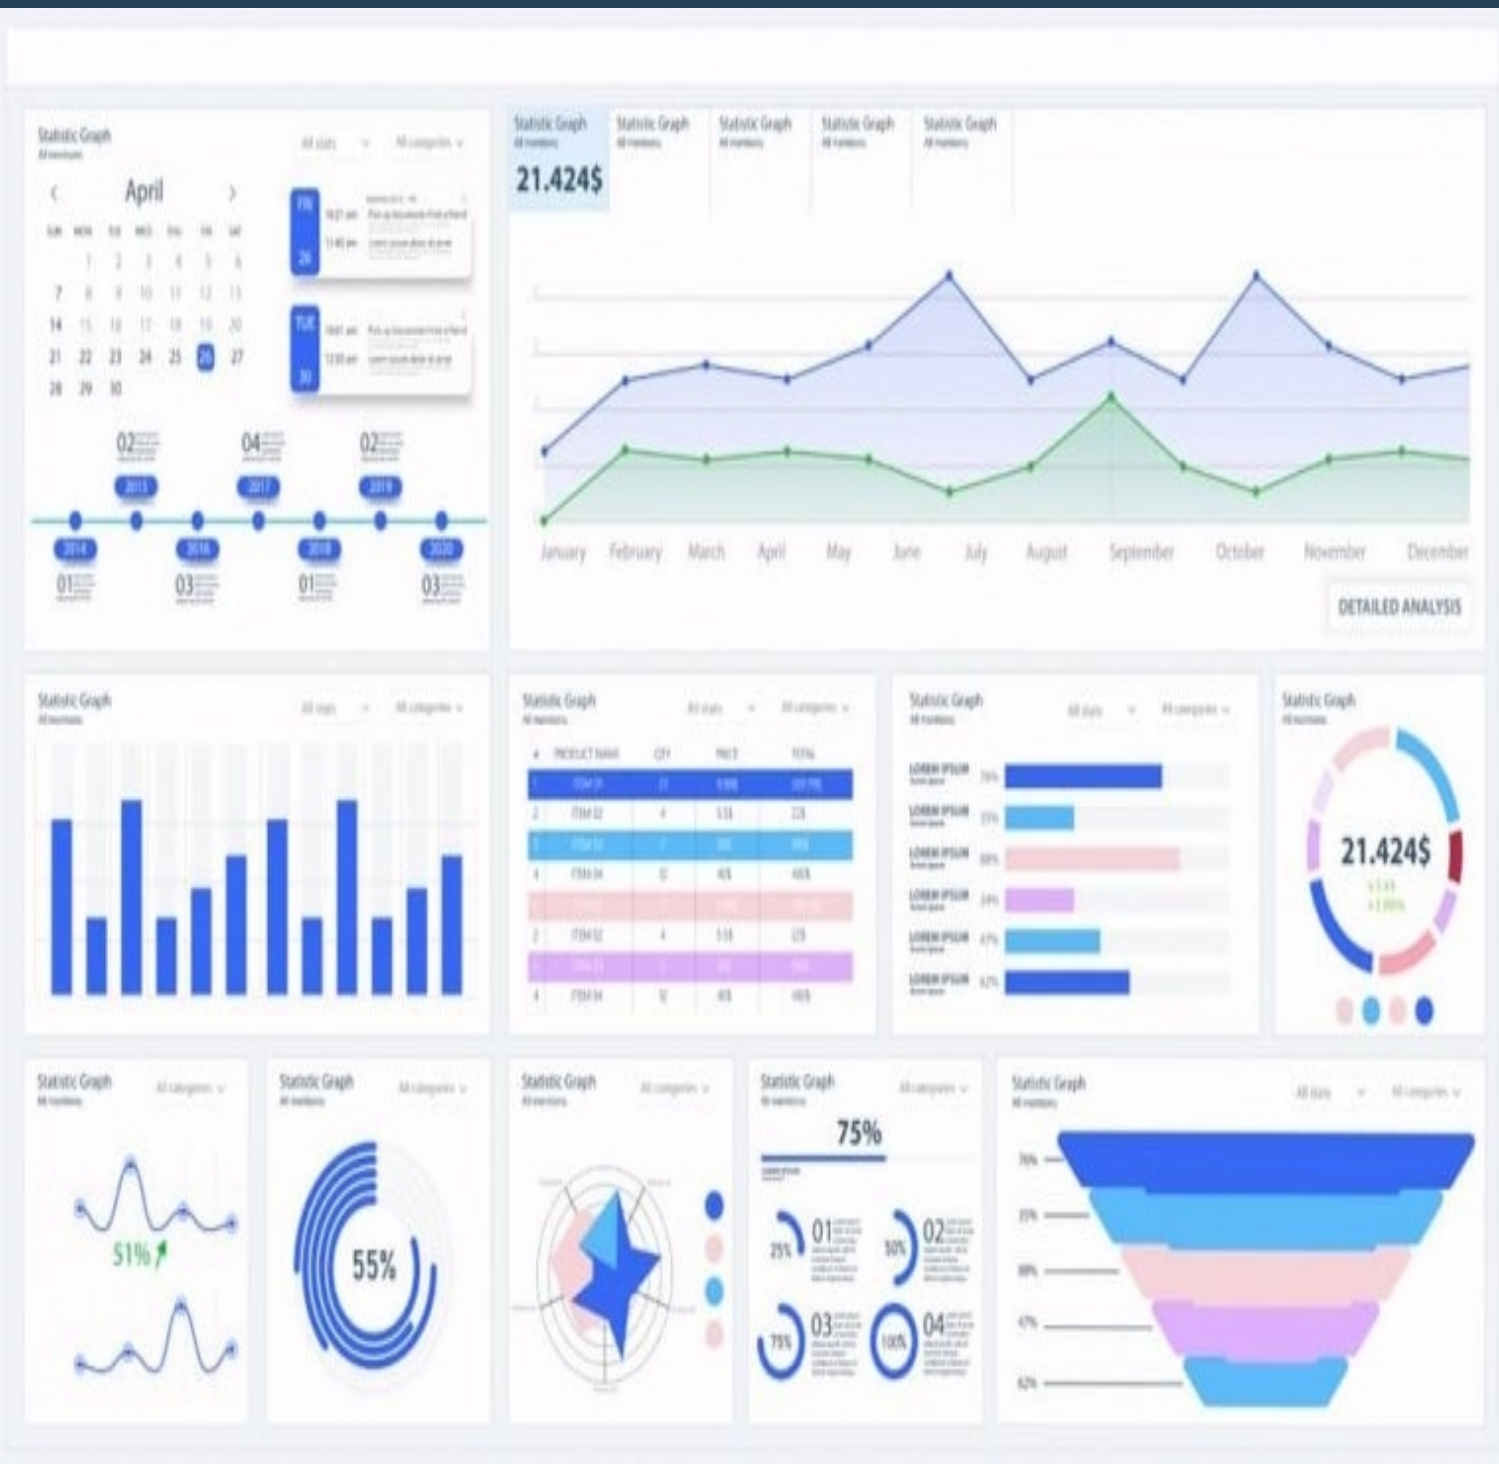

Vooruitblik

- ICT oplossingen: implementatie ICT-oplossingen bij de Wmo na zomerreces afgerond
- Processen op orde: uitwerking verschillende processen van diverse afdelingen met daaraan te koppelen proceseigenaar
- Dashboard: samenwerking met de netwerkorganisatie is essentieel. Vertraging op voortgang vanwege privacy wetgeving. Besluit is genomen, voortgang kan plaats vinden

Project 2

Managen van Informatie

Tijdspad

Kwartaal 3 2021	Kwartaal 4 2021	Kwartaal 1 2022	Kwartaal 2 2022	Kwartaal 3 2022
Juli: - Start project projectbrief Augustus september: - Projectplan gereed	Oktober, november, december: Nulmeting ICT op orde	januari, februari, maart: - Nulmeting processen en beschrijving huidige processen - Start nulmeting dashboard - Start Implementatie regiesysteem Jeugd (ICT op orde)	april, mei, juni: - Beschrijving huidige processen (vervolg) - Aanschaf softwarepakket processen - Implementatie regiesysteem Jeugd afgerond (ICT op orde) - Opdracht DeSom voor inrichting 2 datalakes (dashboard)	juli, augustus september: - Beschrijving huidige processen vertalen naar gewenste situatie: beschrijving gewenste situatie gekoppeld aan gekozen inrichtingsmodel - Start Implementatie regiesysteem WMO (ICT op orde) - Start ontwerp dashboard

Deelproject 3 (Preventie)Beleid



Deelresultaten

- Uitvoerbaar en realistisch effectief preventiebeleid (visie, beleid, uitvoering, inrichting)
- Passende methodieken geïmplementeerd
- Versterken verbinding voorliggend veld

Deelproject 3 (Preventie)Beleid



Voortgang

- M.b.t. alle deelresultaten geldt dat project in de onderzoeksfase is. De interne interviews zijn afgerond & landelijk, regionaal en lokaal beleid is in beeld gebracht

Deelproject 3 (Preventie)Beleid



Vooruitblik

- Eerste kwartaal 2023 leveren we preventiebeleid op voor alle drie de deelresultaten
- Financiële doorrekening van conceptkader volgt
- Dit deelresultaat wordt meegenomen in het nieuwe 4-jarige beleidsplan Sociaal Domein

Project 3

Preventie(beleid)

Tijdspad

Kwartaal 3 2021	Kwartaal 4 2021	Kwartaal 1 2022	Kwartaal 2 2022	Kwartaal 3 2022
	Oktober, november, december: Start project en nulmeting/vooronderzoek	januari, februari, maart: - Projectplan - Vervolg nulmeting/onderzoek	april, mei, juni: Rapportage onderzoek	Juli, augustus september: Opstellen preventiebeleid/concept kader met speerpunten

Deelproject 4

Lokale samenwerking binnen regionale inkoopsystematiek



Deelresultaten

- Snelle start van zorg
- Inzicht in huidige financiële context
- Up-to-date kennis en kunde van professionals

Deelproject 4

Lokale samenwerking binnen regionale inkoopsystematiek



Voortgang

- Voor alle drie de deelresultaten geldt dat Fase 1 gereed is, namelijk data verzameling en data analyse – foto van huidige en gewenste situatie- zijn afgerond.

Deelproject 4

Lokale samenwerking binnen regionale inkoopssystematiek



Vooruitblik

- Voor alle drie de deelresultaten, te weten:
 1. Snelle start van zorg
 2. Inzicht in de huidige financiële context
 3. Up-to-date kennis en kunde van professionals

geldt dat er een intern onderzoek heeft plaats gevonden

Deelproject 4

Lokale samenwerking binnen regionale inkoopsystematiek



Vooruitblik

- Onderzoek leidt tot twee type adviezen, namelijk:
 1. Adviezen die geïntegreerd worden in de andere deelprojecten of de staande organisatie
 2. Adviezen die opgepakt worden in Fase 2 van het project in de samenwerking met de regio

Deelproject 4

Lokale samenwerking binnen regionale inkoopssystematiek

Tijdspad



VRAGEN EN REACTIES?
