

Fasering Singel van Zwolle


Datum: 6-11-2025
Versie: 1.6 (concept)

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.
De inhoud is indicatief en aan verandering onderhevig.



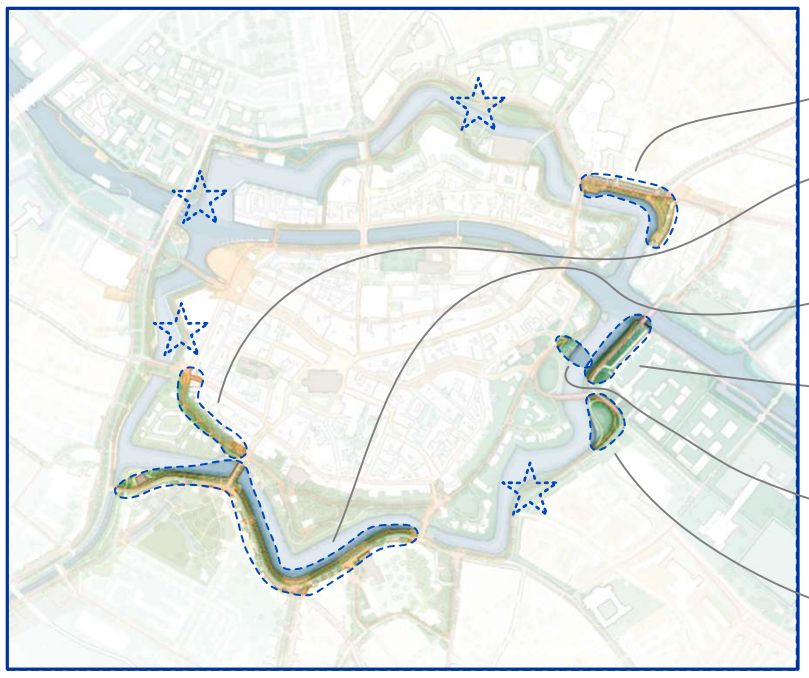

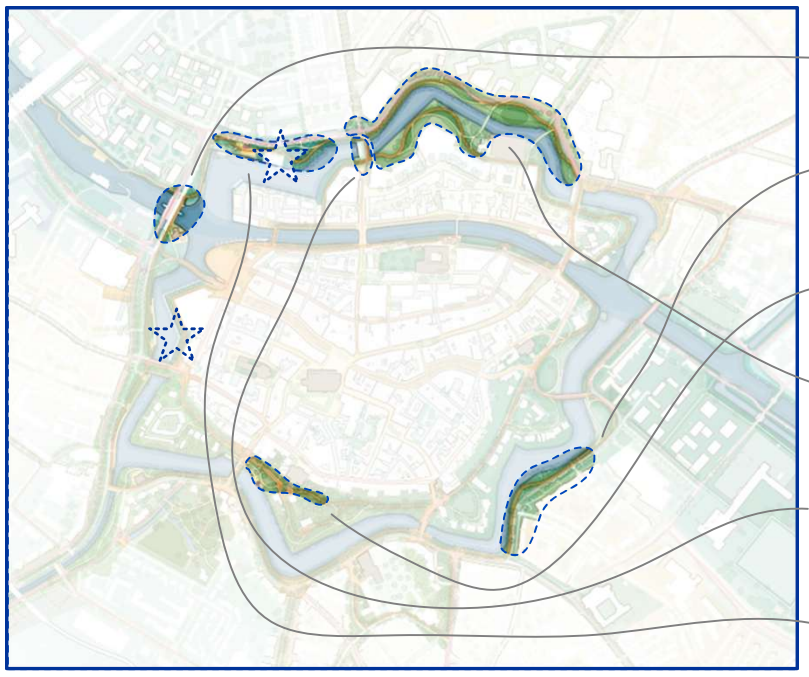

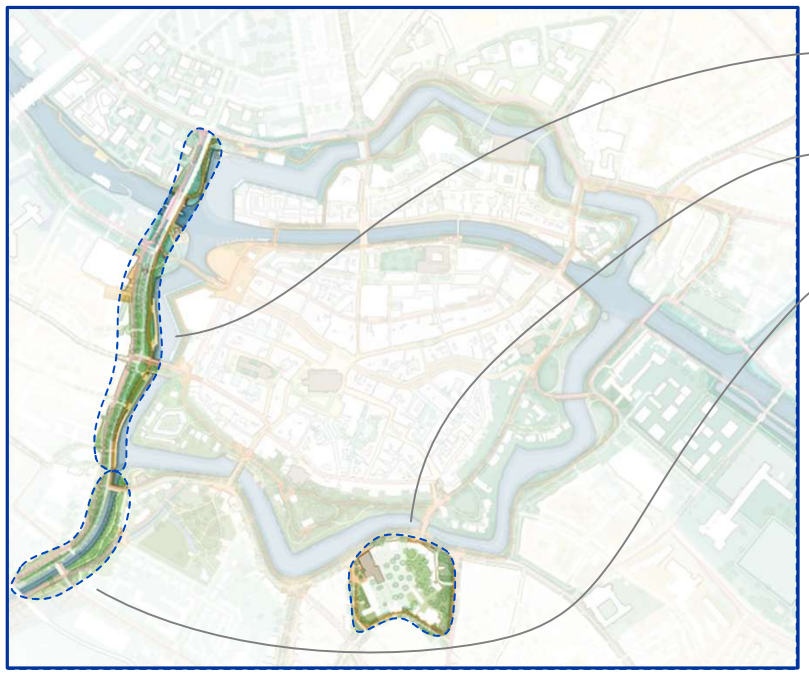

	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	Na 2034	Aandachtspunten
Fase 1 – Zo snel mogelijk								
Diezerkade €	Ontwerp en voorbereiding	Uitvoering	Oplevering					2026: Deadline subsidie provincie
Eekwal (en omgeving) €		Ontwerp en voorbereiding	Uitvoering	Oplevering				
			! Eekwal na Zuidwestelijk kwadrant fase 1					
Burgemeester van Roijensingel €		Ontwerp en voorbereiding	Uitvoering Fase 1	Uitv F2	Oplevering			2032: Deadline subsidie rijk
Groot Weezenland noord €		Ontwerp en voorbereiding	Uitvoering	Oplevering				
Kerkbrugje €		Ontwerp en voorbereiding	Uitv					Einde levensduur Kerkbrugje
Driehoek €					Ontwerp en voorbereiding	Uitv	Oplevering	
					Uitvoering tijdens afbbuw hub Weezenlanden	!		
Fase 2a – Bereidt planvorming voor								
Hofvlietbrug (en omgeving) €			Ontwerp en voorbereiding	Uitv	Oplevering			Deelproject vooruitlopend op project Pannenkoekendijk
			Uiterlijk gereed voor hub Roelenkwartier	!				
Groot Weezenland zuid €				Ontwerp en voorbereiding	Uitv	Oplevering		2032: Deadline subsidie rijk
				Uitvoering na oplevering Mobihub Weezenlanden	!			
Potgietersingel €				Ontwerp en voorbereiding	Uitv	Oplevering		
				Uitvoering na oplevering voldoende parkeerplekken	!			
Singelpark Noorderkwartier €			Ontwerp en voorbereiding		Uitvoering		Oplevering	2034: Deadline subsidie rijk
			! Start planuitwerkingen Noorderkwartier		! Eerste opleveringen Noorderkwartier			
Schuttevaerbrug €				Ontwerp en voorbereiding	Uitv	Oplevering		
Schuttevaerkade €					Ontwerp en voorbereiding	Uitv	Oplevering	
					Uitvoering na oplevering voldoende parkeerplekken	!		
Fase 2b – Sta klaar om te starten								
Badhuiswal & brug Stenen Pijp €					Ontwerp en voorbereiding	Uitv	Oplevering	
					Aansluiting op ontwikkeling Diezerpoortgarage	!		
Brug Thorbeckegracht €					Ontwerp, planologische procedure en voorbereiding	Uitv	Opl.	Cruciaal voor rondje Singel
					Aansluiting op proces herinrichting Thorbeckegracht	!		
Kamperpoorter-brug & Maagjes-bolwerk €						Ontwerp en voorb. Uitv	Opl.	Impuls gewenst
Eekwal bolwerk €						O. & vb. Uitv	Opl.	
						Start na evaluatie Eekwal en omgeving !		
Potgietersingel park €						O. & vb. Uitv	Opl.	Impuls gewenst
Ter Pelkwijkpark en omgeving €						O. & vb. Uitv	Opl.	
Fase 3 – Nog even mee wachten								
Pannenkoeken-dijk €						Ontwerp en vb Uitv		
Zeven Alleetjes €						Ontwerp en vb Uitv		
Willemsvaart €							Ontwerp en vb Uitv	
Elke fase								
Placemaking ☆	Voor-bereiden	Uitvoering						

Legenda

- Indicatieve deelproject-grenzen
- € Financiering rond
- € Financiering deels rond of zicht op (externe) financiering
- € Nog geen (zicht op) financiering
- ☆ Indicatieve locaties placemaking
- ! Planning afhankelijk van raakvlakprojecten
- → Onderlinge relaties in planning
