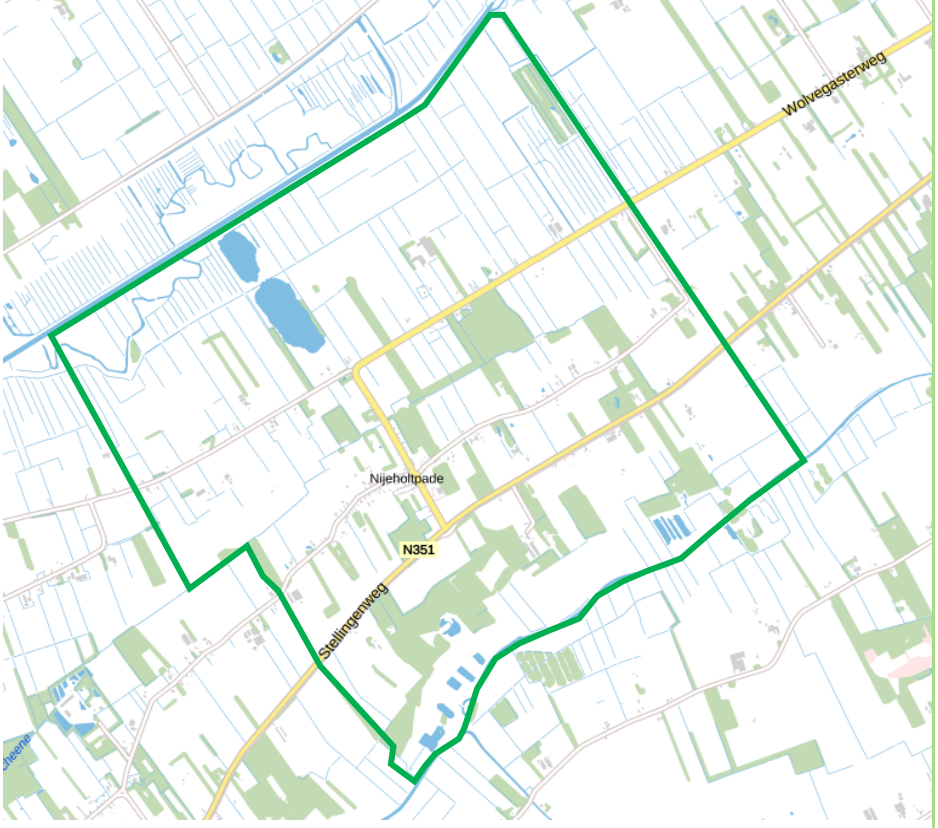


Eindevaluatie pilot Omgevingsvisie Nijeholtpade

Werken met een Maatschappelijke Overeenkomst

gemeente Weststellingwerf

Plaatselijk Belang De Eendracht Nijeholtpade

Datum: 20 december 2021



Inleiding

De gemeente Weststellingwerf wil dichtbij besturen en samen met haar inwoners werken aan de verschillende samenlevingsvraagstukken. Met de in juni 2019 vastgestelde Omgevingsvisie *'Ruimte voor kwaliteit'* is deze gemeentelijke koers ingezet. Met de Omgevingsvisie worden dorpen gestimuleerd om een eigen visie te ontwikkelen en geeft de gemeente aan dat zij bereid is om vanuit deze visie nieuwe vormen van samenwerking aan te gaan. Plaatselijk belang Nijeholtpade(PB) heeft de handschoen opgepakt en een eigen omgevingsvisie geschreven: *"Nijeholtpade, dorp in het groen".*
Daarna hebben gemeente en dorp de eerste stappen gezet om nadere afspraken te maken over de lokale omgevingsvisie van Nijeholtpade. Met de motie die in maart 2018 door gemeenteraad is aangenomen, is dit initiatief omarmd en het College gestimuleerd om de uitvoering verder ter hand te nemen.
In december 2019 hebben gemeente en dorp in het kader van een nieuwe vorm van samenwerking een *Maatschappelijke Overeenkomst* afgesloten voor de gezamenlijke uitvoering van een twaalftal projecten. Over het onderwerp Wonen is later een addendum toegevoegd. Samen is er ervaring opgedaan met het werken op basis van een lokale omgevingsvisie en de daaropvolgende *Maatschappelijke Overeenkomst (MO)*.
In de MO is opgenomen eind 2021 een evaluatie uit te voeren. Deze pilot levert belangrijke informatie voor de wijze waarop we in de toekomst kunnen samenwerken met dorpen. Eind 2021 is de MO afgerond, de resultaten en de aanbevelingen voor een vervolg vindt u in deze notitie.

Inhoud notitie

1. Omgevingsvisie "Nijeholtpade, dorp in het groen"
2. Maatschappelijke Overeenkomst
3. Conclusie en aanbevelingen
4. Toekomst samenwerking gemeente en PB Nijeholtpade

Bijlagen

1. Inhoud MO en format
2.Overzicht projecten en resultaten pilot omgevingsvisie Nijeholtpade
3. Resultaten Maatschappelijke Overeenkomst per thema.
4. Inventarisatie dorp

Gemeente Weststellingwerf en Plaatselijk Belang De Eendracht Nijeholtpade
Datum: 20 december 2021



1. Omgevingsvisie “Nijeholtpade, dorp in het groen”

In 2017 heeft Plaatselijk Belang (PB) Nijeholtpade een omgevingsvisie geschreven. Deze lokale omgevingsvisie verwoordt de beelden, wensen en ideeën die bewoners hebben als het gaat om de kwaliteit van het eigen dorp. De lokale visie is tot stand gekomen door keukentafelgesprekken die het PB voerde met interne en externe doelgroepen waaronder ondernemers en natuurorganisaties. Tijdens een algemene ledenvergadering is aan het PB door de inwoners mandaat verleend om met de uitvoering aan de slag te gaan. Het is een plan van en voor het dorp en biedt een leidraad voor het PB en de toekomstige dorpsprioriteiten. Voor het PB is de gemeente een essentiële partner om een aantal thema’s te realiseren. Daar waar dorp en gemeente elkaar op thema- of project niveau vinden, biedt de lokale omgevingsvisie een mooie en gedragen basis voor verdere samenwerking en kunnen deze worden verwoord in een Maatschappelijke Overeenkomst. Het PB heeft in het kader van de evaluatie onderzoek gedaan naar de werking en meerwaarde van de eigen omgevingsvisie. Het maken van een eigen visie kende een aantal doelstellingen,[1] deze staan hieronder verder toegelicht.

Meerwaarde eigen dorpsvisie
De visie is bekend bij het merendeel van de inwoners. Zij geven aan dat het schrijven van een eigen visie meerwaarde biedt voor het dorp. De lokale visie maakt dat de inwoners meer betrokken zijn geraakt bij hetgeen in de directe leefomgeving speelt. Mede hierdoor zijn er in korte tijd een groot aantal projecten gerealiseerd[2]. De opkomst tijdens de (interactieve) bijeenkomsten over de visie in het MFC was groter dan bij normale bijeenkomsten, inwoners zijn enthousiast gebleken om zich op te geven voor de diverse werkgroepen.

Meerwaarde samenwerking gemeente en dorp
Inwoners geven aan dat de omgeving waarin zij wonen de afgelopen jaren sterk verbeterd is en verklaren dit door het samen met de gemeente uitvoeren van projecten. Zo kwamen bij de start van de visie vaak signalen binnen over de achteruitgang in de leefomgeving, voorzieningen en natuur. Deze signalen zijn er op dit moment minimaal.

Betrokkenheid lokale ondernemers
Een van de doelstellingen van de omgevingsvisie Nijeholtpade is om zo veel mogelijk werkzaamheden uit te laten voeren door lokale ondernemers[2]. Dit is bij een aantal projecten haalbaar gebleken. Uit de evaluatie van het PB komt naar voren dat ondernemers het leuk vinden om (betaalde) werkzaamheden voor het dorp uit te voeren. Men is dan eerder bereid iets extra’s te doen, bijvoorbeeld het gratis leveren van zand voor een wandelpad. Belangrijke kanttekening is dat sommige werkzaamheden complex zijn en vragen om specifieke deskundigheid, deze is niet altijd aanwezig bij lokale ondernemers.

Andere dorpen
PB heeft tijdens een gezamenlijke bijeenkomst voor raadsleden, B&W en andere plaatselijk belangen haar visie gepresenteerd. Daarbij is er hulp aangeboden aan andere dorpen om met een eigen visie aan de slag te gaan. Het Plaatselijk Belang heeft op verzoek in Noordwolde en bij een aantal andere Friese dorpen voorlichting gegeven. Bij de start heeft de VKD het op zich genomen dit traject binnen de andere dorpen verder vorm te geven.

Vervolg
De omgevingsvisie van het dorp Nijeholtpade loopt tot 2025. De inwoners zijn positief over een verdere uitvoering hiervan. Een beperkt aantal inwoners geeft in de vragenlijst aan daar ook een bijdrage aan te willen leveren.

Aandachtspunten
- **Betrokkenheid inwoners:** Het zijn vaak dezelfde inwoners zijn die zich opgeven voor de werkgroepen of een bijdrage aan de uitvoering van de visie. Andere inwoners zijn moeilijker te betrekken wat de uitvoering de visie kwetsbaar maakt.
- **Bestuur:** Het ontwikkelen en uitvoeren van een eigen visie legt veel druk op een PB bestuur, waarbij het lastig blijft om inwoners enthousiast te maken voor bestuursfuncties.
- **Communicatie:** Om inwoners te informeren en betrekken heeft PB bijna maandelijks een Omgevingsbulletin uitgegeven. Inwoners zijn hier positief over. Digitaal lijkt er weinig animo, wat in de toekomst om aandacht vraagt, ook met het oog op duurzaamheid.
- **Corona:** De corona pandemie heeft de uitvoering belemmerd. Zo konden belangrijke plenaire bijeenkomsten niet plaats vinden in het MFC en ontbrak het hierdoor aan dynamiek en betrokkenheid uit het dorp. In de toekomst zal creatief gekeken moeten worden naar andere vormen om inwoners te bereiken.

[1] & [2] de uitwerkingen vindt u in de bijlage.



2. Maatschappelijke Overeenkomst

De MO is een instrument dat is ontstaan uit de gemeentelijke Omgevingsvisie. Daarin nodigt de gemeente dorpen uit om zelf een visie te ontwikkelen en nieuwe vormen van samenwerking aan te gaan. Een van die samenwerkingsvormen is de *Maatschappelijke Overeenkomst*. Het doel van de MO is om te komen tot goede (werk)afspraken tussen het dorp en de gemeente op verschillende onderwerpen en deze afspraken met elkaar vast te leggen. De gemeente werkt met het dorp integraal samen binnen een afgebakende periode en gebied.
De lokale omgevingsvisie van Nijeholtpade leent zich voor het opstellen voor een Maatschappelijke Overeenkomst. De MO Nijeholtpade regelt de organisatie, uitvoering van projecten, de te behalen resultaten, financiering en de inhuur van externen. De MO richt zich op 12 thema's in het dorp en heeft een looptijd van 2 jaar (2020-2021).

Schrijfgroep
Het schrijven van de MO heeft plaats gevonden in een schrijfgroep van inwoners en ambtenaren. Vaststelling en begeleiding vond plaats in een stuurgroep. Deze aanpak heeft goed gewerkt. Gemeentelijke en lokale kennis kwamen bij elkaar kwamen, doordat inwoners en ambtenaren elkaar goed wisten te vinden.

Format
Het is belangrijk dat het doel en beoogde resultaten helder worden omschreven. In de MO zijn de thema's daarom omschreven in een overzichtelijk format. Dit format heeft goed gewerkt. Het format biedt houvast en zowel bewoners als medewerkers van de gemeente pleiten ervoor om ook in de toekomst op basis hiervan afspraken te maken.

Startbijeenkomst
Na afsluiten van de overeenkomst is voor de werkgroepen een brede startbijeenkomst gehouden in het MFC. Inwoners en ambtenaren leerden elkaar zo kennen en konden met behulp van het format ter plaatse werkafspraken maken over de uitvoering van hun project.

Werkgroepen
Bij de meeste thema's is gekozen voor uitvoering door middel van werkgroepen. Bij een aantal thema's is gekozen voor uitvoering door deskundigen uit dorp en gemeente, bij bijvoorbeeld mobiele telefonie en AED.
Per thema was een trekker: dorp of gemeente. De trekker nam het initiatief voor het zetten van vervolgstappen, overleggen en afstemming met de stuurgroep. De lokale begeleiding van elke werkgroep vond plaats door een bestuurslid van PB. Inwoners en ambtenaren zijn positief over deze opzet en geven aan hier ook in de toekomst mee te willen blijven werken.

Stuurgroep
De afspraken in MO vormden de leidraad voor regelmatige overleggen van een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van PB en gemeente. De stuurgroep volgde de voortgang op afstand, als er onduidelijkheden ontstonden werden deze meegenomen naar de stuurgroep. Daar waar nodig zijn de afspraken van een thema aangepast.

Resultaten
De MO heeft bijgedragen aan het versterken van de korte lijnen tussen PB, gemeentebestuur, organisatie. Het creëert helderheid over de aanspreekpunten ambtelijk en bestuurlijk. Het onderlinge contact en de korte lijnen die er waren tussen de trekkers van de werkgroepen en de gemeentelijke contactpersonen is als prettig ervaren. De deelnemende inwoners in een werkgroep geven aan dat bij deze manier van werken duidelijk was welke rol eenieder had en wat het te bereiken doel was. De samenwerking tussen ambtenaren en inwoners is als constructief ervaren. Zowel betrokken medewerkers als inwoners hebben hierom aangegeven dat het afsluiten van een MO zinvol is.

Tijd en geld
De gemeente heeft een pilotbudget van €50.000 beschikbaar gesteld dat is gekoppeld aan de MO Nijeholtpade. Dit is volledig ingezet ten behoeve van de herinrichting van de Hoofdweg. In totaal heeft de gemeente vanuit structurele middelen €403.100 geïnvesteerd binnen de thema's van de MO. Daarnaast is er door de gemeente 464 uren geïnvesteerd in de samenwerking met Nijeholtpade. De geraamde tijdsinvestering van de gemeente per thema was passend. Soms heeft de nieuwe manier van werken en de complexiteit van de projecten meer tijd gevraagd, het thema Wonen is hiervan een voorbeeld. Dit heeft geleid tot extra afspraken en uren met betrekking tot dit thema, het addendum Wonen. De investering van PB en betrokken bewoners is niet in uren uitgedrukt, maar duidelijk is dat zonder de honderden uren en energie een groot deel van de plannen niet kon worden gerealiseerd.



Aandachtspunten

- **De MO is bijna afgerond**
  Het overgrote deel van de 12 thema's is afgerond of in een vergevorderd stadium. Daar waar nog een vervolgstap nodig is, wordt de vertraging grotendeels veroorzaakt door corona.
- **De belasting**
  Het uitvoeren van 12 projecten tegelijkertijd is veel. Het legt een groot beslag op de ambtenaren, het PB bestuur en op vrijwilligers in de voorbereiding en uitvoering. Beter is een MO af te sluiten voor maximaal (afhankelijk van het soort) 5 projecten.
- **De schrijversgroep**
  Een deel van de afspraken is te beperkt afgestemd met de gemeentelijke organisatie en bewoners. Dit zorgde soms voor onduidelijkheid over doel en gemaakte afspraken bij een aantal werkgroepen.
- **Voor het maken van nieuwe afspraken** op thema- of projectniveau is het belangrijk dat de beoogde vak-ambtenaren én bewoners onderdeel zijn van het schrijfproces.
- **Het format**
  Op een aantal thema's gaf het format te veel ruimte voor interpretatie en leefden er bij dorp en gemeente andere beelden t.a.v. de aanpak en het beoogde resultaat. Het format zou kunnen worden aangevuld met o.a. onderwerpen als communicatie en participatie.
- **De stuurgroep**
  Het bestuur van PB geeft aan dat de werking van de stuurgroep om verbetering vraagt. Voor PB was de motivatie van sommige gemeentelijke besluiten niet altijd helder. Daarnaast werd er veel tijd besteed aan de praktische inhoud. Dat laatste kan beter worden belegd bij de vak-ambtenaar en de betreffende inwoner.
- **Rollen**
  Soms lopen rollen door elkaar. Bijvoorbeeld bij het thema Wonen zijn er veel verschillende belangen gemoeid. Het maken van concrete afspraken over rollen en verantwoordelijkheden helpen hierbij. De rol van de gemeente als aanjager en procesbegeleider kan botsen met de rol van adviseur en beoordelaar van nieuwe initiatieven op het vlak van wonen.
- **Financieel**
  De financiële investering die is gedaan door de gemeente is voornamelijk afkomstig uit bestaande tijdelijke en structurele budgetten die konden aangewend om de (geplande) werkzaamheden te realiseren. Door werk-met-werk te maken (bijvoorbeeld wensen uit het dorp te combineren met gepland onderhoudswerk) is er bij meerdere projecten een plus aangebracht. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt bij de samenwerking tussen dorpen en gemeente.



3. Conclusie en aanbevelingen

Conclusies

1. Het Plaatselijk Belang stelt dat het schrijven van een eigen omgevingsvisie succesvol is geweest. Het heeft de betrokken partijen veel gebracht. Dit wordt onderschreven door een groot deel van inwoners die deelnamen aan de eindevaluatie van het PB.
2. Inwoners geven aan dat de leefomgeving door het schrijven en uitvoeren van een eigen dorpsvisie is verbeterd.
3. Het PB haalt uit de evaluatie dat het laten uitvoeren van werkzaamheden door plaatselijke ondernemers goed gewerkt heeft.
4. Het PB ervaart dat het vaak dezelfde inwoners betreft die de schouders eronder zetten in de uitvoering. Dit maakt het ontwikkelen en uitvoeren van een dorpsvisie kwetsbaar.
5. Het PB gaf een omgevingsbulletin uit, dit heeft bij de inwoners goed gewerkt. Voor de toekomst heeft het gemeentelijk de voorkeur om een gezamenlijk digitaal bulletin te ontwikkelen.
6. Het afsluiten van een Maatschappelijke Overeenkomst heeft goed gewerkt. Daarmee worden afspraken tussen gemeente en dorp concreet en zijn verantwoordelijkheden helder. Dit wordt onderschreven door inwoners en ambtenaren.
7. Het aantal opgenomen projecten in de MO (12) bleek teveel. De belasting voor vrijwilligers, bestuur PB en ambtenaren is dan te groot, wat de effectiviteit van een thema niet ten goede komt.
8. Het inrichten van een schrijfgroep van ambtenaren en inwoners voor het ontwikkelen van een Maatschappelijke Overeenkomst heeft goed gewerkt. Advies is wel om daar vroegtijdig de vak-ambtenaar bij te betrekken. Na het afsluiten van de MO is een startbijeenkomst georganiseerd voor de betrokken ambtenaren en vrijwilligers in de diverse werkgroepen. Dit heeft goed gewerkt en is een voorwaarde voor een goede uitvoering.
9. De diverse werkgroepen hebben goed gefunctioneerd. Dit wordt onderschreven door vrijwel alle deelnemers aan de werkgroepen. Sommige onderwerpen waren complex, waardoor het soms lastig was de juiste kennis en kunde bij elkaar te brengen.
10. Met een MO en bijbehorende format kunnen rollen duidelijk afgebakend worden. Zo kan voorkomen worden dat de rol van werkgroeplid en een beoordelend ambtenaar niet botsen.
11. Het format in de MO heeft als zodanig goed gewerkt. Het format kan op een aantal punten verbeterd, bijvoorbeeld door het opnemen van onderwerpen als communicatie en inwonersparticipatie.
12. Het inrichten van een stuurgroep voor de begeleiding van een MO is als zinvol ervaren door het PB en gemeente. Het is daarbij wel verstandig om naar de samenstelling en rolverdeling binnen de stuurgroep te kijken.
13. De uitvoering is op enkele uitzonderingen na binnen de financiële kaders gebleven. Voor het dorp zijn er meer mogelijkheden voor cofinanciering (fondsen) in de toekomst.
14. De ingeschatte tijdsinvestering die er vooraf per thema was berekend in de werkgroepen, op het thema Wonen na, passend.
15. Nog niet alle projecten uit de MO zijn gerealiseerd. Dit heeft ook te maken met de corona problematiek.

Aanbevelingen

1. Om het proces goed te borgen is het noodzakelijk dat aan de voorkant van het traject de MO breed gedragen wordt. Het schrijven van de MO door inwoners en ambtenaren gezamenlijk kan hier ondersteunend aan zijn.
2. Dorp en gemeente gaan door op de ingeslagen weg en realiseren de nog openstaande projecten uit de MO.
3. Dorp en gemeente onderzoeken (de visie van Nijeholtpade loopt tot en met 2025) welke afspraken voor de toekomst op een zelfde wijze kunnen worden vastgelegd.
4. Er zijn grenzen aan de inzet en mogelijkheden van vrijwilligers en ambtenaren (tijd, kennis). Dit kan van invloed zijn op de uitvoering en continuïteit van lange termijn afspraken. Het is belangrijk hier rekening mee te houden in de toekomstige planvorming.
5. De start van een MO vindt plaats in een gezamenlijke bijeenkomst.
6. Er wordt kritisch gekeken naar de rol en samenstelling van een stuurgroep MO.
7. De ambitie is om met enige regelmaat gezamenlijk uit te dragen, dat we trots zijn op deze nieuwe vorm van samenwerking.
8. Gebruik de MO als basis voor toekomstige samenwerking met dorpen, rekening houdend met de conclusies en aanbevelingen.



4. Toekomst samenwerking gemeente en PB Nijeholtpade

De pilot heeft belangrijke informatie en inspiratie opgeleverd, met name de wijze waarop de gemeente in de toekomst kan en wil samenwerken met dorpen in het algemeen en de plaatselijk belangen in het bijzonder. De pilot is afgerond, maar de samenwerking met Nijeholtpade wordt voorgezet, specifiek als het gaat om de uitvoering en afronding van een aantal thema's uit de MO. Daarnaast blijven we ook op de langere termijn samenwerken. De omgevingsvisie van Nijeholtpade loopt door tot 2025. In de loop van de tijd zullen nieuwe thema's zich aandienen waar de gemeente een rol in speelt en het van belang is om nadere afspraken te maken.

Vervolg

- De gemeente en het PB maken een tijdelijke samenwerkingsafspraak in de geest van de MO (Onderdeel "Inleiding, afbakening en afspraken"). Deze wordt aangepast op basis van de evaluatie en dient als leidraad voor de samenwerking op thema/projectniveau. De hernieuwde afspraken worden voorgelegd aan het PB en gemeente.
- De thema's die nog in uitvoering zijn worden op basis van de gemaakte MO-afspraken opgepakt. In een aantal gevallen is een termijn gekoppeld aan de extra mogelijkheden, in tijd en geld. De doorlooptijd en geldigheid van enkele thema's zijn daardoor beperkt en worden in 2022 geactualiseerd.
- Als het PB of de gemeente een nieuw thema wenst op te pakken, wordt er gezamenlijk de opdracht geformuleerd met behulp van het MO-format en ter goedkeuring voorgelegd aan het eigen bestuur.
- De organisatie rondom de thema's die nog in uitvoering zijn worden blijft ongewijzigd. Afronding of aanpassing van een thema wordt gezamenlijk vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het eigen bestuur.



Bijlagen:

1. Inhoud MO en format
2. Overzicht projecten en resultaten pilot omgevingsvisie Nijeholtpade
3. Resultaten Maatschappelijke Overeenkomst per thema.
4. Inventarisatie dorp



Bijlage 1 Inhoud MO en format

In de MO zijn overkoepelende en organisatorische afspraken gemaakt over de samenwerking binnen Maatschappelijke overeenkomst. De volgende onderwerpen zijn daarbij benoemd:

- Doel, achtergrond, aanleiding
- Afbakening, afspraken, reikwijdte
1) Geografische grenzen
2) Doorlooptijd
3) Status overeenkomst
4) Dynamisch document
5) Inzet pilotbudget
6) Reguliere taken
7) Voortgangsoverleg
8) Contractbeheerder
9) Communicatie
10) Inzet wethouder
11) Evaluatie

De thema's zijn elk beschreven in een handzaam format waarin de concrete afspraken zijn vastgelegd die dienen als leidraad voor de samenwerking.

Thema	
Inleiding - achtergrond	
Wat willen we bereiken?	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Hoe gaan we dit doen?	
Gemeente:	**Planning - tijd**
Dorp	
Wie is trekker?	
Wat gaat het kosten	**Financiering**
Datum gereed	
Bijzonderheden	



Bijlage 2 Overzicht projecten en resultaten pilot omgevingsvisie Nijeholtpade

Tabel 1 – Overzicht projecten en investeringen periode 2018-2019

	Project	Trekker	Status	Investering gemeente	Investering dorp	Bijzonderheden
1.	Natuurbelevingspunt	Dorp	Afgerond	€ 7.500	€17.961	
2.	Aanleg voetpad en herplant Kerkweg	Dorp	Afgerond	€ 28.000	€19.026	
3.	Herplant Hoofdweg	Gemeente	Afgerond	€ 8.000		
4.	Herstel landschapselementen (particulieren)	Dorp	Afgerond	n.v.t.	n.v.t.	Financiering door ELAN en LBF uit het project POP 3
5.	Herstel kap Staatsbosbeheer-bos	Dorp	In uitvoering	n.v.t.	n.v.t.	Financiering door Staatsbosbeheer
6.	Herstraten - vernieuwen Kerkweg	Gemeente	Afgerond	€42.000	n.v.t.	
7.	Herstraten Binnenweg	Gemeente	Afgerond	€40.000	n.v.t.	
				€125.500	€36.987	

Tabel 2 – Overzicht thema's en investeringen Maatschappelijke Overeenkomst, periode 2020 - 2021

	Thema	Trekker	Status	Investeringen gemeente		Bijzonderheden
				Financieel	Tijd	
1.	Binnenweg	Dorp	Afgerond	€ 36.500	32	
2.	Hoofdweg	Gemeente	Afgerond	€ 350.000	108	Incl. €50000 pilotbudget
3.	Wonen	Dorp	Afgerond	€ 8.000	32	
3a	Addendum	Gemeente	In uitvoering	n.v.t.	125	Planning afronding voor 1 april 2022
4.	Duurzaamheid	Dorp	In uitvoering	€ 8.600	56	Afronding voor 2023
5.	Ondernemers	Dorp	In uitvoering	n.v.t.	4	Afronding voor 2023
6.	Onderhoud wegen	Gemeente	Afgerond	n.v.t.	18	
7.	Groen	Dorp	In uitvoering	pm	48	Afronding voor 2023
8.	AED	Dorp	Afgerond	n.v.t.	4	
9.	Mobiele telefonie	Gemeente	Afgerond	n.v.t.	21	
10	Buurtpreventieapp:	Dorp	Afgerond	n.v.t.	2	
11.	Huiskamer project	Dorp	In uitvoering	n.v.t.	6	Afronding voor 2023
12.	Gebiedsteam	Gemeente	Afgerond	n.v.t.	8	
				€403.100	464	



Bijlage 3 Maatschappelijke overeenkomst 2020-2021 - Samenvatting en resultaat per thema

Per thema zijn de belangrijkste resultaten benoemd. Daar waar nog een vervolgstap nodig is, wordt deze binnen de reguliere mogelijkheden van de gemeente opgepakt of ondersteund.

Thema 1 - Binnenweg		
Doel: Een groene, veilige en onderhoudsvriendelijke Binnenweg die voor inwoners van het dorp toegankelijk en aantrekkelijk is. De weg is voorzien van passeerstroken, de lanenstructuur is door het planten van de bomen hersteld en de biodiversiteit is vergroot.		
Trekker:	Dorp	
Investering	Gemeente: €36.500	Dorp: n.v.t.
Stand van zaken:	Afgerond	
Afgerond	- Aanplant 10 bomen - Aanleg 15 passeerstroken door lokale aannemers - Aanbrengen 1400m kruidenmengsel i.h.k.v. bermverhardingsprogramma	
Vervolgstap	- PB stimuleert aanwonenden/grondeigenaren om het eigen erf te vergroten en de biodiversiteit - PB levert voor december 2022 draaiboek aan over aanpak/inrichting duurzame weg	
Vervolg samenwerking	Vervolg kan binnen reguliere mogelijkheden van gemeente worden uitgevoerd. De huidige afspraken binnen de MO zijn daarbij leidend. Bij wijziging van de aanpak worden nieuwe afspraken gemaakt.	

Thema 2 – Hoofdweg		
Doel: Een goed werkende riolering in dit deel van de Hoofdweg. Daarnaast is de Hoofdweg goed toegankelijk, klimaatbestendig, verkeersveilig, onderhoudsarm en draagt deze bij aan het groene karakter van het dorp.		
Trekker:	Gemeente: vervangen riolering, inrichting Hoofdweg	
	Dorp: vergoenen erven	
Investering	Gemeente: € 350.000 Waarvan € 50.000 pilotgeld	Dorp: n.v.t.
Stand van zaken:	Afgerond	
Afgerond	- Vervangen riolering – inrichting Hoofdweg, december 2020 (gemeente) - Het verharden van de bermen langs de Hoofdweg	
Vervolgstap	- PB stimuleert bewoners om hun erven te vergroenen en in te zetten op vergroten biodiversiteit	
Vervolg samenwerking	Vervolg kan binnen reguliere mogelijkheden van gemeente worden uitgevoerd. De huidige afspraken binnen de MO zijn daarbij leidend. Bij wijziging van de aanpak worden nieuwe afspraken gemaakt.	



Thema 3 Wonen		
Doel: Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar woningbouwmogelijkheden voor met name starters en senioren.		
Trekker:	Dorp	
Investering	Gemeente € 8.000	Dorp: n.v.t.
Stand van zaken:	Afgerond	
Afgerond	- Haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd door het dorp. - Uitkomsten en de vervolgstappen zijn besproken. Dit heeft geleid tot een aparte afspraak over het vervolg, zie 3a Addendum wonen.	
Vervolg samenwerking	De vervolgafspraken zijn vastgelegd in het addendum Wonen. De afspraken binnen dit addendum zijn leidend voor het vervolg.	

Thema 3a Addendum - Wonen		
Doel: Ondersteuning van starters en herbestemmers door de gemeente		
Trekker:	Gemeente	
Investering	Gemeente: n.v.t.	Dorp: n.v.t.
Stand van zaken:	In uitvoering	
Vervolg:	Ondersteuning starters en herbestemmers door de gemeente. Deze doelgroepen hebben inzicht in potentiële locaties, eigen mogelijkheden en randvoorwaarden. Deze doelgroepen kunnen op basis daarvan zelfstandig de afweging maken om hun woonwensen te concretiseren.	
Vervolg samenwerking	De uitvoering van het addendum bevindt zich in een vergevorderd stadium. Tot 1 april, is er ambtelijke ondersteuning om de afspraken tot een regulier proces te begeleiden.	

Thema 4 Duurzaamheid en energietransitie		
Doel: Het dorp heeft een Energie Transitie Plan (ETP). In het ETP wordt beschreven hoe het dorp op duurzame wijze in zijn energiebehoefte kan voorzien. Bewoners weten hoe zij energie kunnen besparen en energie duurzaam kunnen opwekken, individueel en collectief.		
Trekker:	Dorp	
Investering	Gemeente: €8.200	Dorp: n.v.t.
Stand van zaken:	In uitvoering	
Afgerond	- Plan van aanpak dat leidt tot Energie transitieplan (in dec. 2021) - Bewustwording-kennisopbouw bewoners - Nulmeting in het dorp m.b.v. enquête en een digitale kaart ontwikkeld. - Als input voor ETP - Resultaten zijn gepresenteerd tijdens ledenvergadering	
Vervolgstap(geld beschikbaar tot 1 maart	- PB organiseert m.b.v. Energiewerkplaats in het voorjaar van 2022 interactieve bijeenkomsten (energygame): bewoners denken na over waar besparing worden gehaald/waar kan energie worden opgewekt. - PB stelt Energie Transitie Plan op	
Vervolg samenwerking	Door corona heeft dit thema vertraging opgelopen. De afspraken die binnen de MO zijn gemaakt blijvend leidend en worden daar waar nodig geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.	
Afronding	December 2022	



Thema 5 Ondernemers		
Doel: Inzicht in de precieze behoefte van de ondernemers en zij hebben een goed beeld van bestaande netwerken en de mogelijkheden voor ondersteuning		
Trekker:	Dorp	
Investering	Gemeente: n.v.t.	Dorp : n.v.t.
Stand van zaken:	In uitvoering	
Vervolgstap	PB organiseert in 2022 een bijeenkomst (een “ondernemerscafé”) voor alle ondernemers van het dorp. Aan de hand van behoefte wordt vervolgstap gezet	
Vervolg samenwerking	Door corona heeft dit thema vertraging opgelopen. Vervolg kan binnen reguliere mogelijkheden van de gemeente worden uitgevoerd. De huidige afspraken binnen de MO zijn daarbij leidend. Bij wijziging van de aanpak worden nieuwe afspraken gemaakt.	
Afronding	December 2022	

Thema 6 Planning wegenonderhoud		
Doel: Actieve betrokkenheid van Nijeholtpade bij de planning en werkzaamheden van het onderhoud van wegen en straten. Het dorp weet wat er wanneer gaat gebeuren en denkt mee over de planning waar dit mogelijk is.		
Trekker:	Gemeente	
Investering	Gemeente: n.v.t.	Dorp : n.v.t.
Stand van zaken:	Afgerond	
Afgerond	Na inventarisatie elementenonderhoud en inspectie van asfaltwegen bespreken we de planning met het dorp.	
Vervolg samenwerking	Gemeente en PB hebben vast aanspreekpunt die planning en werkzaamheden met betrekking tot wegenonderhoud afstemmen. Vervolg kan binnen reguliere mogelijkheden van de gemeente worden uitgevoerd.	

Thema 7 Groenonderhoud – biodiversiteit		
Doel: Inzichtelijk hebben wat en onder welke condities, er aan groenonderhoud in het dorp gedaan kan worden door inwoners. Op basis van de inzichten wordt 2021 een jaar waarbij het dorp het groenonderhoud (deels) kan uitvoeren.		
Trekker:	Dorp	
Investering	Gemeente: pm	Dorp : pm
Stand van zaken:	In uitvoering	
Afgerond	- Inzicht in groenonderhoud en randvoorwaarden beheer en onderhoud - Rondgang dorp	
Vervolg:	- PB onderzoekt binnen dorp de ambitie, meerwaarde en (praktische)mogelijkheden om groendonderhoud zelf uit te voeren - PB en gemeente maken concrete afspraken over afstemming groenonderhoud en eventuele overdracht groenonderhoud	



Vervolg samenwerking	Door corona heeft dit thema vertraging opgelopen. Vervolg kan binnen reguliere mogelijkheden van de gemeente worden uitgevoerd. De huidige afspraken binnen de MO zijn daarbij leidend. Bij wijziging van de aanpak worden nieuwe afspraken gemaakt - Het vervolg is sterk afhankelijk van de ambities van het dorp. - Dorp en gemeente hebben vast aanspreekpunt die planning en werkzaamheden afstemmen. Vervolg kan binnen reguliere mogelijkheden van de gemeente worden uitgevoerd.
Afronding	December 2022

Thema 8 AED		
Doel: Het dorp Nijeholtpade beschikt over voldoende, goedwerkende AED's en voldoende inwoners die weten hoe zij moeten reanimeren en de AED moeten gebruiken.		
Trekker:	Dorp	
Investering	Gemeente: n.v.t.	Dorp : €800
Stand van zaken:	Afgerond	
Afgerond	Onderhoud/beheer AED , training en voorlichting zijn voortdurend aandachtspunt voor dorp. Gemeente adviseert over mogelijkheden en beperkte ondersteuning bieden bij oefeningen	
Vervolg samenwerking	Vervolg kan binnen reguliere mogelijkheden van de gemeente worden uitgevoerd.	

Thema 9 Mobiele Telefonie		
Doel: De mobiele bereikbaarheid vergroten. Dit doen we binnen de mogelijkheden die het dorp en de gemeente hebben		
Trekker:	Gemeente: Overleg met providers/ buurgemeenten	
	Dorp: Metingen, onderzoek Social mast	
Investering	Gemeente: n.v.t.	Dorp : n.v.t.
Stand van zaken:	Afgerond	
Afgerond	- Overleg providers - Overleg buurgemeenten - Metingen mobiele bereikbaarheid - Optimalisatie/aanpassing mast T-mobile uitgevoerd	
Vervolg samenwerking	Vodafone heeft vergunning aangevraagd voor mast. Dit zal de telefonisch bereikbaarheid nog meer vergroten. Dorp en gemeente hebben vast aanspreekpunt die zaken omtrent mobiele bereikbaarheid afstemmen. Vervolg kan binnen reguliere mogelijkheden van de gemeente worden uitgevoerd.	

Thema 10 Buurtpreventieapp		
Doel: Het behouden van een veilig dorp. Het invoeren van een dorpsbrede buurtpreventie-app draagt hier aan bij		
Trekker:	Dorp	
Investering	Gemeente: n.v.t.	Dorp : n.v.t.
Stand van zaken:	Afgerond	

Afgerond	- Nijeholtpade staat geregistreerd in de lijst met Whatsapp buurtpreventie groepen.
Vervolg:	- PB organiseert in overleg met de gemeente voorlichtingsavond over gebruik buurtpreventieapps. - PB en gemeente stimuleren bewoners om zich aan te sluiten bij de buurtpreventieapp - PB neemt in overleg met gemeente initiatief om de werking van de Buurtpreventieapp regelmatig te testen
Vervolg samenwerking	Vervolg kan binnen reguliere mogelijkheden van de gemeente worden uitgevoerd.

Thema 11 Huiskamerproject		
Doel: Door een centrale en vertrouwde ontmoetingsplek voor inwoners in het algemeen en voor ouderen in het bijzonder te creëren in het MFC, gaan we eenzaamheid en sociaal isolement tegen.		
Trekker:	Dorp	
Investering	Gemeente: pm	Dorp : pm
Stand van zaken:	In uitvoering	
Vervolg	Dorp: - PB voert behoeftepeiling/huis-aan-huis actie uit ter voorbereiding op bijeenkomsten - Afhankelijk van behoeftepeiling uitwerking volgens afspraken MO	
Vervolg samenwerking	Vervolg kan binnen reguliere mogelijkheden van de gemeente worden uitgevoerd. De huidige afspraken binnen de MO zijn daarbij leidend.	
Afronding	December 2022	

Thema 12 Gebiedsteam – Veur en Deur		
Doel:. De zichtbaarheid en toegankelijkheid van het gebiedsteam in het dorp is vergroot en de mogelijkheden zijn bekend bij bewoners. Er is in een vroeg stadium zicht op hulpvragen en er kan preventief worden gehandeld.		
Trekker:	Gemeente	
Investering	Gemeente: n.v.t.	Dorp : n.v.t.
Stand van zaken:	Afgerond	
Afgerond	- Structureel overleg Gebiedsteam en werkgroep Veur en Deur t. - Afspraken over profilering/zichtbaarheid gebiedsteam	
Vervolg samenwerking	Gebiedsteam is zichtbaar en onderhoud structureel contact met Veur en Deur in Nijeholtpade. Dit kan binnen reguliere mogelijkheden van de gemeente worden uitgevoerd.	



Bijlage 4 Inventarisatie dorp - resultaten van de vragenlijsten (november 2021)

Vragenlijst inwoners (54% respons)

VRAAG	JA	NEE	Geen mening
Het is mij bekend dat we als dorp een eigen omgevingsvisie hebben geschreven	95%	2%	3%
Ik vind het nuttig dat ons dorp een eigen visie voor de toekomst heeft	94%	2%	4%
Door de visie ben ik meer betrokken bij hetgeen in het dorp en mijn omgeving gebeurt	47%	22%	31%
De omgeving waar ik woon is de afgelopen jaren verbeterd	69%	14%	17%
Ons dorp moet de komende jaren verder gaan met de uitvoering van de visie	84%	5%	11%
Ik zou daar wel een bijdrage aan willen leveren	20%	51%	29%
Met het omgevingsbulletin van PB ben ik voldoende op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in ons dorp	86%	3%	11%
De rol van ons PB als trekker van de omgevingsvisie moet zo blijven	86%	4%	10%
Het is mij bekend dat we afspraken tussen dorp en gemeente hebben vastgelegd in een Maatschappelijke Overeenkomst (met een toevoeging over wonen)	84%	4%	12%
Ik vind het nuttig dat we dit soort afspraken tussen dorp en gemeente maken	89%	2%	9%

Vragenlijst deelnemende inwoners aan werkgroepen (33% respons)

VRAAG	JA	NEE	Geen mening
De huidige werkwijze met ambtenaren en inwoners is zinvol	100%	0%	0%
In de werkgroep was duidelijk welke rol iedereen had	62%	38%	0%
Het was duidelijk vanuit de MO welke opdracht de werkgroep had	100%	0%	0%
Daarbij werden we voldoende ondersteund met kennis en kunde	24%	38%	38%
De samenwerking tussen inwoners en ambtenaren was constructief	75%	25%	0%
De opdracht die de werkgroep had is gerealiseerd	50%	37%	13%
Het is zinvol in de toekomst weer een MO af te sluiten	88%	12%	0%
Het is zinvol de uitvoering weer te doen in dit soort werkgroepen	88%	12%	0%
