Omgevingsvisie Staphorst

datum 1/30/2025


Fase	Omschrijving werkstap
	Recessen en raadsvergaderingen
	Een goede start
1	Project Start-Up
1	Projectplan opstellen
1	Participatie- en comminicatieplan opstellen
1	Kick-Off voorbereiden
1	Kick-Off
1	Bila met de wethouder
1	College MT voobereiden
1	College MT bijpraten
1	Raadsessie voorbereiden
1	informerende Raad - toelichting proces
1	Interne Antea PSU
1	Projectplan en Particiaptie- en communciatieplan bestuurlijk laten vaststellen door SH
1	opvragen stukken SH
	Kijken en luisten
2	Interviewdagen op locatie
2	Opstellen beleidsinventarisatie en analyse
2	Opstellen leefomgevinsgfoto (opgaven, bronnen, indicatoren, gebieden)
2	Feedbackronde schrijftelijk - aanvullingen
2	deadline schrijftelijke feedback
2	Uitwerken kaartmateriaal
2	verwerken laatste feedback LOF en Bi&a
2	Interviews met ketenpartners voorbereiding
2	Interviews met ketenpartners
2	Pfh bijpraten
2	Info raad
	Ambities ontwerpen
3	Uitwerken hoofdstuk ambities en kernwaarden omgevingsvisie
3	Voorbereiden sessie + afstemming
3	Amtbelijke sessie dagdeel: ambities + MER hoeken van het speelveld definieren
3	Verwerken ambtelijke info
3	Voorbereiden volgende sessie + afstemming
3	Amtbelijke sessie dagdeel: integrale blik; kansen en botsingen
3	Verwerken stukken en afronden hoofdstukken


3	info raad
4	**Vertalen naar gebieden doorwerkingen**
4	Voorbereiden ambtelijke werksessie
4	Ambtelijke sessie gebiedsgeriche uitwerking
4	Verwerken opgehaalde input
4	Voorbereiden participatie
4	Participatie gebiedsgerichte uitwerking dmv 2/3 ontwerptafels met inwoners en stakeholde
4	Plan MER+passende beoordeling
4	Verwerken en uitwerken hoofdstukken gebiedsgerichte vertaling
4	Voorbereiden college
4	College: Gebieden+Pijlers+hoofdambities.
4	Beeldvormende raad
4	Opstellen visiekaart inclusief 2 feedbackrondes en 1 ontwerpsessie
4	Brainstormsessie over sturingfilosofie en omgevinsgvisie
4	Dagdeel doorwerking omgevinsgvisie
4	Dagdeel doorwerking sturingsfilosfie
	Vaststellen
5	Opstellen ontwerp omgevingsvisie
5	Ambtelijke feedbackronde doormiddel van interviews
5	Verwerken ambtelijke feedback
5	Voorbereiden stukken definitieve concepten en college
5	Concept ontwerp aan college voorleggen
5	Raadsvergadering? - vrijgave door de Raad
5	Ter inzagelegging
5	Meewerken aan reactienota
5	Vaststelling OV

	gereed
	werkperiode
	in te plannen moment/deadline
	gepland moment/ deadline
tekst	gemeente aan zet

eigenaars	jaar	2024								
	maand	december				Januari				
	week	49	50	51	52	1	2	3	4	5
								21 januari raadsvergadering	28 jan Raad informerend	
					kerstreces					
Laurens		?								
Fuite + Laurens								9-Jan		
Laurens + allen										
Fuite + Laurens								#####		
Allen			9-Dec							
				#####				#####		
			#####							
Laurens + Tom										
Tom + Laurens										
Tom + Laurens										
SH										
SH										
Hanne + Laurens										
Tom + Laurens										
Laurens + Apperloo of Tom										
Laurens + Apperloo of Tom										
Fuite + Laurens										
Laurens + Tom + Hanne?										
Laurens + Tom										
Laurens + ??										
Tom + Laurens										
Laurens + Tom										
Laurens + ??										
Tom + Laurens										


Laurens + Tom		
Laurens + ??		
Tom + Laurens		
Allen		
Laurens + Apperloo + Tom		
???		
Tom + Laurens		
Laurens + allen		
Laurens		
Fuite of Apperloo +		
Laurens + Hanne		
Allen?		
Laurens + apperloo?		
Laurens + apperloo?		
Laurens + Tom + Hanne + ?		
Laurens + Tom		
Tom + Laurens		
Laurens + Tom		
SH		
SH		
SH + Laurens + Tom		
SH		

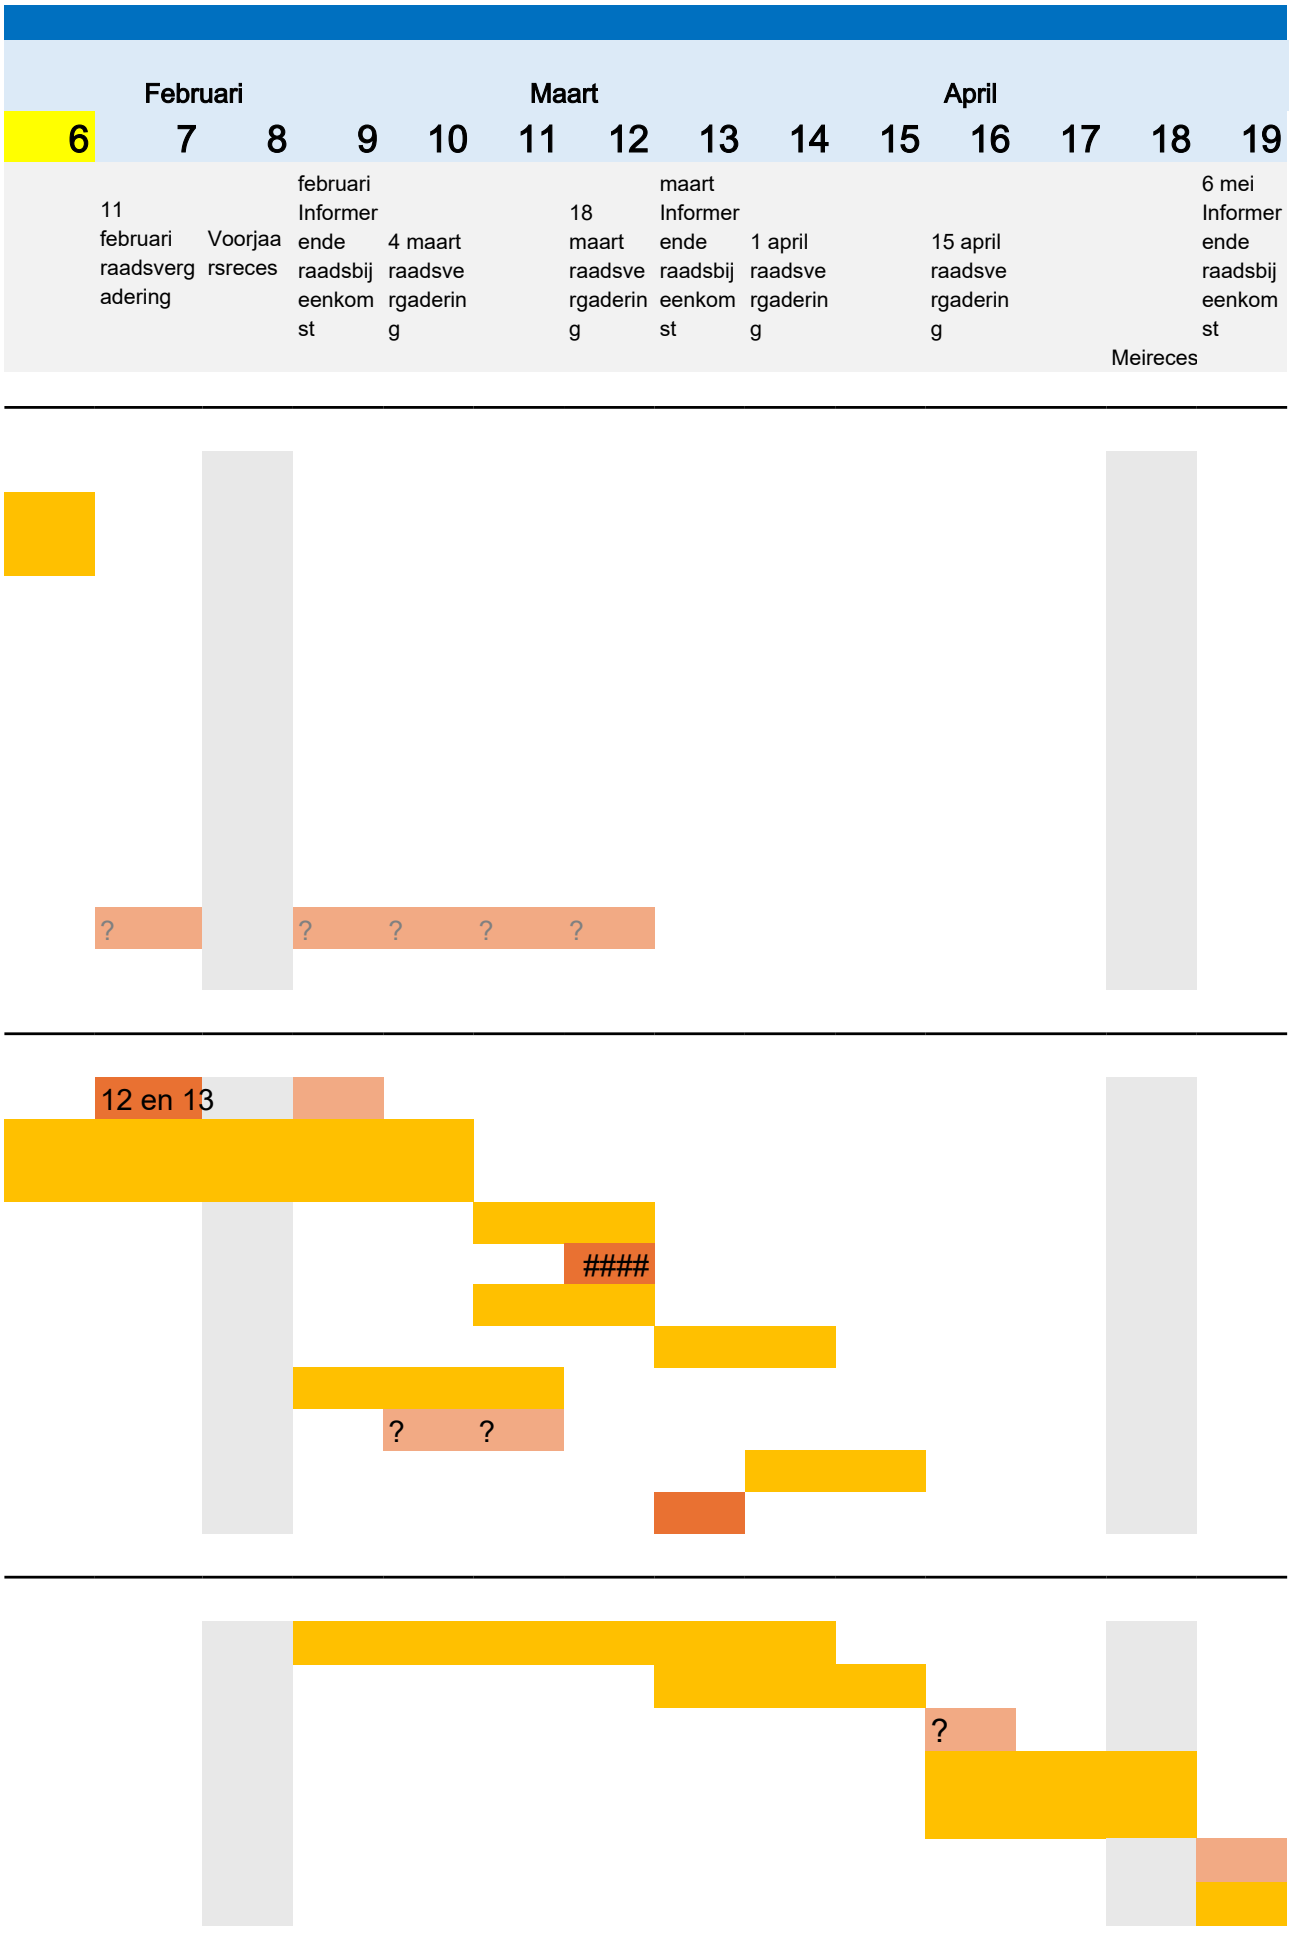
Februari
Maart
April
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
11 februari raadsvergadering
Voorjaarsreces
februari Informerende raadsbijeenkomst
4 maart raadsvergadering
18 maart raadsvergadering
maart Informerende raadsbijeenkomst
1 april raadsvergadering
15 april raadsvergadering
Meireces
6 mei Informerende raadsbijeenkomst
?
?
?
?
?
12 en 13
####
?
?
?

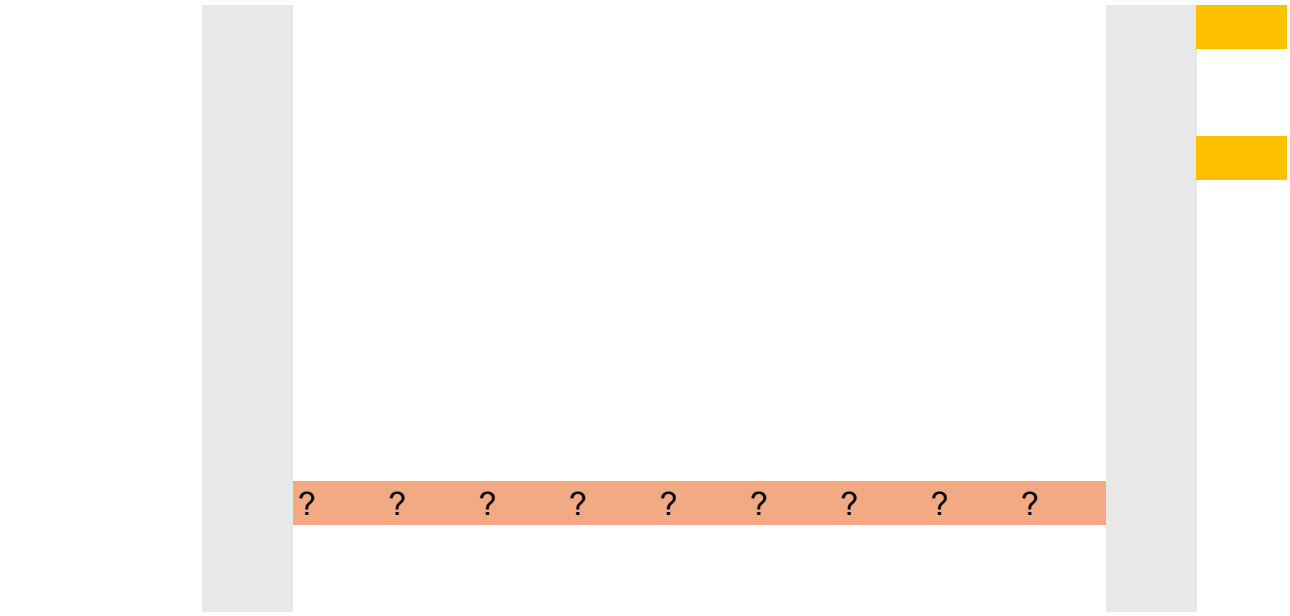



2025

Mei				Juni					Juli				augu
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
13 mei raadsvergadering		27 mei raadsvergadering		10 juni raadsvergadering	18 juni informerende raadsbijeenkomst	24 juni raadsvergadering		8 juli raadsvergadering			Zomerreces		

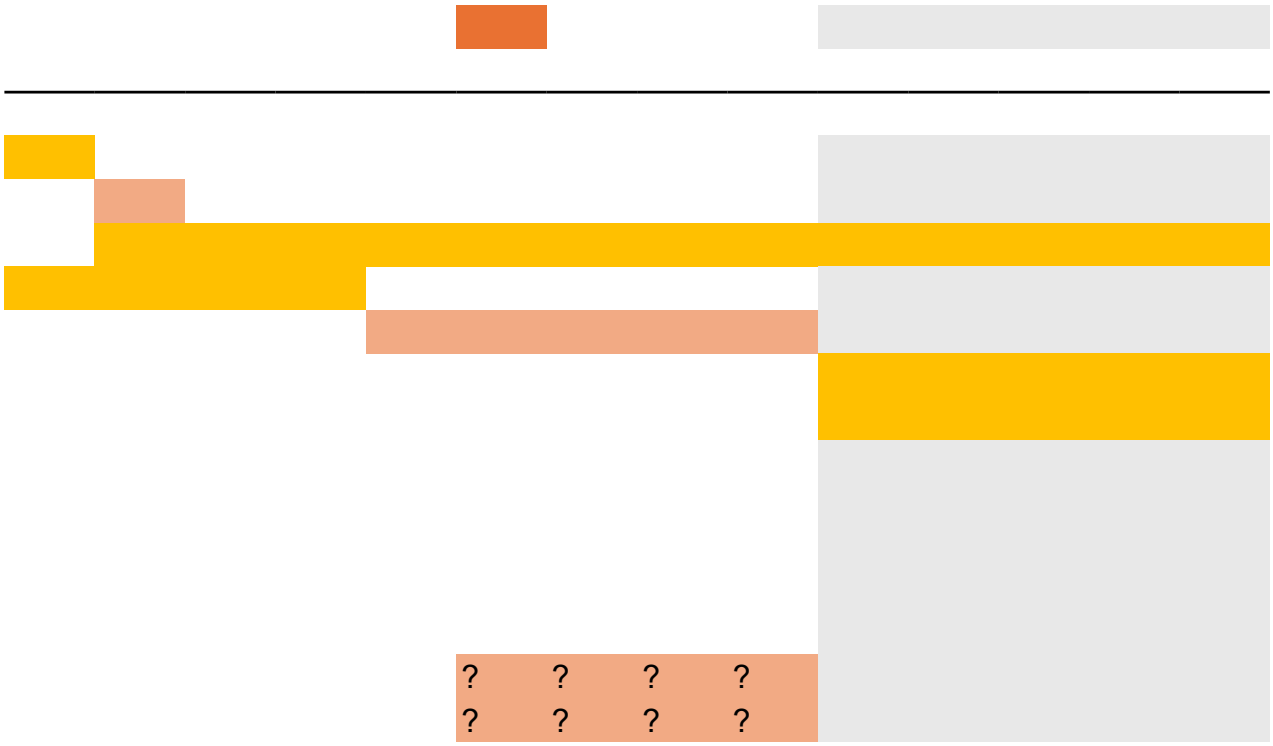


ustus	September					Oktober					November	
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			9 sep Raadsvergadering	16 sep informerende raadsbijeenkomst	23 sep raadsvergadering		7 okt raadsvergadering	14 okt informerende raadsbijeenkomst	Herfstreces	28 okt raadsvergadering		11 nov raadsvergadering	18 nov raadsvergadering

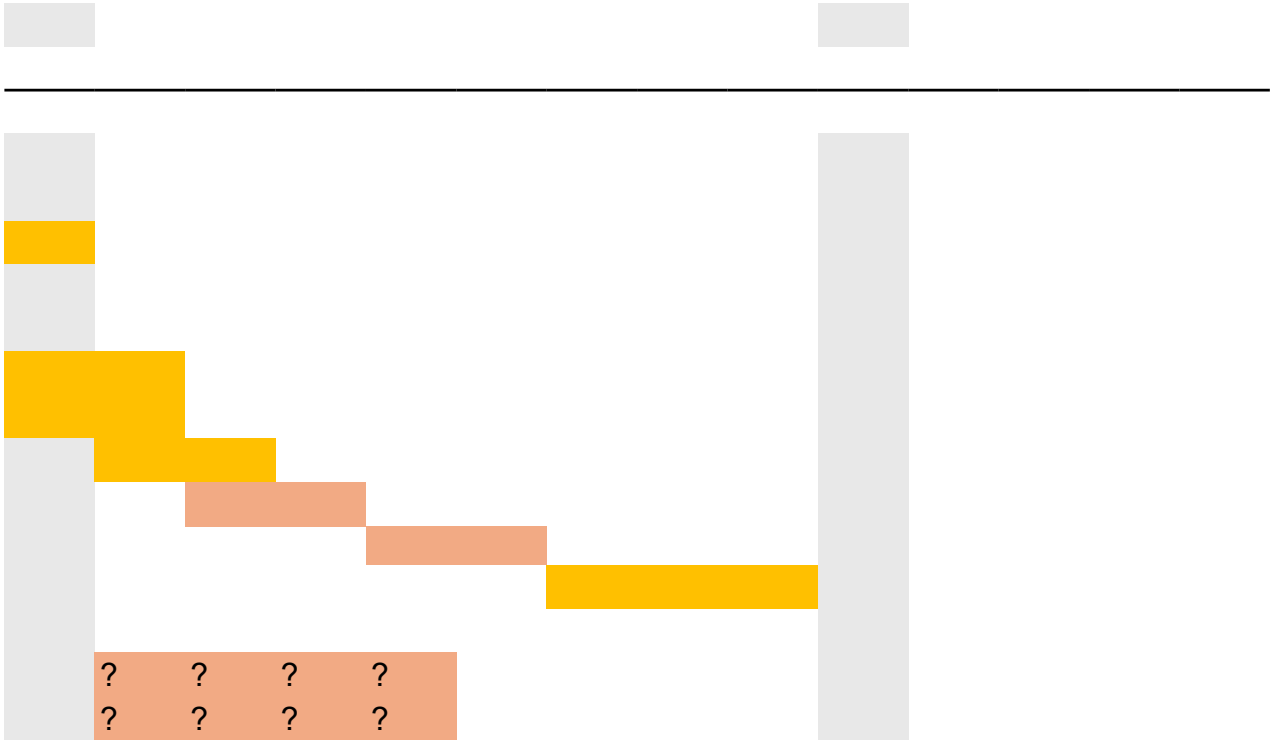

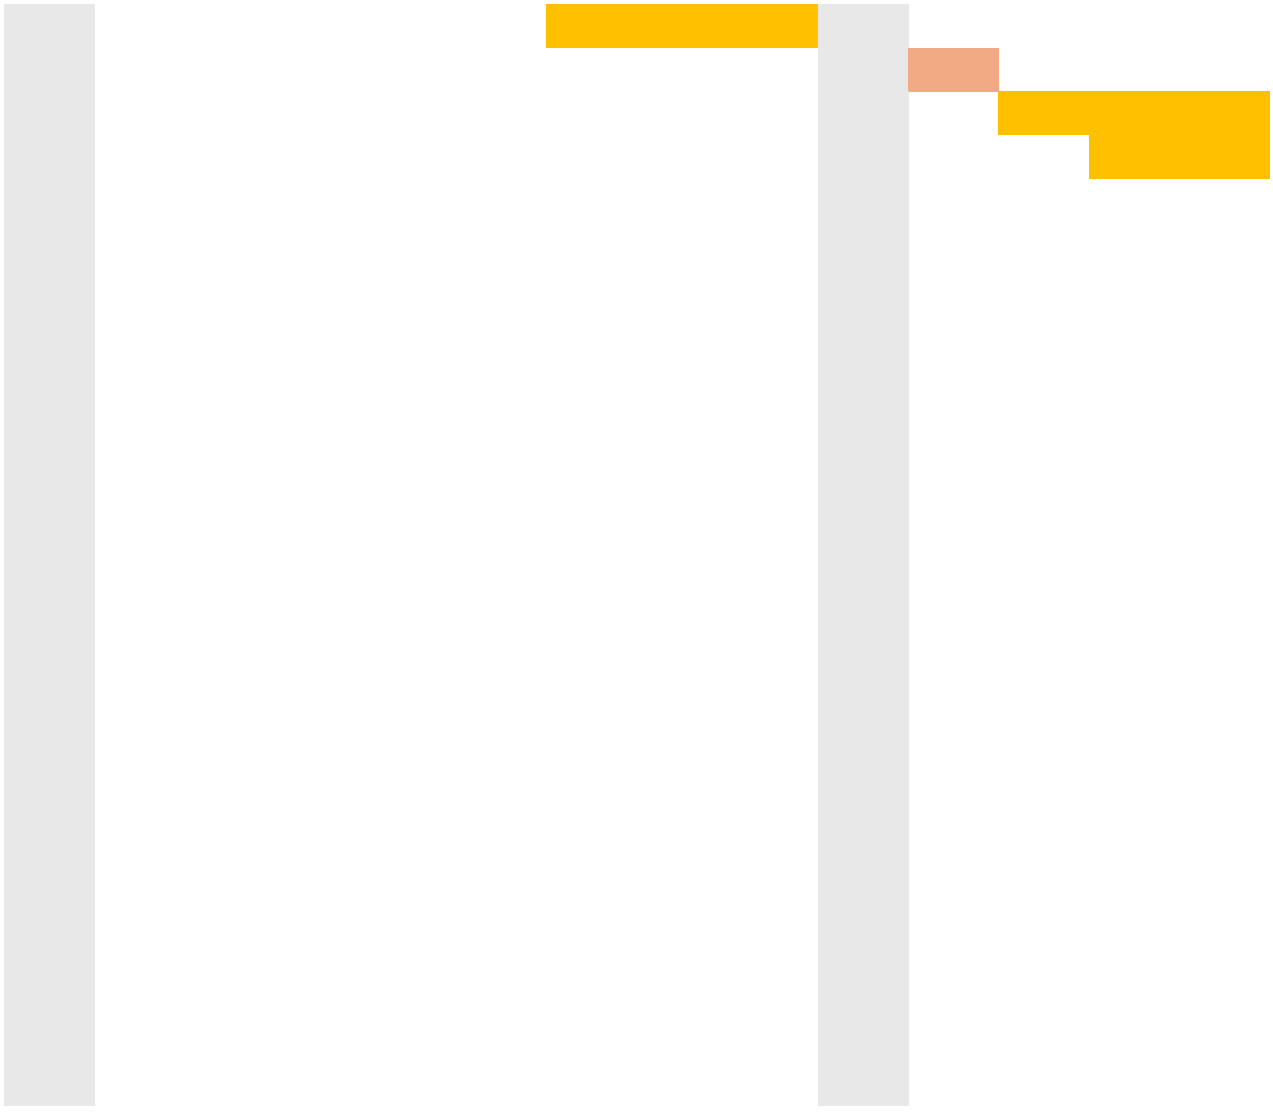


December				Januari						Febr
48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7
	2 dec raadsvergadering	9 dec informerende raadsbijeenkomst	16 raadsvergadering	Kerstreces							

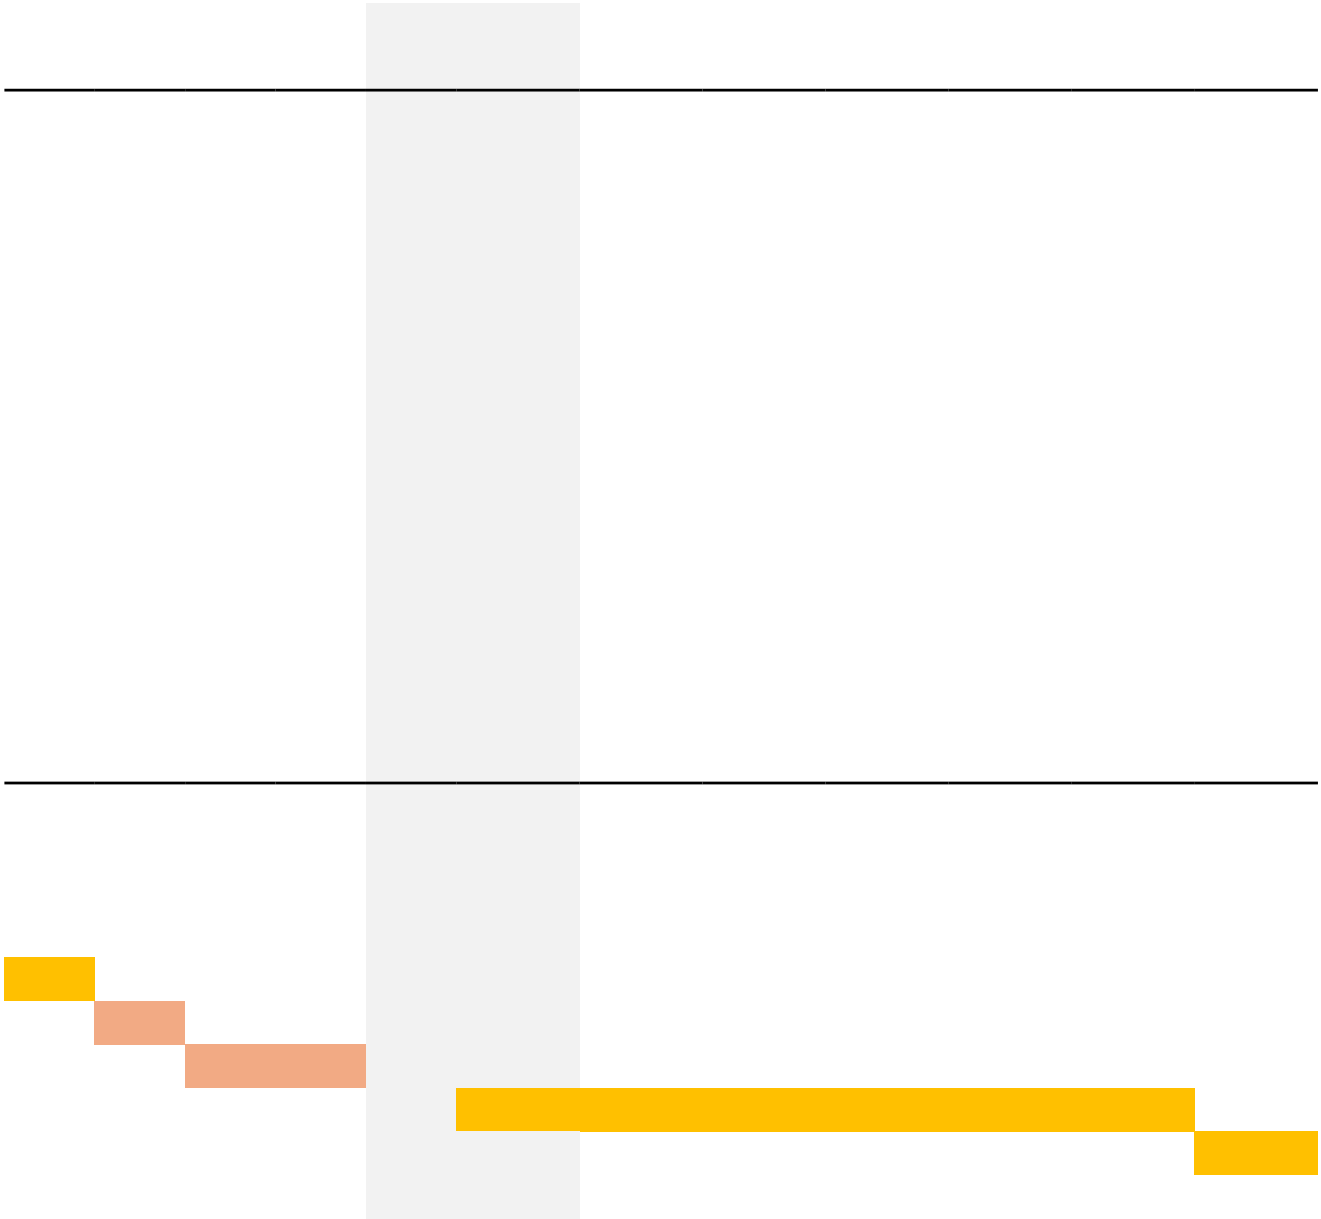

2026

ruari	Maart						April		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vorrjaarsre ces				verkiezingen 18 maart					



Mei						Juni		juli	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Meireces								



