1. Inleiding


Bij de aanbesteding van de atletiekbaan bij AV Texel zijn twee inschrijvingen ingediend, welke beide het beschikbaar gestelde krediet overschrijden.

Dit document is bedoeld om enige inzage te geven in de oorzaak hiervan en welke prijsontwikkelingen er worden verwacht.

2. Oorzaken afwijking t.o.v. raming

Er zijn enkele oorzaken aan te wijzen, waardoor er een afwijking is tussen inschrijfbedrag en krediet:

1. In eerder stadium is al gewaarschuwd voor waarschijnlijke prijsstijgingen (zie ook inkoopstrategie) tussen 10% en 20%, inmiddels kunnen we op basis van meerdere aanbestedingen (ook) van derden concluderen dat er sprake is van een brede prijsstijging op de meeste grondstoffen. Dit is heeft niet alleen betrekking op grondstoffen voor de sportmarkt (kunststof, kunstgras, lava, staal etc), maar is waarneembaar in de gehele (bouw)markt. Grondstoffen die, in dit project niet gebruikt worden, zoals PVC, hout etc zijn ook substantieel in prijs gestegen. Het is een effect dat wij met name in de laatste maanden zien ontstaan. Denk daarbij ook aan de markt van chips, waar afgelopen half jaar ook 'vreemde' ontwikkelingen zijn, maar ook aan stagnerende productie in diverse staten en landen, terwijl nu door sommige landen weer fors wordt ingekocht (China). Op basis van deze ontwikkelingen concluderen wij dat het leeuwendeel van de kostenstijgingen het effect is van COVID-19. Daarnaast is het, na een relatief rustig 2020 qua aanleg, nu drukker op de aanlegmarkt voor sporten.
2. Er lijkt in de inschrijving een aantal hoeveelheden onjuist opgevoerd. Dit is met Antea besproken en dit wordt gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.
3. Er is een verschil in m² kunstgras. In de raming (en het kredietbedrag) is uitgegaan van ca. 225m² kunstgras (schets links) en in het inschrijfbedrag is uitgegaan van ca. 604m² kunstgras (schets rechts).

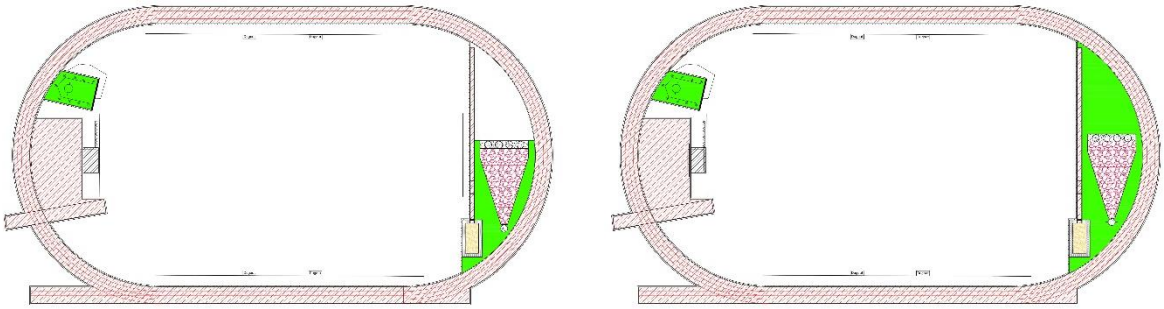

Punten 2 en 3:
Met Antea worden de afmetingen van de onderdelen nogmaals goed bekeken en afwijkingen worden gecorrigeerd. Mogelijk dat er zodoende nog een kostenreductie van ca. € 15.000 tot € 20.000 behaald kan worden.

3. Toekomstige prijsontwikkelingen

Gevraagd is tevens naar een voorspelling voor toekomstige prijsontwikkelingen. Deze is niet reëel af te geven. Er zijn echter een paar indicatoren die er op duiden dat de prijs eerder verder zal stijgen in plaats van dalen. Onze inschatting is dat in 2022 meer atletiekbanen aangelegd gaan worden dan in 2021. Dit is mede gebaseerd op onze eigen orderportefeuille en de verwachtingen en signalen binnen de Atletiekunie.
