
Id	Taaknaam	Duur	Start	Eind
0	**Hoofdweg 634-640**	**206,2**	**woe 1-12-2**	**din 16-6-26**
1	**Algemeen**	**206,2 w**	**woe 1-12-21**	**din 16-6-26**
2	**Algemeen**	**206,2 w**	**woe 1-12-21**	**din 16-6-26**
3	**Kapstok**	**197,4 w**	**din 15-2-22**	**din 16-6-26**
14	**Mijlpalen GIS en Woningbouwplanning**	**196,8 w**	**din 11-1-22**	**don 7-5-26**
28	**Definitiefase**	**49,8 wk**	**din 15-2-22**	**don 9-3-23**
35	**Uitvoeringskrediet**	**2 wkn**	**din 3-1-23**	**din 17-1-23**
37	**Besluitvorming AO en kredietaanvraag**	**7,6 wkn**	**din 17-1-23**	**don 9-3-23**
38	APO	0 vwkn	din 17-1-23	din 17-1-23
39	Staf financiën	0 wkn	maa 23-1-23	maa 23-1-23
40	B&W	0 wkn	din 31-1-23	din 31-1-23
41	Presidium	0 wkn	don 2-2-23	don 2-2-23
42	Raad sessie	0 wkn	don 23-2-23	don 23-2-23
43	Raad besluit	0 wkn	don 9-3-23	don 9-3-23
44	**Ontwerpfase**	**62,6 wk**	**woe 1-12-21**	**don 6-4-23**
59	**Ruimtelijke procedures en vergunningen**	**90 wkn**	**maa 7-2-22**	**don 22-2-24**
60	**MER beoordeling**	**16,6 wk**	**vri 20-1-23**	**din 16-5-23**
61	MER beoordelingsbeslissing (incl. afstemming gemeente)	6 wkn	vri 20-1-23	vri 3-3-23
62	Staf RO	0 wkn	don 9-3-23	don 9-3-23
63	B&W	0 wkn	din 21-3-23	din 21-3-23
64	Aan te leveren voor publicatie	2 vwkn	din 21-3-23	din 4-4-23
65	Publicatie MER beoordelingsbeslissing tesamen met ontwerp bestemmingsplan	6 vwkn	din 4-4-23	din 16-5-23
66	**Bestemmingsplan**	**78 wkn**	**maa 7-2-22**	**don 16-11-23**
73	Toetsing ontwerp BP door gemeente (termijn mede afhankelijk van kwaliteit aangeleverde ontwerp BP en toetsing Aerius berekeningen)	4 vwkn	din 31-1-23	din 28-2-23
74	Ontwerp bestemmingsplan in staf RO	0 wkn	don 9-3-23	don 9-3-23
75	Ontwerp bestemmingsplan in B&W	0 wkn	din 21-3-23	din 21-3-23
76	Vastgesteld ontwerp bestemmingsplan	0 wkn	din 21-3-23	din 21-3-23
77	Aanleveren voor publicatie ontwerp bestemmingsplan en MER beoordeling	2 vwkn	din 21-3-23	din 4-4-23
78	Ter inzagelegging en zienswijze ontwerp bestemmingsplan	6 vwkn	din 4-4-23	din 16-5-23
79	Informatieavond omwonenden	2 wkn	woe 5-4-23	din 18-4-23
80	Verwerken zienswijze(n) (invullen indien van toepassin	4 wkn	woe 17-5-23	din 13-6-23
81	Opstellen bestemmingsplan (termijn mede afhankelijk van evt. zienswijze/ wijzigingen)	2 wkn	woe 14-6-23	din 27-6-23
82	Bestemmingsplan in staf RO	0 wkn	maa 3-7-23	maa 3-7-23
83	Bestemmingsplan in B&W	0 wkn	din 5-9-23	din 5-9-23
84	Bestemmingsplan in raad sessie	0 wkn	don 14-9-23	don 14-9-23
85	Bestemmingsplan in raad besluit (datum is inschatting kalender nog niet bekend)	0 wkn	don 21-9-23	don 21-9-23
86	Vastgesteld bestemmingsplan	0 wkn	don 21-9-23	don 21-9-23
87	Aanleveren voor publicatie bestemmingsplan	2 vwkn	don 21-9-23	don 5-10-23
88	Terinzagelegging en hoger beroep bestemmingsplan	6 vwkn	don 5-10-23	don 16-11-23
89	Beslissing op hoger beroep (invullen indien van toepassing)	0 wkn	don 16-11-23	don 16-11-23
90	Inwerkingtreding (op z'n vroegst)	0 wkn	don 16-11-23	don 16-11-23
91	**Procedure hogere grenswaarden**	**8 wkn**	**woe 5-4-23**	**din 30-5-23**
92	Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere grenswaarden (gelijk met ontwerp BP)	6 wkn	woe 5-4-23	din 16-5-23
93	verwerken zienswijze(n) (indien van toepassing)	0 wkn	din 16-5-23	din 16-5-23
94	Opstellen definitief besluit	2 wkn	woe 17-5-23	din 30-5-23
95	Inschrijven hogere waarden in kadaster	0 wkn	din 30-5-23	din 30-5-23
96	**Omgevingsvergunning (bouw)**	**12 wkn**	**don 16-11-2**	**don 22-2-24**



Id	Taaknaam	Duur	Start	Eind
102	**Sloopmelding**	**5 wkn**	**woe 17-5-23**	**din 20-6-23**
104	**Voorbereidingsfase**	**29 wkr**	**vri 7-4-23**	**don 11-1-24**
114	**Realisatiefase**	**102 wk**	**don 16-11-2**	**don 5-2-26**
122	**Nazorgfase**	**13 wkr**	**vri 6-2-26**	**don 7-5-26**

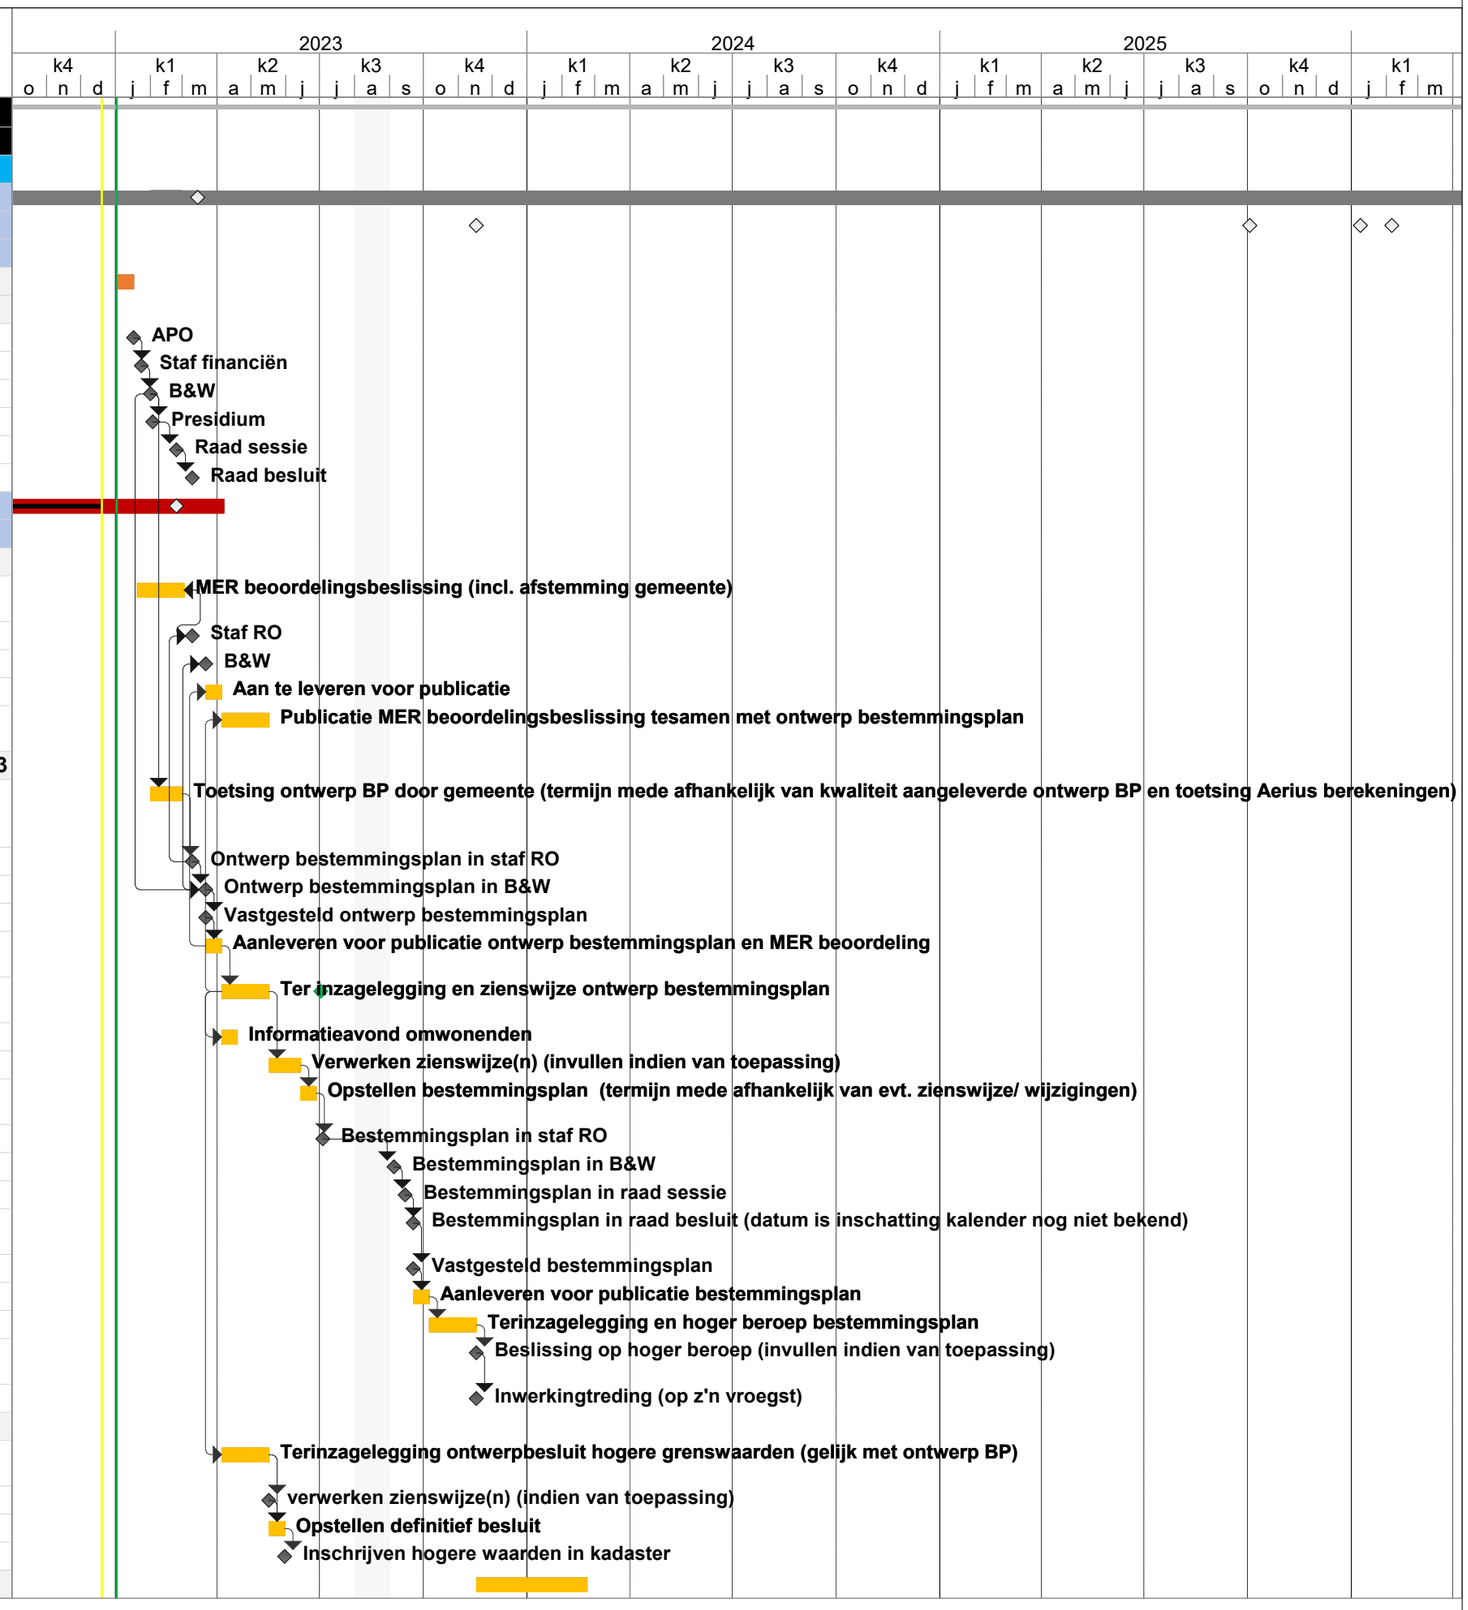
