
Planning Snowworld

Id	Taaknaam	Begindatum	Duur	Einddatum
1	0. Initiatieffase	maa 4-10-21	19,2 wkn	maa 28-2-22
2	Projectopdracht	maa 4-10-21	8 wkn	vri 26-11-21
3	Opstellen projectopdracht	maa 4-10-21	8 wkn	vri 26-11-21
4	Participatievoorstel (onderdeel PO)	maa 4-10-21	8 wkn	vri 26-11-21
5	Globale financiële doorrekening	maa 4-10-21	8 wkn	vri 26-11-21
6	*Optioneel langs de PAG*	maa 4-10-21	*1 wk*	vri 8-10-21
7	Intentieovereenkomst (inclusief demarcatie)	maa 4-10-21	12 wkn	vri 7-1-22
8	Opstellen intentieovereenkomst met initiatiefnemer	maa 4-10-21	6 wkn	vri 12-11-21
9	Demarcatie vastleggen	maa 4-10-21	8 wkn	vri 26-11-21
10	Onderhandelingen	maa 29-11-21	4 wkn	vri 7-1-22
11	Ondertekening (B&W?)	vri 7-1-22	0 wkn	vri 7-1-22
12	Besluitvorming initiatieffase	maa 10-1-22	7,2 wkn	maa 28-2-22
13	Akkoord AOG	*maa 10-1-22*	1 wk	*vri 14-1-22*
14	Akkoord BOG	maa 17-1-22	1 wk	vri 21-1-22
15	Start parafering AO	maa 24-1-22	1 dag	maa 24-1-22
16	B&W: Besluit start project	din 25-1-22	0 wkn	din 25-1-22
17	Commissie	maa 21-2-22	0 wkn	maa 21-2-22
18	Raadsvergadering	maa 28-2-22	0 wkn	maa 28-2-22
19	1. Haalbaarheidsfase	maa 4-10-21	6,6 wkn?	woe 17-11-21
20	Participatietraject	din 1-3-22	15,5 wkn?	don 16-6-22
21	Uitvragen/formeren participatiegerechtigden obv stakeholdersanalyse	din 1-3-22	0,2 wkn?	din 1-3-22
22	Informatiebijeenkomst voorbereiden voor omgeving (consulteren)	din 1-3-22	5,5 wkn	don 7-4-22
23	Bijeenkomst 1: inpassing planvoorstel irt omgeving Buytenpark	don 7-4-22	0 wkn	don 7-4-22
24	Sfeerverslag op de website + 2 weken om te reageren voor bewoners	don 7-4-22	2 wkn	don 21-4-22
25	Informatiebijeenkomst voorbereiden	don 7-4-22	6 wkn	don 19-5-22
26	Bijeenkomst 2: terugkoppeling resultaten aangepast planvoorstel	don 19-5-22	0 wkn	don 19-5-22
27	Eindverslag participatie opstellen	don 19-5-22	4 wkn	don 16-6-22
28	Planvoorstel SnowWorld	don 7-4-22	6 wkn	don 19-5-22
29	Nader uitwerken planvoorstel door SnowWorld	don 7-4-22	6 wkn	don 19-5-22
30	MER-beoordeling	don 19-5-22	6,4 wkn?	maa 4-7-22
31	Input gereed voor een actualisatie = ontwerp Snowworld	don 19-5-22	0,2 wkn?	vri 20-5-22
32	Actualiseren MER-beoordeling	vri 20-5-22	6 wkn	vri 1-7-22
33	Intern / extern?	vri 1-7-22	0,2 wkn?	maa 4-7-22
34	GREX	din 1-3-22	6 wkn	maa 11-4-22
35	Opstellen grondexploitatie en/of inzichtelijk maken te verhalen kosten (middels een anterieure overeenkomst).	din 1-3-22	6 wkn	maa 11-4-22
36	Haalbaarheidsanalyse + notitie (puk?)	maa 11-4-22	17,7 wkn	vri 12-8-22
37	Participatie input	don 16-6-22	0 wkn	don 16-6-22
38	Ruimtelijke onderbouwing input	don 19-5-22	0 wkn	don 19-5-22
39	Planologische input	vri 1-7-22	0 wkn	vri 1-7-22
40	Financiële input	maa 11-4-22	0 wkn	maa 11-4-22
41	Subsidiemogelijkheden onderzoeken	maa 11-4-22	0 wkn	maa 11-4-22
42	Opstellen haalbaarheidsanalyse	vri 1-7-22	6 wkn	vri 12-8-22
43	Bestuurlijk traject met samenspraak uitkomst, PUK, GREX en akkoord op vervolg project	vri 12-8-22	7,7 wkn	woe 5-10-22
44	Akkoord AOG	vri 12-8-22	1 wk	vri 19-8-22
45	Akkoord BOG	vri 19-8-22	0,5 wkn	din 23-8-22
46	Start parafering AO	woe 24-8-22	1 dag	woe 24-8-22
47	B&W: Besluit vervolg project	don 1-9-22	0 wkn	don 1-9-22
48	Commissie	woe 28-9-22	0 wkn	woe 28-9-22
49	Raadsvergadering (nieuw college na verkiezingen)	woe 5-10-22	0 wkn	woe 5-10-22
50	2. Uitwerkingsfase	don 6-10-22	52,5 wkn	maa 9-10-23
51	Projectopdracht	don 6-10-22	0,2 wkn	don 6-10-22
52	Bijwerken projectopdracht incl. communicatieplan	don 6-10-22	0,2 wkn	don 6-10-22
53	Samenwerkingsovereenkomst	don 6-10-22	0,2 wkn	don 6-10-22
54	Opstellen	don 6-10-22	0,2 wkn	don 6-10-22
55	Erfpachtovereenkomst	don 6-10-22	0,2 wkn	don 6-10-22
56	Opstellen	don 6-10-22	0,2 wkn	don 6-10-22
57	Ontwerpen	don 6-10-22	34 wkn	woe 31-5-23
58	VO	don 6-10-22	16 wkn	woe 25-1-23
59	Toets	don 26-1-23	3 wkn	woe 15-2-23
60	DO	don 16-2-23	12 wkn	woe 10-5-23
61	Toets	don 11-5-23	3 wkn	woe 31-5-23
62	Bestemmingsplanprocedure (omgevingsplan)	don 6-10-22	52,5 wkn	maa 9-10-23
63	Voorontwerp BP	don 6-10-22	21,8 wkn	din 7-3-23
64	Onderzoeken	don 6-10-22	6 wkn	woe 16-11-22
65	Opstellen voorontwerp bestemmingsplan t/m klaar voor vaststelling B&W	don 6-10-22	12 wkn	woe 28-12-22
66	Toets voorontwerp bestemmingsplan door gemeente	don 1-12-22	4 wkn	woe 28-12-22
67	Opstellen collegevoorstel	don 15-12-22	2 wkn	woe 28-12-22
68	Ambtelijk overleg	don 29-12-22	1 dag	don 29-12-22
69	Wethoudersoverleg	din 3-1-23	0 dagen	din 3-1-23
70	Start parafering AO	don 5-1-23	0 wkn	don 5-1-23
71	College B&W	vri 13-1-23	0 wkn	vri 13-1-23
72	Publicatie kennisgeving	din 24-1-23	1 dag	din 24-1-23
73	Vooroverleg overheidspartners	woe 25-1-23	6 wkn	din 7-3-23
74	Consultatie raad	woe 25-1-23	6 wkn	din 7-3-23
75	Ontwerp BP	woe 8-3-23	16,7 wkn	maa 3-7-23
76	Opstellen ontwerp besluit	woe 8-3-23	6 wkn	din 18-4-23
77	Opstellen collegevoorstel	woe 12-4-23	2 wkn	din 25-4-23
78	Ambtelijk overleg	don 27-4-23	0 dagen	don 27-4-23
79	Wethoudersoverleg	din 2-5-23	0 dagen	din 2-5-23
80	Start parafering AO	vri 5-5-23	0 wkn	vri 5-5-23
81	College B&W	don 11-5-23	0 wkn	don 11-5-23
82	Publicatie	maa 22-5-23	0 dagen	maa 22-5-23
83	Zienswijzetermijn	maa 22-5-23	6 wkn	maa 3-7-23
84	Definitief BP	maa 3-7-23	14 wkn	maa 9-10-23
85	Verwerking zienswijzen	maa 3-7-23	0 wkn	maa 3-7-23
86	Opstellen college- en raadsvoorstel	maa 3-7-23	3 wkn	maa 24-7-23
87	Wethoudersoverleg	woe 26-7-23	0 dagen	woe 26-7-23
88	Start parafering AO	don 27-7-23	0 wkn	don 27-7-23
89	College B&W	don 3-8-23	0 dagen	don 3-8-23
90	Commissievergadering	woe 13-9-23	0 wkn	woe 13-9-23
91	Raad: Vaststelling bestemmingsplan	don 21-9-23	0 wkn	don 21-9-23
92	Publicatie	maa 2-10-23	1 wk	maa 9-10-23
93	Participatie vervolg	don 16-2-23	12 wkn	woe 10-5-23
94	Informeren (bij VO bouwplan)	don 16-2-23	12 wkn	woe 10-5-23
95	3. Uitvoeringsfase	maa 9-10-23	74,2 wkn?	din 11-3-25
96	Omgevingsvergunning activiteit bouwen	maa 9-10-23	14 wkn	maa 15-1-24
97	BRM	maa 15-1-24	6 wkn	maa 26-2-24
98	Overdracht grond / vestigen erfpacht	maa 26-2-24	2 wkn	maa 11-3-24
99	Uitvoering door Snowworld	maa 11-3-24	52 wkn	maa 10-3-25
100	WRM	maa 16-12-24	12 wkn	maa 10-3-25
101	Overdracht Stadsbeheer	maa 10-3-25	0,2 wkn?	din 11-3-25

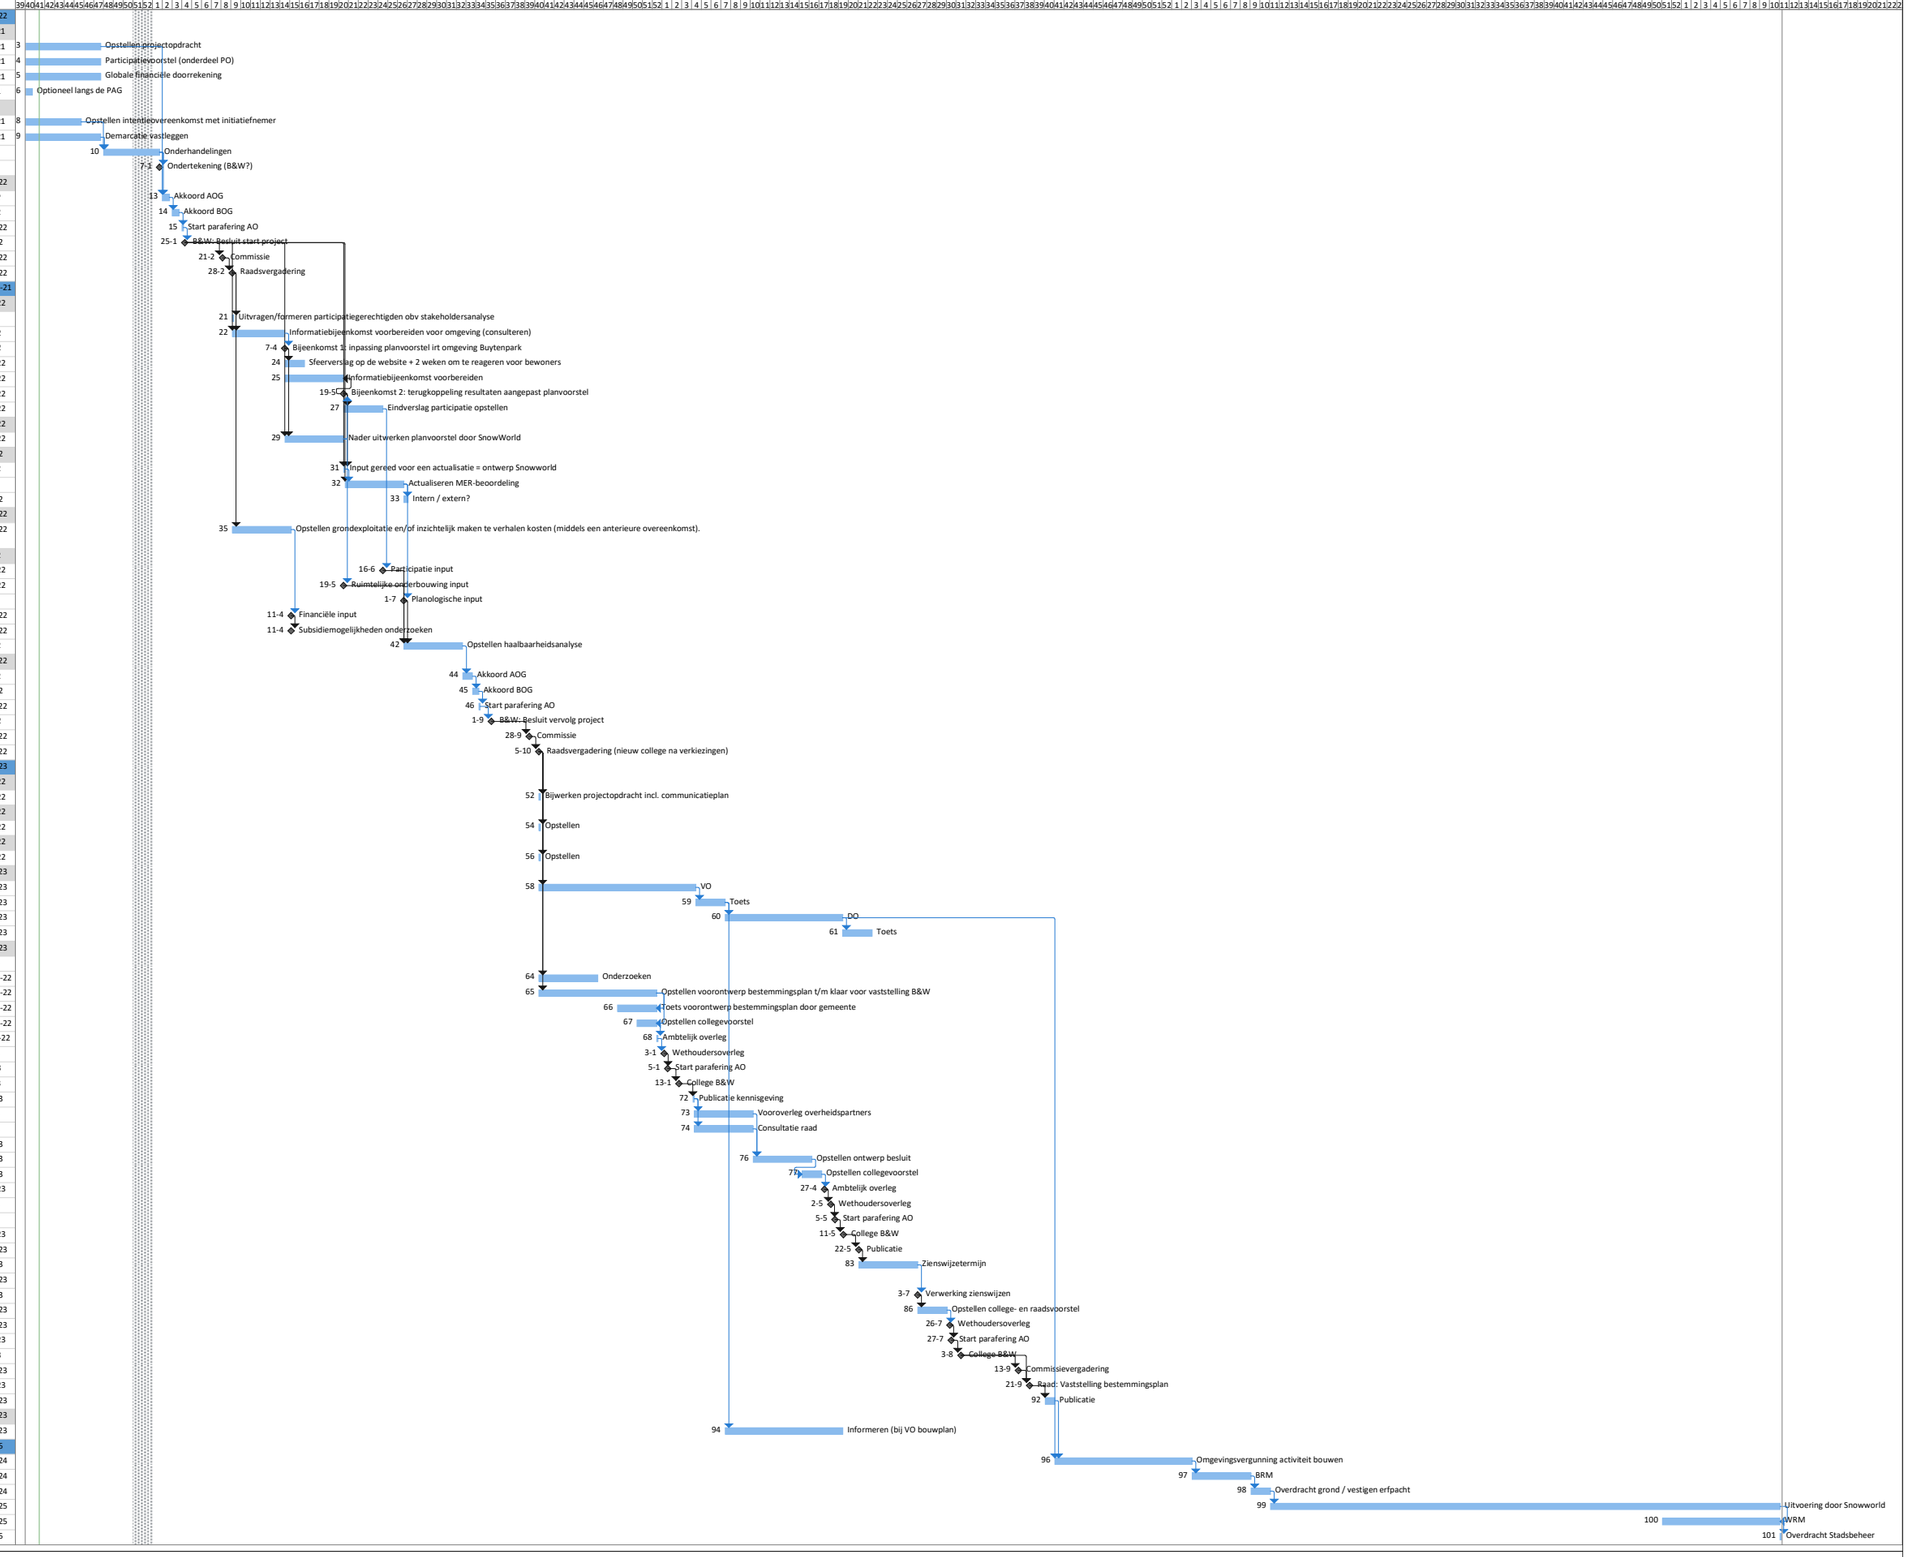

Planner: Véronique Willems
Datum: don 14-10-21

Taak Mijlpaal
