
Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1	Motie Doorbreek de dilemma's aangenomen	1 dag	don 6-3-25	don 6-3-25	
2	Raadsinformatiebrief opstellen incl. kwaliteitscontrole en stukkenstroom college	27 dagen	maa 17-3-25	din 22-4-25	
3	Brief naar de raad	1 dag	woe 23-4-25	woe 23-4-25	2
4	Procesmanager start (vanuit raamovereenkomst)	1 dag	don 1-5-25	don 1-5-25	
5	I Onderzoek naar ontwikkelruimte binnen nieuw stikstofkader	75 dagen	vri 2-5-25	don 14-8-25	4
6	II Inventarisatie gewenste ontwikkelingen in Noorden	75 dagen	vri 2-5-25	don 14-8-25	4
7	III Onderzoek naar extra verkeersbewegingen over de bestaande infrastructuur	75 dagen	vri 2-5-25	don 14-8-25	4
8	IV Onderzoek naar mogelijkheden voor ontsluiting bouwverkeer	75 dagen	vri 2-5-25	don 14-8-25	4
9	V Overleg met de provincie over stikstofruimte (stap I en II)	30 dagen	don 22-5-25	woe 2-7-25	4BE+14 dagen
10	**VI Herijking startnotitie**	**120 dagen**	**vri 15-8-25**	**don 29-1-26**	
11	Verwerken uitkomsten onderzoeken + gesprek met provincie	14 dagen	vri 15-8-25	woe 3-9-25	8
12	Schrijven startnotitie + raadsvoorstel	30 dagen	don 4-9-25	woe 15-10-2	11
13	Kwaliteitscontrole (TL, PM, PH)	14 dagen	don 16-10-25	din 4-11-25	12
14	Stukkenstroom college	7 dagen	maa 1-12-25	din 9-12-25	13
15	Stukkenstroom raad	37 dagen	woe 10-12-2	don 29-1-26	14
16	Opstellen Stedenbouwkundigplan	12 mndn	vri 30-1-26	don 31-12-26	15
17	Planologische procedure (BOPA)	14 mndn	maa 27-4-26	vri 21-5-27	15BE+61 dagen
18	Tenderdocumenten opstellen	7 mndn	vri 9-10-26	don 22-4-27	16BE-60 dagen
19	Tenderprocedure	10 mndn	maa 24-5-27	vri 25-2-28	17
20	Voorbereidingsfase	12 mndn	maa 28-2-28	vri 26-1-29	19
21	Uitvoeringsfase	15 mndn	maa 29-1-29	vri 22-3-30	20

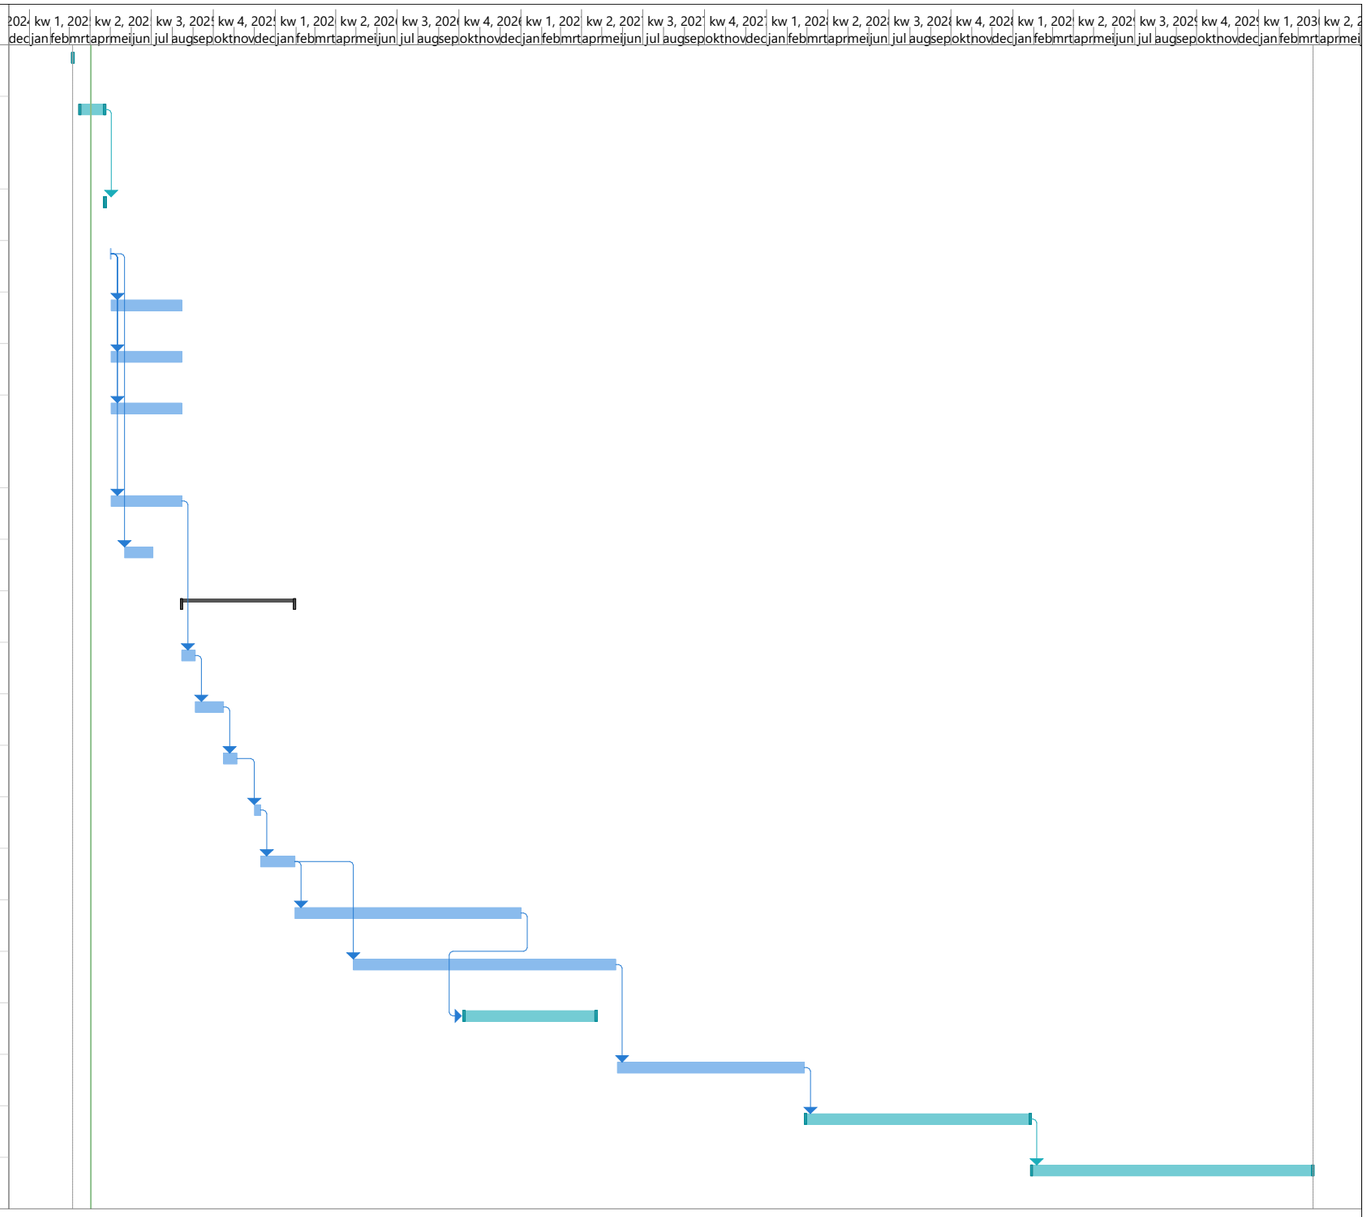

Project: Planning motie Lvk
Datum: woe 2-4-25

Taak	Samenvatting	Inactieve mijlpaal	Alleen duur	Alleen begindatum	Externe mijlpaal	Voortgang, handmatig
Splitsing	Projectsamenvatting	Inactieve samenvatting	Handmatige samenvatting	Alleen einddatum	Deadline	
Mijlpaal	Inactieve taken	Handmatig taak	Handmatige samenvatting	Externe taken	Voortgang	
