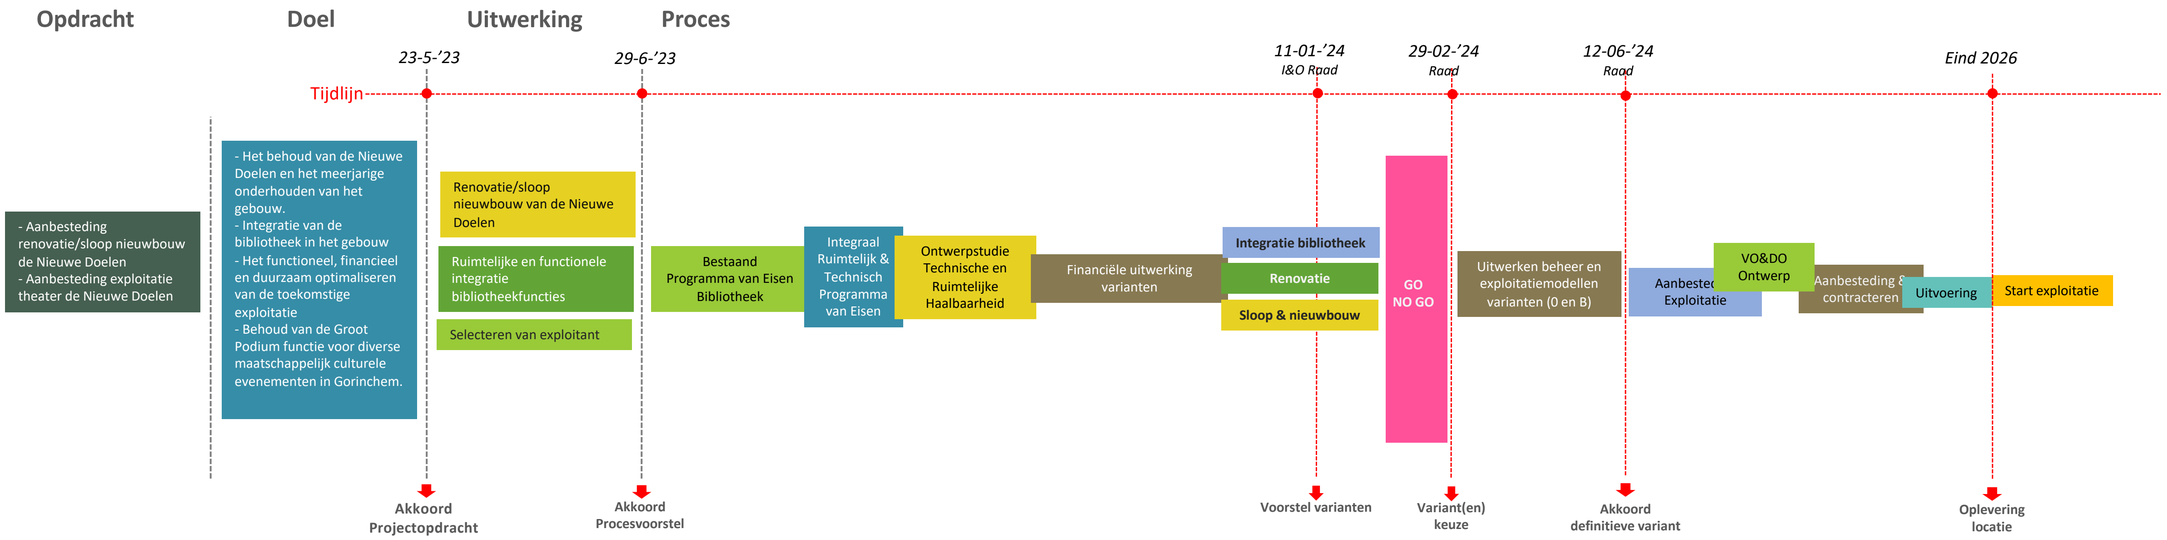

Opdracht
Doel
Uitwerking
Proces
23-5-'23
29-6-'23
11-01-'24
I&O Raad
29-02-'24
Raad
12-06-'24
Raad
Eind 2026
Tijdlijn
- Aanbesteding renovatie/sloop nieuwbouw de Nieuwe Doelen
- Aanbesteding exploitatie theater de Nieuwe Doelen
- Het behoud van de Nieuwe Doelen en het meerjarige onderhouden van het gebouw.
- Integratie van de bibliotheek in het gebouw
- Het functioneel, financieel en duurzaam optimaliseren van de toekomstige exploitatie
- Behoud van de Groot Podium functie voor diverse maatschappelijk culturele evenementen in Gorinchem.
Renovatie/sloop nieuwbouw van de Nieuwe Doelen
Ruimtelijke en functionele integratie bibliotheekfuncties
Selecteren van exploitant
Bestaand Programma van Eisen Bibliotheek
Integraal Ruimtelijk & Technisch Programma van Eisen
Ontwerpstudie Technische en Ruimtelijke Haalbaarheid
Financiële uitwerking varianten
Integratie bibliotheek
Renovatie
Sloop & nieuwbouw
GO
NO GO
Uitwerken beheer en exploitatiemodellen varianten (0 en B)
Aanbesteding Exploitatie
VO&DO Ontwerp
Aanbesteding & contracteren
Uitvoering
Start exploitatie
Akkoord Projectopdracht
Akkoord Procesvoorstel
Voorstel varianten
Variant(en) keuze
Akkoord definitieve variant
Oplevering locatie
