
Id	Ta	Taaknaam
1		tijdelijke huisvesting
2		kerstvakantie 2023/2024
3		voorjaarsvakantie
4		2e paasdag
5		hemelvaartvakantie
6		2e pinksterdag
7		bouwvakvakantie
8		kerstvakantie 2024/2025
9		voorjaarsvakantie
10		koningsdag
11		meivakantie
12		verstrekken stichtingskostenoverzicht
13		aanleveren stukken
14		PHO
15		college
16		commissie
17		Raad
18		Krediet beschikbaar
19		stuurgroepvergaderingen 1 per 4 weken
20		aanvraag offerte asbestinventarisatie
21		aanvraag offerte verkennend bodemonderzoek
22		aanvraag offerte flora en fauna
23		aanvraag offerte archeologische onderzoek
24		aanvraag offerte stikstofonderzoek
25		aanvraag akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
26		aanvraag offerte funderingsadvies
27		aanvraag offerte infiltratie
28		aanvraag offerte PFAS-onderzoek
29		aanvraag offerte inmeting terrein
30		verstrekken offertes
31		aanvraag constructeur
32		opstellen programma van eisen Buurtcollege
33		programma van eisen nalopen
34		vaststellen verkeerssituatie omgeving
35		bereikbaarheid van en naar school, auto en fiets
36		vaststellen parkeren auto's
37		start schrijven bestek
38		bestek schrijven
39		1e controle ronde bestek
40		aanpassen bestek
41		bestek gereed
42		aanbesteding
43		proces van verbaal van aanwijzing
44		nota van inlichtingen verstrekken
45		sluitingsdatum t.b.v presentatie
46		beoordelen presentatie
47		opstellen offerte
48		beoordelen offerte
49		publicatie gegunde opdracht
50		verstrekken opdracht
51		start voorlopig ontwerp
52		goedkeuring voorlopig ontwerp
53		aanvraag stroomaansluiting
54		aanvraag wateraansluiting
55		aanvraag data-aansluiting
56		start definitief ontwerp
57		definitief ontwerp
58		aanvraag omgevingsvergunning
59		bouwvergunningstraject
60		verstrekken omgevingsvergunning
61		bezwaartermijn
62		start werkvoorbereiding
63		werkvoorbereiding
64		grondwerk en fundaties units
65		aanleg speelplaats
66		monteren tijdelijke huisvesting
67		vooroplevering
68		narooien
69		oplevering
70		inrichting school
71		verhuizing
72		school in gebruik

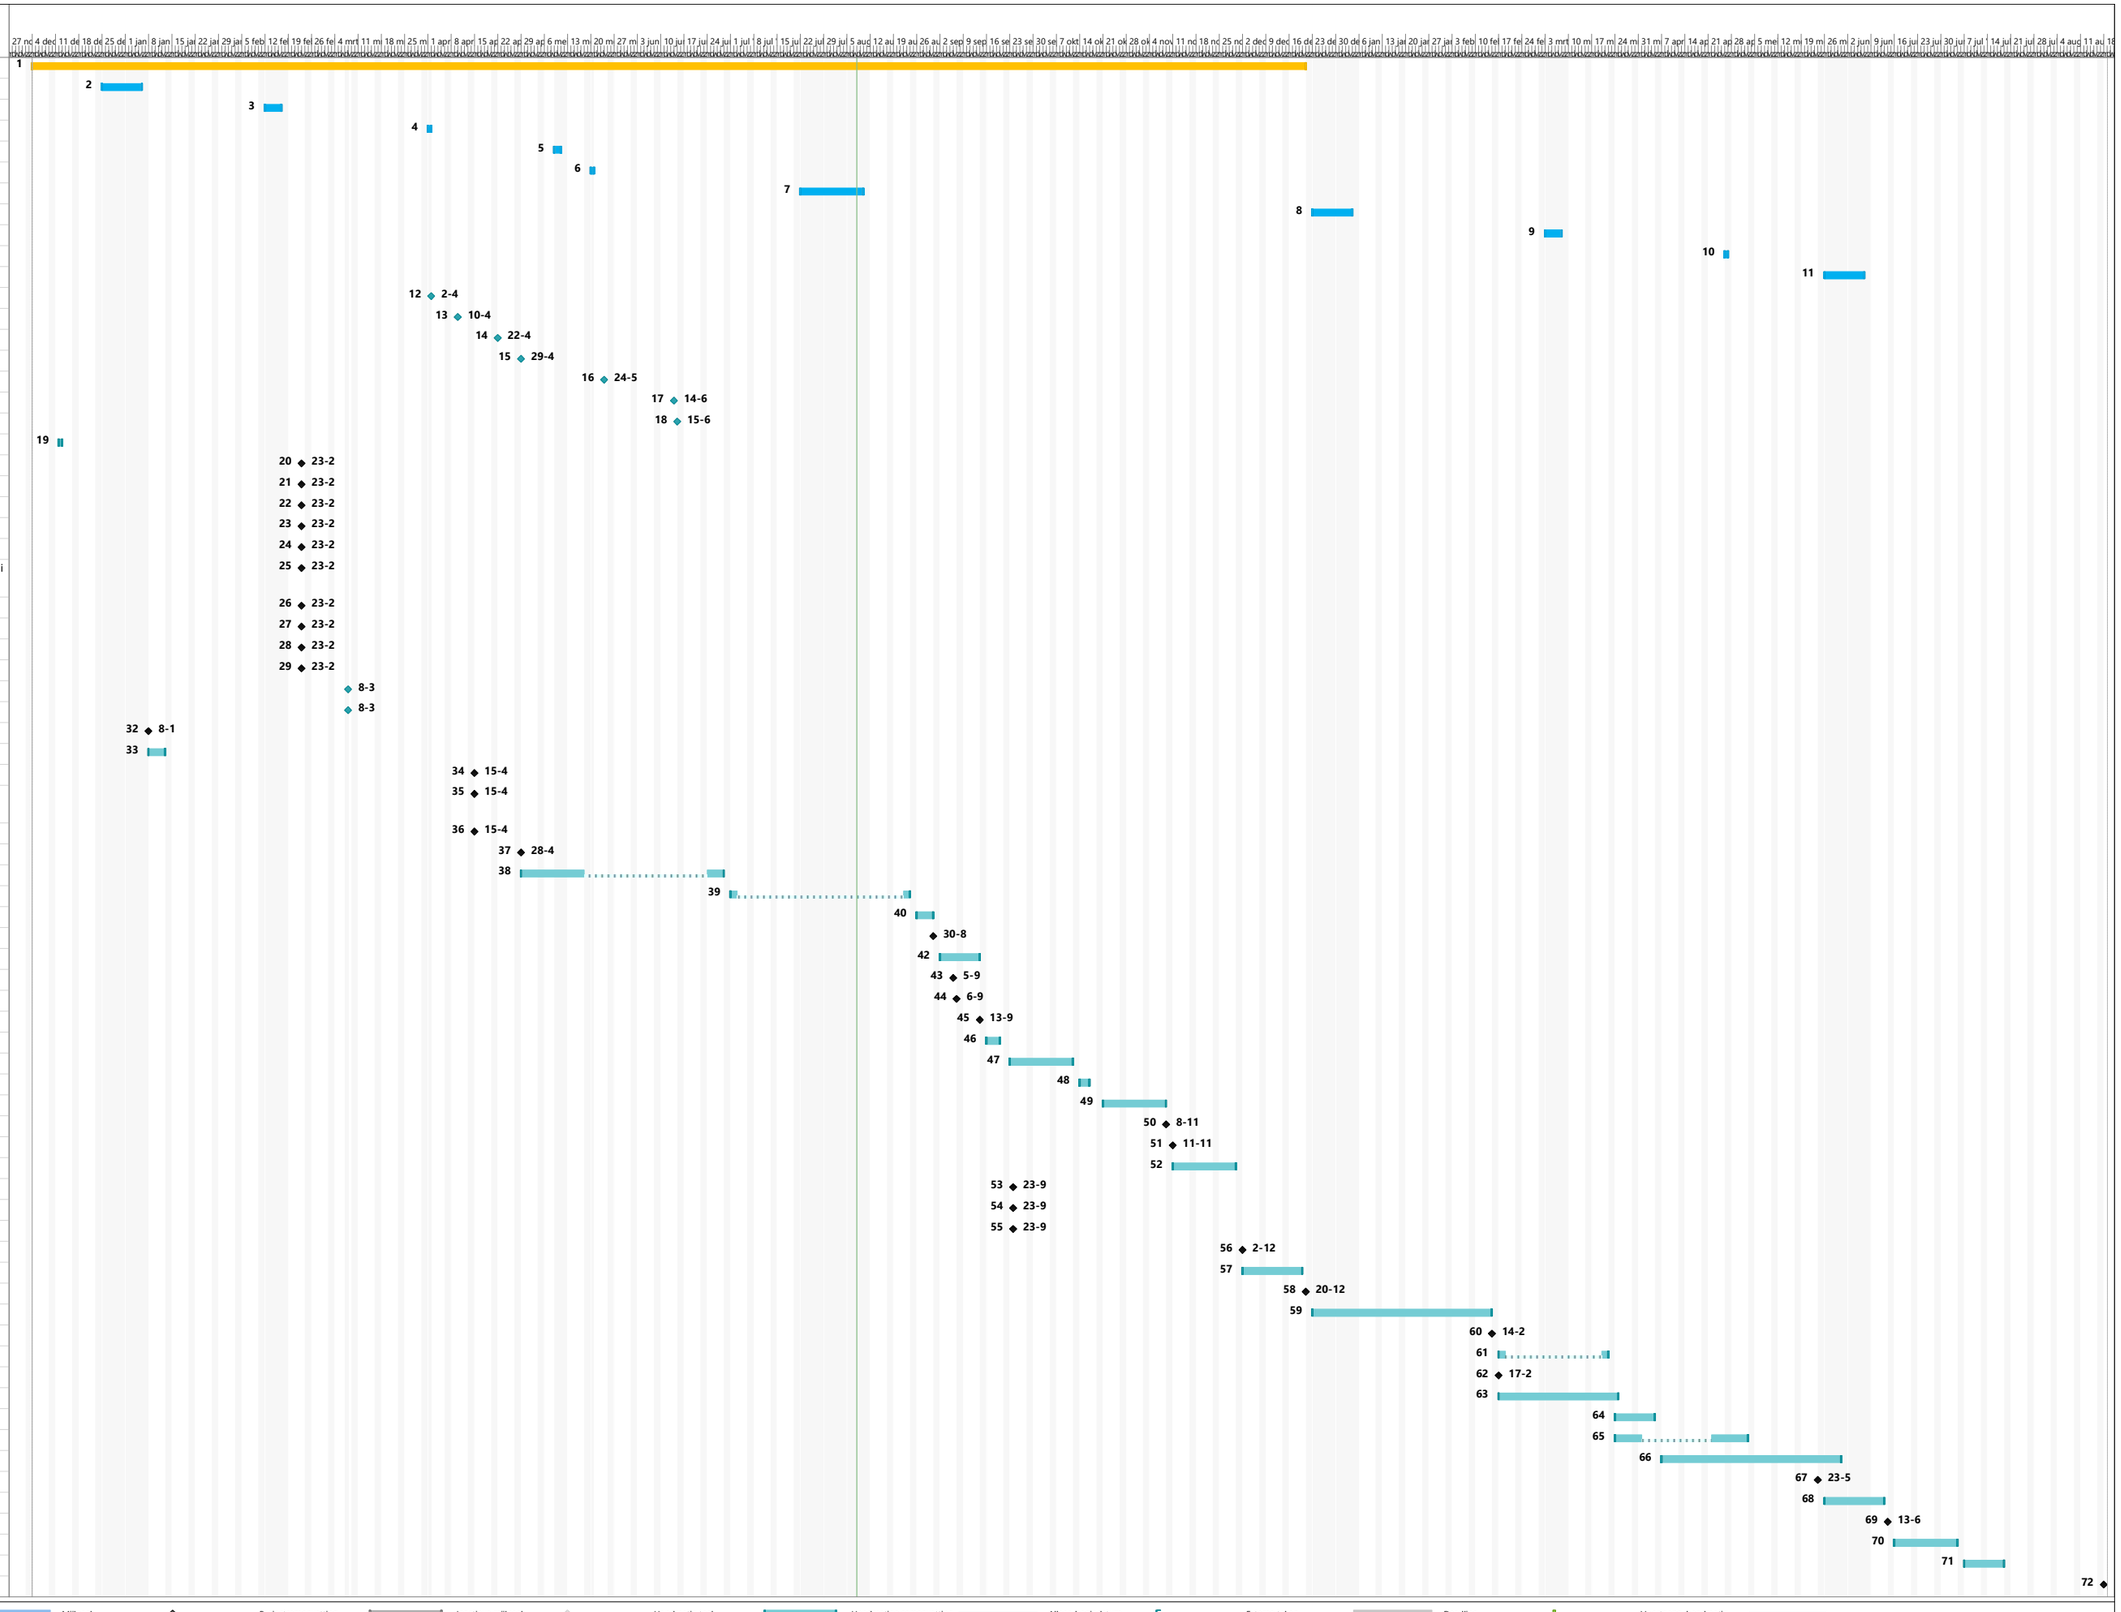

Project: 20240808 voorlopige p
Datum: don 8-8-24

Taak, Splitsing, Mijlpaal, Samenvatting, Projectsamenvatting, Inactieve taken, Inactieve mijlpaal, Inactieve samenvatting, Handmatig taak, Alleen duur, Handmatige samenvatting, Handmatige samenvatting, Alleen begindatum, Alleen einddatum, Externe taken, Externe mijlpaal, Deadline, Voortgang, Voortgang, handmatig
