Klantrapportage productie 2021
Gemeente Beuningen

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

0 Inleiding regionaal

In deze derde klantrapportage informeren wij u over de werkzaamheden die we in 2021 voor u hebben uitgevoerd. Zoals gebruikelijk ligt het accent op aantallen; uren, producten en kosten.

Verantwoording afleggen
De klantrapportage verbindt de realisatie met het werkplan. Gedurende het jaar bespreken we met u de tussenstand. Dit doen we in de maandelijkse accountgesprekken en daarnaast ontvangt u drie keer per jaar deze klantrapportage. Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we tijdig bijsturen.

In de bestuursrapportages die we driemaal per jaar opleveren, leggen we integraal verantwoording af over de begroting en realisatie daarvan. Hierin gaan wij steeds meer het accent leggen op de inhoudelijke verantwoording.

Woelig najaar
De tweede klantrapportage gaf al aan: bijsturen na de zomer is meestal niet meer zo makkelijk. Dat was overigens ook voor de meeste van onze opdrachtgevers gelukkig niet noodzakelijk, omdat we voor die opdrachtgevers op koers lagen. Maar dit najaar was alles anders.

Om te beginnen was de seizoensproductiviteit in augustus en september lager dan begroot. Dit onder andere door het inhalen van achterstallig verlof. Die dip hebben we gelukkig in november en december ruimschoots ingehaald. Maar de grote en noodzakelijke aandacht voor het Nijmeegse luchtkwaliteitsdossier en het Goffert stadion zorgden voor een verschuiving van inzet bij andere opdrachtgevers. In onze maandelijkse voortgangsgesprekken hebben we de effecten hiervan steeds goed kunnen bespreken.

Ook leidde een volgende virusmutant tot meer zieken. Ons ziekteverzuimpercentage zal in 2021 de norm van 5% dan ook sterk overschrijden. En tot slot – de arbeidsmarkt. Sommige afdelingen zijn onevenredig zwaar belast geweest door zowel ziekte als het niet kunnen vervullen van vacatures. Ons initiatief om een tijdelijke, snelle ‘binnenbocht’ te creëren bij vergunningaanvragen voor bouwen als ook het vinden van creatieve oplossingen bij andere afdelingen die onder druk stonden, is door de opdrachtgevers van harte ondersteund. Dat heeft geholpen om de grote werkvoorraad te laten slinken.

Realisatie werkplan
Al met al hebben we, in kosten uitgedrukt, ons werk toch bijna geheel kunnen realiseren. Op de reguliere werkzaamheden hebben we 4% meer gerealiseerd en op projecten 18% minder. Aan de BRIKS (bouw) kant hebben we vooral heel veel werk verzet op het gebied van vergunningverlening. Dit hing samen met het, nog steeds, verhoogde aantal kleinere aanvragen. Bij toezicht en handhaving was dat substantieel minder. Dat kwam door onze beperkingen in beschikbare capaciteit.
Bij milieu hebben we op alle terreinen meer werk verzet dan vooraf was voorzien; en in percentages uitgedrukt vooral bij juridisch advies en handhaving.

Het blijkt eens te meer dat de inzet op projecten het meest ‘wispelturig’ is. Soms komt dat door beleidswijzigingen, soms gaan evenementen niet door en soms kiezen we er samen met opdrachtgevers voor om de beperkte beschikbare capaciteit liever te gebruiken voor activiteiten met een hogere prioriteit. Dit alles maakt van 2021 een turbulent jaar waarin we met elkaar hard hebben

gewerkt de doelen van het werkplan te realiseren. Echter heeft het niet kunnen voorkomen dat we soms, samen met u, lastige keuzes hebben moeten maken. Streven is altijd om de dienstverlening op peil te houden.

Grote, aandachtvragende zaken zijn geweest:

- de snelle realisatie van Heumensoord,
- de bijna geruisloze sloop van Engie fase 1,
- uiteraard de luchtkwaliteit Nijmegen-West,
- de inmiddels sterk verbeterde brandveiligheid van het Radboud UMC,
- de zorgen om de vluchtmogelijkheden in de Refter,
- het instorten van de tribune van het Goffert stadion,
- en alle projecten binnen het provinciale samenwerkingsproject Samen Sterk, dat langzamerhand kennis en methodes oplevert die ons binnen het gehele werkgebied van de ODRN meerwaarde op gaat leveren.

Naar een verbeterde rapportage

De afgelopen jaren is er veel veranderd in onze rapportage. In het opleveren van de klantrapportage is routine gekomen en in de werkwijze die eraan ten grondslag ligt ook. Wij houden samen met u steeds de vinger aan de pols. Onze verbeterde informatiesystemen helpen daar uitstekend bij. Komend jaar gaat er veel veranderen; bestuurlijk, organisatorisch en ook qua focus. Een verscherpte focus voor de maatschappelijke meerwaarde van ons werk. Een nog verder uitgekristalliseerd sturingsinstrumentarium gaat daar optimaal aan bijdragen. Daarnaast komen we hiermee tot een veel betere bekostigingsmethodiek. Dit geeft energie voor de toekomst die we graag samen met u in gaan!

Marieke Prins,
Directeur ODRN

1 Werkzaamheden voor de gemeente Beuningen in 2021

Tabel 1 Totaaloverzicht in €

Totaal	Primitieve begroting	Aanvullend	Exploitatie werkplan	Realisatie 2021	maart %	juli %	2021%
Totaal	**€ 1.423.900**	**€ 84.861**	**€ 1.508.761**	**€ 1.501.046**	**26%**	**59%**	**99%**
Totaal BRIKS	€ 845.873	€ -	€ 845.873	€ 812.375	24%	54%	96%
Totaal MILIEU	€ 481.209	€ -	€ 481.209	€ 495.875	27%	62%	103%
Projecten	€ 96.819	€ 84.861	€ 181.680	€ 192.637	34%	83%	106%
Correctie				*€ 159*			
Diverse projecten/niet VTH	*€ 41.376*	*€ 11.340*	*€ 52.716*	*€ 22.419*	*11%*	*23%*	*43%*

Tabel 2 Voortgang reguliere werkzaamheden in €

Regulier in €	Primitieve begroting	Aanvullend	Exploitatie werkplan	Realisatie 2021	maart %	juli %	2021%
Totaal	**€ 1.327.081**	**€ -**	**€ 1.327.081**	**€ 1.308.250**	**25%**	**57%**	**99%**
Behandelen Vergunning	€ 502.901	€ -	€ 502.901	€ 520.106	26%	59%	103%
BRIKS	€ 350.797	€ -	€ 350.797	€ 374.091	23%	55%	107%
MILIEU	€ 152.104	€ -	€ 152.104	€ 146.015	34%	67%	96%
Uitvoeren toezicht	€ 516.644	€ -	€ 516.644	€ 514.855	25%	54%	100%
BRIKS	€ 257.115	€ -	€ 257.115	€ 250.835	27%	54%	98%
MILIEU	€ 259.530	€ -	€ 259.530	€ 264.020	22%	54%	102%
Handhaven	€ 24.656	€ -	€ 24.656	€ 12.871	3%	32%	52%
BRIKS	€ 13.115	€ -	€ 13.115	€ 9.181	1%	32%	70%
MILIEU	€ 11.540	€ -	€ 11.540	€ 3.691	6%	32%	32%
Advisering	€ 189.570	€ -	€ 189.570	€ 189.858	25%	60%	100%
BRIKS	€ 145.021	€ -	€ 145.021	€ 113.204	21%	45%	78%
MILIEU	€ 44.549	€ -	€ 44.549	€ 76.655	37%	106%	172%
Juridisch	€ 93.310	€ -	€ 93.310	€ 70.559	26%	64%	76%
BRIKS	€ 79.824	€ -	€ 79.824	€ 65.064	28%	68%	82%
MILIEU	€ 13.486	€ -	€ 13.486	€ 5.495	11%	39%	41%

Tabel 3 Onderhanden werk

Onderhanden werk	Omvang 1 januari 2021	Omvang 1 april 2021	Omvang 1 juli 2021	Omvang 1 januari 2022	Toe-/afname	Nog te realiseren
Totaal	**€ 216.330**	**€ 273.889**	**€ 300.574**	**€ 157.790**	**€ -58.540**	**€ 187.789**
Behandelen Vergunning	€ 60.454	€ 99.523	€ 110.264	€ 84.518	€ 24.064	€ 100.561
Uitvoeren toezicht	€ 155.875	€ 174.366	€ 190.310	€ 73.271	€ -82.604	€ 87.228
Handhaven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Advisering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Tabel 4 Voortgang reguliere werkzaamheden in aantallen (vaste producten)

Regulier in vaste producten	Primitieve begroting	Aanvullend	Exploitatie werkplan	Realisatie 2021	maart %	juli %	2021%
Totaal	**1.113 st.**	**0 st.**	**1.113 st.**	**1.227 st.**	**26%**	**58%**	**110%**
Behandelen Vergunning	579 st.	0 st.	579 st.	609 st.	23%	59%	105%
BRIKS	495 st.	0 st.	495 st.	538 st.	23%	59%	109%
MILIEU	84 st.	0 st.	84 st.	71 st.	20%	55%	85%
Uitvoeren toezicht	531 st.	0 st.	531 st.	616 st.	28%	57%	116%
BRIKS	247 st.	0 st.	247 st.	182 st.	20%	38%	74%
MILIEU	284 st.	0 st.	284 st.	434 st.	36%	74%	153%
Handhaven	1 st.	0 st.	1 st.	0 st.	0%	0%	0%
BRIKS	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	0%	0%	0%
MILIEU	1 st.	0 st.	1 st.	0 st.	0%	0%	0%
Advisering	2 st.	0 st.	2 st.	2 st.	50%	100%	100%
BRIKS	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	0%	0%	0%
MILIEU	2 st.	0 st.	2 st.	2 st.	50%	100%	100%
Juridisch	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	0%	0%	0%
BRIKS	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	0%	0%	0%
MILIEU	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	0%	0%	0%

Tabel 5 Voortgang reguliere werkzaamheden in aantallen (nacalculatie producten)

Regulier in uren nacalculatie	Primitieve begroting	Aanvullend	Exploitatie werkplan	Realisatie 2021	maart %	juli %	2021%
Totaal	**4.352 u.**	**0 u.**	**4.352 u.**	**4.270 u.**	**30%**	**66%**	**98%**
Behandelen Vergunning	578 u.	0 u.	578 u.	687 u.	54%	89%	119%
BRIKS	0 u.	0 u.	0 u.	7 u.	0%	0%	0%
MILIEU	578 u.	0 u.	578 u.	680 u.	54%	89%	118%
Uitvoeren toezicht	768 u.	0 u.	768 u.	1.024 u.	38%	88%	133%
BRIKS	568 u.	0 u.	568 u.	679 u.	36%	83%	120%
MILIEU	201 u.	0 u.	201 u.	345 u.	44%	101%	172%
Handhaven	247 u.	0 u.	247 u.	133 u.	3%	33%	54%
BRIKS	132 u.	0 u.	132 u.	95 u.	1%	32%	72%
MILIEU	115 u.	0 u.	115 u.	39 u.	7%	33%	33%
Advisering	1.935 u.	0 u.	1.935 u.	1.761 u.	24%	53%	91%
BRIKS	1.584 u.	0 u.	1.584 u.	1.248 u.	21%	45%	79%
MILIEU	351 u.	0 u.	351 u.	513 u.	37%	86%	146%
Juridisch	824 u.	0 u.	824 u.	665 u.	27%	68%	81%
BRIKS	701 u.	0 u.	701 u.	609 u.	30%	72%	87%
MILIEU	123 u.	0 u.	123 u.	56 u.	11%	44%	46%

2 Toelichting op de realisatie van Beuningen

Vergunningverlening BRIKS

We hebben een beperkt aantal vooroverleggen afgehandeld. Alle vooroverleggen die in behandeling zijn genomen zijn uitgevoerd conform de afspraken met de gemeente Beuningen. In totaal zijn dat er 5 geweest, wat minder is dan was geraamd.

Het aantal aanvragen omgevingsvergunning bouw blijft groot. Dit is nog steeds een gevolg van Covid-19. Bij Beuningen is dit vooral terug te zien in de aantallen kleine bouwplannen. We zien minder middelgrote bouwplannen. Wel zijn er veel grote bouwplannen afgehandeld (6 gerealiseerd waar er 3 geraamd waren). Het gaat om de volgende bouwplannen;

- plannen van 20 woningen, 22 woningen, en 23 woningen, alle in Hof Van Campen te Ewijk,
- nieuwbouw van een distributiecentrum 4SO Outdoor in Beuningen,
- uitbreiding van een bedrijf aan de IJzerwerf in Beuningen
- en de realisatie van een zandwinningsinstallaties bij Geertjesgolf in Winssen.

In zijn geheel genomen ligt de realisatie van de omgevingsvergunningen bouw voor op schema met een realisatie van 118%. Het aantal afwijkingen bestemmingsplan is aan de hoge kant; wellicht dat herziening van de bestemmingsplannen leidt tot minder afwijkingen. De werkdruk is tijdens de Covid-19 pandemie ongekend hoog. Dit heeft tot gevolg gehad dat er 14 van rechtswege verleende vergunningen zijn geregistreerd.

Vergunningverlening Milieu

De totale realisatie is 96%. Het vooroverleg milieu kent echter een beperktere omzetrealisatie van 21%. De werkzaamheden die zijn uitgevoerd hebben betrekking op;

- Kipster Beuningen B.V.
- en Frigolanda Warehousing te Beuningen.

Over de totale breedte van de vergunningverleningsprocedures is de omzetrealisatie op het product Aanvraag om veranderingsvergunning niet-complex beperkt gebleven (45%). Inzet heeft plaatsgevonden bij zandwinning Geertjesgolf en Peer-Dorussen VOF. Daarnaast heeft er ook realisatie plaatsgevonden op het product Oprichtingsvergunning terwijl hiervoor niets was begroot. Het ging hierbij om aanvragen voor een oprichtingsvergunning van Henri van der Bilt, Willems Winssen en Eneco Wind.

Het product Meldingen besluit bodemkwaliteit - grondbank Beuningen bleek achteraf onvoldoende begroot. De totale realisatie betrof namelijk 378%. En ook het product Maatwerk Activiteitenbesluit type B kent een omzetrealisatie van 133%. Het betreft hier;

- PreZero Papier en Kunststof Recycling-Metaalweg 1 te Weurt,
- 4SO-Outdoor,
- Bronswerf 4 te Beuningen,
- het Sushi Paleis,
- Thorbeckeplein 46 te Beuningen
- en Heldens Tartaar en Filets, Zilverwerf 9 te Beuningen.

Toezicht BRIKS

De realisatie is met een realisatie van 98% nagenoeg volgens begroting. We zien een afname in kleine bouwwerken en toename in grote bouwwerken. Dit is grotendeels te danken aan de implementatie van het VTH-beleid.

We hebben een grotere omzet gerealiseerd op nacalculatie producten. Dit gaat met name over toezicht bestaande bouw, illegaliteit bouwen, monumenten en sloop, klachten en handhavingsverzoeken.

De realisatie van het product Sloopmeldingen behandelen is nagenoeg volgens begroting, namelijk 109%. Het toezicht hierop loopt echter nog steeds achter. We hebben 30 zaken gerealiseerd terwijl we 39 zaken hadden begroot. Dit heeft ook te maken met het risicogericht werken en de beperkte inzet van toezichtcapaciteit i.v.m. ziekte van een collega. Daarbij zijn door het VTH-beleid veel meer zaken administratief afgehandeld in plaats van door een fysieke controle. Er zijn 12 zaken gerealiseerd tegen 4 zaken begroot.

Toezicht Milieu

De realisatie vanuit toezicht milieu is in 2021 volgens planning verlopen. De realisatie ligt in totaal op 102%. Het ziekteverzuim binnen de afdeling lag in 2021 boven de 5%. Dit ging met name om ervaren toezichthouders die worden ingezet bij de Brzo- en complexe gemeentelijke inrichtingen. Ook door de problematiek rondom de asfaltcentrale in Nijmegen was extra inzet nodig van deze groep toezichthouders, maar desondanks zijn de toezicht controles voor Beuningen zo goed als mogelijk uitgevoerd. Daarnaast hebben we ten opzichte van de planning meer tijd nodig gehad voor de afhandeling van klachten en ongewone voorvallen. Dit wordt met name veroorzaakt door extra klachten over de zandwinning Beuningse plas en de ongewone voorvallen bij het bedrijf Henri van de Bilt. Dit is ten koste gegaan van het aantal uitgevoerde milieucontroles. Bij de bepaling welke controles niet konden worden uitgevoerd is ten alle tijden gekeken naar de meest recent uitgevoerde controles en de bedrijven die in het verleden een goed naleefgedrag toonde en het minste risico kennen.

Advisering

De uren voor specialistisch advies bij vergunningverlening BRIKS liggen op schema. Wel zien we dat de uren voor opzoeken, anonimiseren en verzenden van archiefstukken niet in het werkplan waren opgenomen terwijl daar wel realisatie op heeft plaatsgevonden. Ook in 2022 zullen we hier werkzaamheden voor moeten uitvoeren. Er wordt nog gekeken hoe we in het vervolg met deze werkzaamheden omgaan.

Realisatie specialistisch advies vergunningverlening milieu (153%) kent een hogere omzetrealisatie. Dit wordt met name veroorzaakt door Advies RO (263%) en Algemene vragen Milieu (234%). Deze trend is in maart 2021 al gesignaleerd en heeft zich doorgezet. Advies RO betreft 20 verschillende zaken.

De realisatie van specialistisch advies is hoger dan begroot (124%). Bij de opdrachtgever is bekend dat de aanwezige toezichthouders van de ODRN veelal als vraagbaak optreden voor andere gemeentelijke disciplines, o.a. BAG-werkzaamheden. Daarnaast constateren we een toename van het aantal vragen en klachten in relatie tot Geertjesgolf in Winssen. Dit blijft constante aandacht van de ODRN vragen.

De adviestaken voor milieutoezicht gaan over een deel van ons takenpakket. Het zwaartepunt van deze werkzaamheden ligt bij de beoordeling van de EPRTR-rapportage. Over de uitvoering van deze taken zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Juridisch en Handhaving

Realisatie BRIKS en Milieu is samen 76%. De balie is een tijd door de Covid-19-maatregelen niet fysiek bemenst geweest. Men kon er alleen digitaal (telefonisch en/of via mail) terecht. De balie is recent weer opengegaan. Verder zijn er ook werkzaamheden verricht voor Beuningse plas en de daaraan gerelateerde klachten. Dit heeft echter niet geresulteerd in meer juridische werkzaamheden.

De begroting is gebaseerd op een stijgende lijn vanaf 2018. We zien dat de stijging zich heeft doorgezet naar 2021, maar minder dan verwacht. Rechtsbescherming BRIKS is gebleven op het niveau van 2020 en bij HH BRIKS hebben we minder hoge uitschieters (bewerkelijke zaken) gehad dan vorig jaar. Vanaf juli, en met name vanaf sept 2021, heeft het personeelstekort bij Beuningen zijn weerslag gehad op onze BRIKS-zaken. Hier vragen we aandacht voor.

Projecten

Tabel 6 Projecten

Omschrijving	*Primitieve begroting*	*Aanvullend*	*Exploitatie werkplan*	*Realisatie 2021*	*in %*
	€ 96.819	**€ 84.861**	**€ 181.680**	**€ 192.637**	**106%**
EML Cofinanciering (energiecontroles)	€ 29.336	€ -	€ 29.336	€ 14.612	50%
Aan de uitvoering van de werkzaamheden binnen dit project is externe financiering verbonden (subsidie). De geplande controles zijn volgens planning uitgevoerd, terwijl hier minder capaciteit voor nodig is geweest.					
Ketentoezicht	€ 2.991	€ -	€ 2.991	€ 2.519	84%
Ketentoezicht richt zich op het terugdringen van milieucriminaliteit. In de praktijk blijkt dat de grootste risico's liggen bij het handelen in en verwerken van afval. Jaarlijks worden vanuit het stelsel een aantal thema's geselecteerd waaraan extra toezicht wordt uitgevoerd. Dit project is volgens planning verlopen.					
IGP: bijzonder handhaving en ondermijning	€ 24.503	€ -	€ 24.503	€ 8.479	35%
Aan dit project is minder uitvoering gegeven. Het initiatief voor de uitvoering ligt bij de opdrachtgever.					
Actualiseren inrichtingbestand - flitscontroles	€ 6.420	€ -	€ 6.420	€ -	0%
Zie uitleg bij het IGP project.					
Gelderse milieusamenwerking	€ 8.025	€ -	€ 8.025	€ 18.354	229%
Het doel van branchegericht werken is om effectiever, efficiënter en meer risicogericht te controleren. Onder andere de vervangende branches/Activiteiten zijn binnen het kader van dit project verricht. Aan dit project is meer tijd besteed dan gepland. Het afgelopen jaar zijn relatief veel nieuwe projecten opgestart.					
Versterkte uitvoering energietoezicht	€ 2.144	€ -	€ 2.144	€ 2.239	104%
Budget vanuit het Ministerie EZK als extra ondersteuning voor de uitvoering van onze energietaken. Dit project is volgens planning verlopen.					
Zonneparken Kommengebied Beuningen	€ 2.500	€ -	€ 2.500	€ 2.014	81%
De definitieve besluiten zijn genomen en tot op heden zijn er geen vragen bekend. Het budget was ruim toereikend.					
Windpark Beuningen	€ 2.500	€ -	€ 2.500	€ 1.325	53%
Het project betreft het bouwen en in werking hebben van een 5-tal windturbines van Eneco Wind B.V. Er zijn 3 gecoördineerde besluiten geweest die een relatie hadden met de omgevingsvergunning, natuurbeschermingswet en het bestemmingsplan. Er zijn zienswijzen ontvangen waarvoor een zienswijzennotitie is opgesteld. De definitieve besluiten zijn verzonden.					

Project Bunswaard	€ 16.900	€ -	€ 16.900	€ 56.179	332%
De realisatie is hoger dan begroot. De opdrachtgever is hiervan op de hoogte en is tussentijds hierover geïnformeerd. De werkzaamheden zijn onder leiding van de gemeente uitgevoerd.					
Post divers	€ 1.500	€ -	€ 1.500	€ 2.055	137%
Het gaat om werkzaamheden zoals het bijwonen van overleggen (grondoverleggen, regionale overleggen, etc.) Voor 2022 is het budget opgehoogd naar 2000€.					
OHW afsluiten VTH beleid oude methode en verrekenen T34 en T36	€ -	€ 84.861	€ 84.861	€ 84.861	100%
Het gaat om het overzetten van de producten T34 en T36 van vast naar nacalculatie. Daarbij is het OHW afgesloten en wordt in rekening gebracht. Dit wordt echter weer in mindering gebracht en gecompenseerd met het OHW.					

Tabel 7 Diverse Projecten/Niet VTH

Omschrijving	*Primitieve begroting*	*Aanvullend*	*Exploitatie werkplan*	*Realisatie 2021*	*in %*
	€ 41.376	**€ 11.340**	**€ 52.716**	**€ 22.419**	**43%**
Programma externe veiligheid (IOV4)	€ 4.690	€ -	€ 4.690	€ 3.689	79%
Dit budget is beschikbaar gesteld door de gemeenten om het lokale externe veiligheidsbeleid uit te voeren. Hiervoor zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd voor kennisontwikkeling en advisering m.b.t. ruimtelijke ordening en EV.					
Afhandeling oude Squit zaken Beuningen	€ 7.500	€ -	€ 7.500	€ 3.443	46%
In 2021 is het grootste gedeelte van de dossiers behandeld en indien mogelijk afgerond. Het budget is niet volledig nodig geweest. De verwachting is dat in 2022 het aantal zaken vrijwel allemaal afgesloten kunnen worden. Vraag aan accountmanager is of het restant van het budget in 2022 ingezet mag worden.					
Festival Down the Rabbit Hole	€ 8.000	€ -	€ 8.000	€ 1.961	25%
Het evenement zou plaatsvinden juli, maar het is verplaatst in tijdstip en locatie. Het zal dit jaar niet in gemeente Beuningen worden gehouden. Er is uitgebreid overleg geweest over geluidhinder. Dit heeft geleid tot een overeenstemming over de geluidsmaatregelen, waarmee in principe vergunning verleend kan worden, maar waarbij met name in de nachtperiode juridische risico's blijven bestaan. De voorbereiding van het evenement loopt voor 2022 en verder door. Er komt een door te belasten rekening van gemeente 's Hertogenbosch voor advieswerk evenementenvergunning voor Beuningen, wat in de opdracht aan de ODRN zit.					
Advisering monumentsubsidies	€ 12.840	€ -	€ 12.840	€ 2.643	21%
De gemeente Beuningen heeft een subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. De ODRN adviseert over de aanvragen. Het betreft een doorlopend project. De vraag is beperkt, waardoor het budget ruim toereikend is.					
Uitvoeren zonebeheer geluid bedrijventerrein Schoenaker	€ 8.346	€ -	€ 8.346	€ 2.438	29%
Noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd.					
Doorrekening effect Wkb	€ -	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	100%
Werkzaamheden zijn in 2021 conform afspraken uitgevoerd.					
Externe Veiligheid / Omgevingsveiligheid	€ -	€ 5.500	€ 5.500	€ 2.405	44%
Twee van de drie geplande bespreeksessies zijn inmiddels uitgevoerd. De laatste sessie volgt in 2022.					
SGS Search Beuningen	€ -	€ 250	€ 250	€ 250	100%
Het gaat om materiaalmonsters die genomen zijn aan de Dijk 10T en de Montgomerystraat.					
Zandwinning Beuningse Plas	€ -	€ 1.840	€ 1.840	€ 1.840	100%
Door omwonenden wordt trillinghinder ervaren. Hiervoor loopt een onderzoek. Dit project is nog in behandeling.					

3 Actie- en bespreekpunten

Wat zijn volgens ons de aandachtspunten en bespreekpunten met de gemeente Beuningen op basis van de realisatie over geheel 2021?

Aandachtspunten

- Verwacht wordt dat Covid-19 en de effecten hiervan, zoals het veelvuldiger thuis werken van burgers, ook gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de ODRN in 2022. Het aantal vergunningaanvragen, het aantal klachten en de constateringen van illegaliteit zullen, zeer waarschijnlijk, hoog blijven. Voor zover mogelijk is dit verwerkt in de advieslijst 2022. Deze zal binnenkort opgeleverd worden. Ontwikkelingen op dit onderdeel volgen wij gedurende het jaar.

- In het algemeen merken wij op dat een verhoogde aandacht voor een bepaald gebied en/of bepaald bedrijf(sterrein) ervoor zorgt dat er een verhoogde inzet van de ODRN plaats vindt. Die verhoogde inzet kan dan op diverse vakgebieden nodig zijn zoals bijvoorbeeld:
  - toezicht;
  - juridisch (lasten, handhavingsverzoeken, WOB-verzoeken etc.).

  De hogere inzet op deze terreinen gaat dan, indien dit niet voorzien en/of afgesproken is, ten koste van onze reguliere inzet.


- Covid-19 heeft ook bij de ODRN geleid tot meer zieken. Daarnaast maakt de huidige krapte op de arbeidsmarkt het moeilijk om vacatures op te vullen. Op sommige afdelingen zorgt dit voor capaciteitsproblemen. Ook voor 2022 is dit een aandachtspunt.

- In 2021 is in het Partneroverleg afgesproken dat, als pilot, de opdrachtgevers maandelijks een overzicht van de voortgang per mail ontvangen (Marap). Het overzicht sluit aan op de afspraken die gemaakt zijn in het werkplan 2021 en laat de productie over een periode zien voor de reguliere werkzaamheden en de projecten. Wij vernemen graag van u of u deze maandelijkse overzichten ook in 2022 wilt blijven ontvangen.

4 Kwaliteitsindicatoren


In 2021 is het traject gestart om te komen tot nieuwe/aanvullende kwaliteitsindicatoren. Op dit moment wordt onderzocht binnen de ODRN of we beschikbare data kunnen koppelen aan de opgestelde kwaliteitsindicatoren. Het traject dat voorzien wordt is om in maart 2022 duidelijk te hebben welke kwaliteitsindicatoren op korte termijn al kunnen worden opgeleverd en welke wat meer tijd kosten. De ODRN had gehoopt de eerste resultaten in deze rapportage te kunnen presenteren, maar vanwege uitval en de hoge werkdruk op andere zaken zijn de prioriteiten verschoven. Het traject wordt nu weer verder opgepakt en zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn worden deze met de opdrachtgevers gedeeld.

5 Werkzaamheden voor de deelnemers in 2021

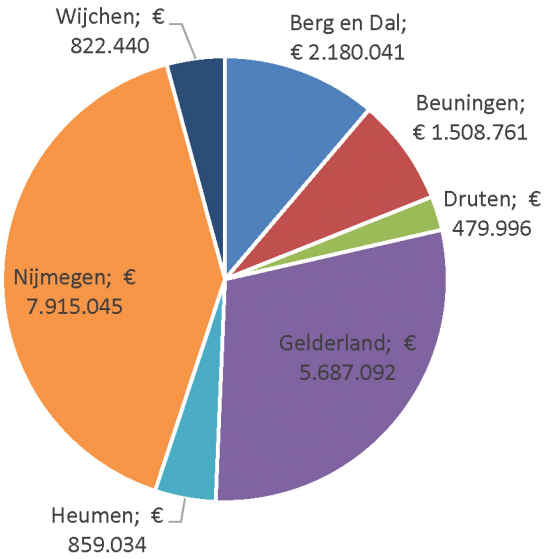

Figuur 1 werkplan 2021 per gemeente/ provincie

Werkplan 2021 gemeenten en provincie (incl. bijstellingen): € 19.452.409
Werkplan 2021 totaal (incl. alle andere opdrachtgevers): € 24.049.811

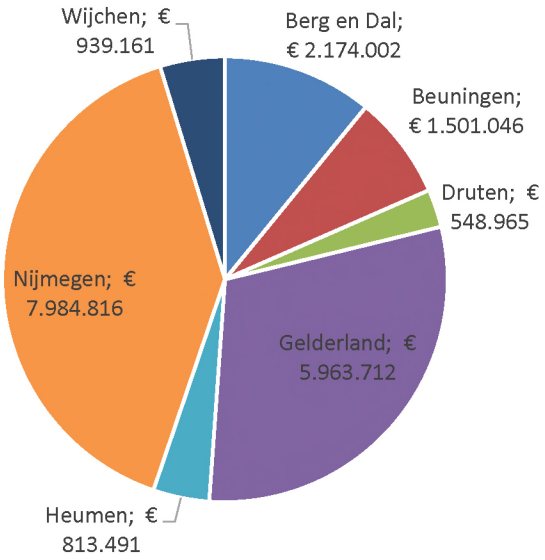

Figuur 2 realisatie 2021 per gemeente / provincie

Realisatie 2021 gemeenten en provincie: € 19.925.193
Realisatie 2021 (incl. alle andere opdrachtgevers): € 23.321.520
