



RWS INFORMATIE

Gemeente Krimpenerwaard
t.a.v. Gemeenteraad Krimpenerwaard
Postbus 51
2820 AB Stolwijk

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Afdeling Samenwerking
Landelijke Uitvoering Zuid

Laan op Zuid 45
3072 DB Rotterdam
(Wilhelminahof)
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon


Omgevingsmanager

Kenmerk:
RWS-2026/7998

Datum
26 maart 2026

Bijlage(n)
1

memo

Optimalisatie afsluiting Algerabrug
Groot Onderhoud zomer 2026

Geachte leden van de gemeenteraad,

Rijkswaterstaat heeft de planning voor het noodzakelijke groot onderhoud aan de Algerabrug geoptimaliseerd. In deze memo informeren wij u over de aangepaste fasering, de gevolgen voor het verkeer en een aantal belangrijke maatregelen die worden getroffen om de regio bereikbaar te houden. In de bijlage vindt u het persbericht dat op vrijdag 27 maart wordt gepubliceerd.

Aanleiding

Zoals u weet, voert Rijkswaterstaat dringend en noodzakelijk groot onderhoud uit aan de brugklep van de Algerabrug in de zomer van 2026. Ook asfalteren we het vaste brugdeel opnieuw, vernieuwen we voegovergangen en onderhouden we de staalconstructie. Zo houden we de brug veilig en beschikbaar. Met dit onderhoud zorgen we dat de Algerabrug de komende jaren veilig en betrouwbaar blijft, zodat onverwachte afsluitingen worden voorkomen.

We begrijpen dat deze afsluiting impact heeft op alle mensen die gebruik maken van de brug. Daarom heeft Rijkswaterstaat er samen met aannemer Savera Over-Bruggen alles aan gedaan om de volledige afsluiting zo kort mogelijk te maken en de hinder te concentreren in de verkeersluwe zomerperiode. De aangepaste planning is op 26 maart toegelicht in het bestuurlijk overleg.

Geoptimaliseerde planning

De belangrijkste optimalisaties zijn:

- De volledige wegafsluiting gaat van 6 naar 4 weken.
- De stremming van de sluisolk gaat van 12 naar 11 weken

Om dit mogelijk te maken, start Savera Over-Bruggen eerder met de werkzaamheden, werkt met meerdere dagploegen tegelijk en deels in de avond. Er wordt in basis gewerkt met een lange shift in tegenstelling tot meerdere shifts om kwaliteits- en efficiëntieverlies bij overdracht naar de volgende shift te voorkomen. De weekenden dienen als buffer en worden gebruikt voor diverse werkzaamheden, zoals asfalt-, belijnings- en hijswerkzaamheden.

Hieronder volgt een chronologische beschrijving van de werkzaamheden met impact voor verkeer (zie ook bijlage A).

Datum
26 maart 2026

1. Voorafgaande nachtelijke werkzaamheden (april – mei – juni/juli)

Ter voorbereiding op de zomerwerkzaamheden vinden er diverse nachtelijke werkzaamheden plaats:

- Nacht 13 op 14 april: brugopeningen t.b.v. onderzoek regelballastruimtes. Verkeer wordt tussen 01-05 uur in beide richtingen tijdelijk stilgezet.
- Nacht 18 op 19 mei: brugopeningen t.b.v. balans- en oplegdrukmetingen. Verkeer wordt tussen 01-05 uur in beide richtingen tijdelijk stilgezet.
- Nachten eind juni/begin juli: Brug in geopende toestand t.b.v. diverse werkzaamheden. Verkeer wordt tussen 22-05 uur omgeleid.

Bij spoedritten van hulpdiensten worden de werkzaamheden onderbroken, zodat hulpdiensten de brug kunnen passeren.

2. Vervroegde stremming sluiskolk (13 juli - 28 september)

De stremming van de sluiskolk voor scheepvaart start twee weken eerder en eindigt drie weken eerder dan oorspronkelijk gepland. Nieuwe periode: 13 juli t/m 27 september (11 weken). In de eerste weken wordt het werkbord opgebouwd in de sluiskolk en start het stralen en conserveren van de klep vanaf de onderzijde. Hiervoor worden afschermvoorzieningen aangebracht over de hoofdliggers naast de rijbaan. Deze fase is noodzakelijk om de doorlooptijd van de volledige afsluiting te verkorten van 6 naar 4 weken.

3. Plaatsen afschermvoorzieningen (21, 22 en 23 juli)

In de nachten van 21, 22 en 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en wordt het autoverkeer omgeleid via Gouda. Vanaf dat moment kan de brug vanaf de onderzijde worden gestraald. Hulpdiensten, ov en witte kolom hebben doorgang door het werkvak op de brug in deze nachten.

4. Versmalde rijstroken (20 juli - 9 augustus)

In deze periode starten we met een groot aantal werkzaamheden aan de onderzijde van de brug. Vanwege de afschermvoorzieningen direct langs de rijbaan zijn er versmalde rijstroken en geldt voor het verkeer op zowel de hoofdrijbaan als de wisselstrook een snelheidslimiet van 30 km/uur. Verkeer ondervindt hierdoor beperkte hinder. Door deze werkzaamheden uit te voeren, kan de periode van volledige stremming met twee weken worden verkort.

5. Tijdelijke fiets- voetgangersbrug (week van 20 juli)

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken bouwt Rijkswaterstaat en Savera Over-Bruggen speciaal een tijdelijke (fiets)brug. In de week van 20 juli wordt deze in gebruik genomen. De tijdelijke brug loopt parallel aan de brugklep en is tot half september in gebruik. De meeste mensen zullen kiezen voor thuiswerken, maar met deze tijdelijke brug blijft fietsen mogelijk en ook te voet kan de brug gebruikt worden.

6. Volledige wegstremming Algerabrug (10 augustus – 7 september)

In de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus worden de verkeersmaatregelen opgebouwd en wordt direct begonnen met de wegwerkzaamheden op de vaste brug en de klep. De volledige wegstremming duurt 4 weken.

Deze afsluiting zal lange files veroorzaken op de omleidingsroutes en de omliggende wegen. Rijkswaterstaat investeert daarom in extra voorzieningen.

Naast de tijdelijke (fiets)brug realiseren we extra vervoershubs waar reizigers kunnen overstappen op de fiets, bus, Waterbus en vervolgens de metro.

Politie, ambulances en spoedritten van de witte kolom kunnen gebruik blijven maken van de wisselstrook, zodat de aanrijtijden niet veranderen. Ook de brandweer neemt aanvullende maatregelen.

De omleiding gaat via provinciale wegen, Gouda en de A20. Als mensen toch gebruik blijven maken van de auto kost dat gemiddeld 96 minuten extra per rit in de file.

Samenloop met werkzaamheden van de gemeenten

Tijdens de stremming voeren de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel werkzaamheden uit op de aanbruggen om afsluitingen in de toekomst te voorkomen. Fietzers en voetgangers zullen op de aanbrug deze werkzaamheden tegenkomen:

- Krimpen aan den IJssel: Herstel van het asfalt op de hoofdrijbaan en conserveren van beide leuning van het fietspad.
- Capelle aan den IJssel: Verbreding van het fietspad

De komende weken stemmen beide gemeenten, Rijkswaterstaat en Savera Over-Bruggen de uitvoering verder af, met nadruk op de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers.

Vanaf 7 september wordt de brug weer opengesteld voor het wegverkeer. De aannemer werkt nog circa twee weken door in de sluiskolk voor afrondende conserveringswerkzaamheden.

7. Weekendstremming wisselstrook (11- 13 september)

In dit weekend wordt op de wisselstrook nieuw asfalt aangebracht en de belijning vernieuwd. Al het verkeer, inclusief hulpdiensten, maakt daarom gebruik van de hoofdrijbaan. Ondanks dat het werk in het weekend wordt uitgevoerd, is er kans op filevorming. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel welke aanvullende maatregelen nodig zijn om hinder in dit weekend te beperken, met extra aandacht voor zaterdagmiddag 12 september vanwege de verkeersdrukte.

8. Afbouw en laatste nachtelijke werkzaamheden (14-26 september)

In de week van 14 september wordt het werkbordes afgebouwd, inclusief de tijdelijke fiets- voetgangersbrug.

Vervolgens vinden de laatste nachtelijke werkzaamheden plaats in de week van 21-26 september ten behoeve van in bedrijfstelling. Verkeer wordt in deze nachten in beide richtingen tijdelijk stilgezet tijdens brugopeningen.

Tot slot.

Rijkswaterstaat en Savera Over-Bruggen hebben er vertrouwen in dat de volledige wegstremming teruggebracht kan worden naar vier weken. Met de gekozen fasering ontstaat een betrouwbare planning, waarbij de hinder zoveel mogelijk wordt geconcentreerd in de verkeersluwe zomermaanden.

We begrijpen dat deze afsluiting impact heeft op de regio en om aanpassingen vraagt van veel mensen. Rijkswaterstaat spant zich maximaal in, bouwt speciaal

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Afdeling Samenwerking

Landelijke Uitvoering Zuid

Datum

26 maart 2026

een tijdelijke brug voor voetgangers en (brom)fietzers en zorgt voor vervoershubs (overstapplaatsen) op diverse locaties aan beide kanten van de Algerabrug.

Wij vragen u en uw inwoners om ook bij te dragen. Veel mensen maken in deze periode gebruik van de vrijheid om thuis te werken, of pakken de fiets of het ov. Met uw keuze helpt u direct mee om de weg vrij te houden voor hulpdiensten en mensen die echt de weg op moeten.

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
Afdeling Samenwerking
Landelijke Uitvoering Zuid

Datum
26 maart 2026

Met vriendelijke groet,




Districtshoofd Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Bijlage A: planning

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
Afdeling Samenwerking
Landelijke Uitvoering Zuid

Datum
26 maart 2026

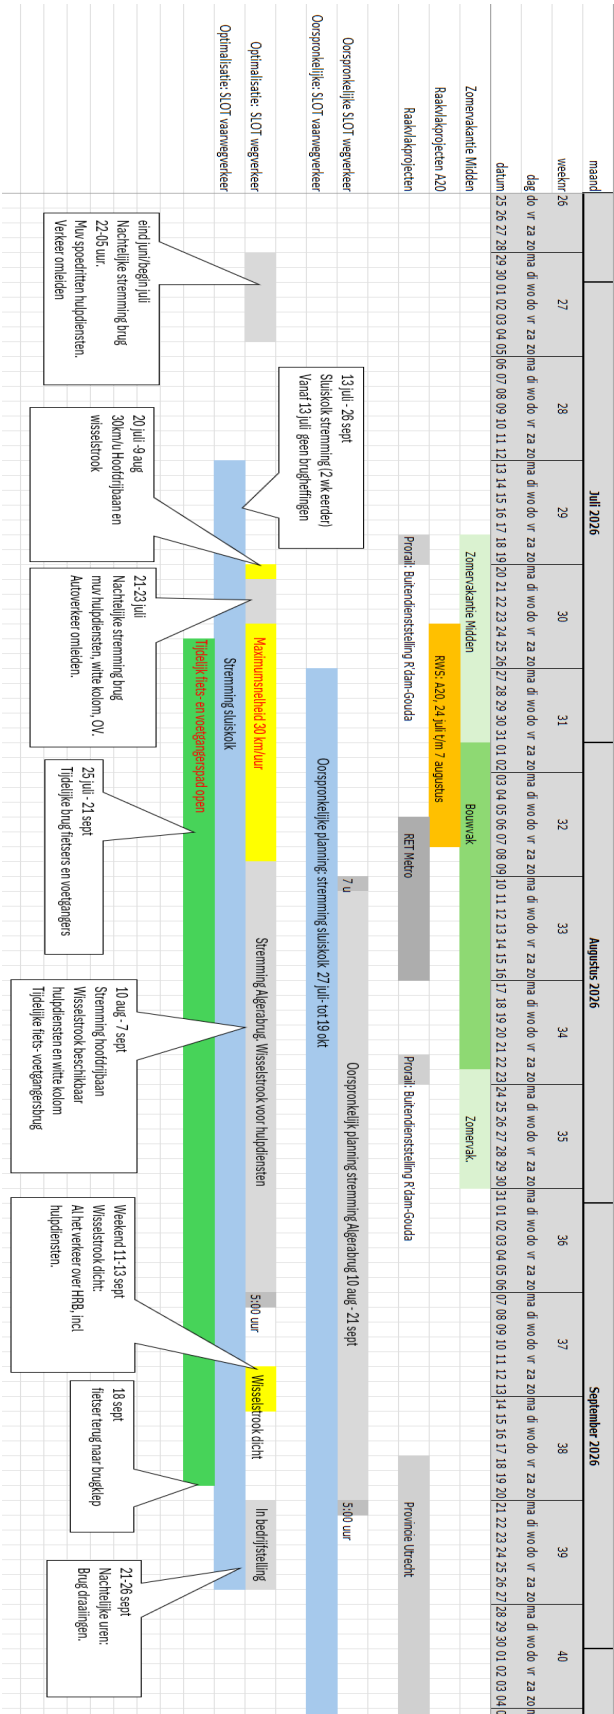

Persbericht Rijkswaterstaat

.....

Algerabrug geen 6 maar 4 weken dicht

De Algerabrug gaat vanaf 10 augustus 2026 geen 6 maar 4 weken dicht voor wegverkeer. Rijkswaterstaat en aannemer Savera Over-Bruggen hebben de planning van het groot onderhoud aan de brug kunnen verkorten door eerder te starten en werkzaamheden te combineren. Hierdoor valt het grootste deel van de afsluiting in de zomervakantie en wordt de hinder voor inwoners en ondernemers zo kort mogelijk.

Om deze planning mogelijk te maken, starten er 3 weken voor de afsluiting al werkzaamheden op de wisselstrook. Omdat hiervoor een rijstrookversmalling nodig is, geldt in deze periode op de hele brug een snelheidsbeperking van 30 km per uur. De verkorte planning is ook haalbaar omdat er in langere diensten wordt gewerkt en in een aantal weekenden voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. Voor de scheepvaart start de stremming van de sluiskolk nu eerder, maar wordt deze wel verkort van 12 naar 11 weken.

Planning en gevolgen

Wegverkeer

- Op zowel de hoofdrijbaan als de wisselstrook is er van maandag 20 juli tot maandag 10 augustus een rijstrookversmalling en geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur.
- De hoofdrijbaan is dicht van maandag 10 augustus tot maandag 7 september. De wisselstrook is dan alleen open voor hulpdiensten, zodat aanrijtijden niet veranderen.
- Verkeer wordt omgeleid via provinciale wegen, Gouda en de A20. Ook daar wordt het druk. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur.
- Weggebruikers kunnen daarom in veel gevallen beter kiezen voor thuiswerken, de fiets, het openbaar vervoer en/of de Waterbus (of buiten de spits reizen).

Fietsers en voetgangers

(Brom)fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden via een tijdelijke fiets/voetgangersbrug gewoon over de Algerabrug gaan. Aan beide kanten van de brug komen overstapplaatsen, zodat je indien nodig gemakkelijk je weg kunt vervolgen met openbaar vervoer en/of Waterbus.

Scheepvaart

- De sluiskolk is dicht van maandag 13 juli tot maandag 28 september.
- Het vaste deel van de brug blijft tijdens de werkzaamheden beschikbaar tot ca. 8,40 meter boven NAP.

Voor en na de afsluiting zijn er tijdens meerdere nachten langere brugopeningen nodig voor werkzaamheden aan de klep in geopende toestand en het inregelen van het nieuwe bewegingswerk. Het verkeer moet dan soms langer wachten voor een brugopening, soms wordt het omgeleid. Na de afsluiting wordt ook de wisselstrook nog voorzien van nieuw asfalt. Kijk voor de hele planning op rijkswaterstaat.nl/onderhoudalgerabrug.

Werkzaamheden gemeenten

Tijdens de afsluiting voeren de gemeenten aan beide kanten ook werkzaamheden uit op de aanbruggen, zodat hiervoor in de toekomst geen aparte afsluitingen nodig zijn. Aan de kant van Krimpen aan den IJssel wordt de hoofdrijbaan geasfalteerd en worden de leuningen van het fietspad behandeld. Aan de kant van Capelle aan den IJssel wordt het fietspad verbreed.

Vraagt aanpassing van ons allemaal

Wubbo Tempel, wethouder van gemeente Krimpen aan den IJssel: 'Het is positief dat de brug nu geen 6 maar 4 weken dicht is. Hiermee valt de afsluiting voor het grootste deel in de zomervakantie en is de hinder minder groot. Wij begrijpen dat dit voor alle inwoners ingrijpend is. Het vraagt aanpassing van ons allemaal. Door thuis te werken of de fiets te pakken, houden we de regio bereikbaar.'

Zo min mogelijk hinder

Het groot onderhoud aan de Algerabrug wordt uitgevoerd door Savera Over-Bruggen (Hollandia Services en SPIE Nederland). Projectmanager Pieter Stip: 'We hebben samen met Rijkswaterstaat

hard gewerkt aan een planning die zo min mogelijk hinder geeft. Veilig en zorgvuldig werken blijft natuurlijk belangrijk. Eerst waren er 6 weken gepland voor de werkzaamheden, maar we hebben dit kunnen verkorten naar 4 weken. Dat was een grote puzzel, maar zo beperken we de overlast zoveel mogelijk.'

Extra reisvoorzieningen

Menno Kamp, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat: 'Om mensen tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk op weg te helpen, investeren we flink in extra voorzieningen. Zo wordt er een tijdelijke (fiets)brug gebouwd, zodat mensen altijd lopend of fietsend over de Algerabrug kunnen gaan. Daarnaast realiseren we extra overstapplaatsen, waar reizigers kunnen overstappen op de fiets, (pendel)bus, Waterbus of metro.'

Groot onderhoud Algerabrug

Elke dag gaan ongeveer 47.000 voertuigen en 7.600 fietsers en voetgangers over de Algerabrug tussen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. In de zomer van 2026 voert Rijkswaterstaat dringend en noodzakelijk groot onderhoud uit aan de brug uit 1958. De houten balken en stalen langsliggers van de brugklep worden vervangen en het bewegingswerk in de brugkelder wordt gerenoveerd. Ook wordt het vaste brugdeel opnieuw geasfalteerd. Met dit onderhoud blijft de Algerabrug de komende jaren veilig en beschikbaar en worden onverwachte afsluitingen voorkomen. Zo blijft de regio goed bereikbaar voor iedereen. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden en reisalternatieven op rijkswaterstaat.nl/onderhoudalgerabrug.

Vaststaan of meebewegen?

Rijkswaterstaat vervangt of renoveert in Zuid-Holland de komende jaren een groot aantal verouderde bruggen, tunnels en wegen. Lees hier meer over de [werkzaamheden in de regio Zuid-Holland](#). Wilt u tijdens de werkzaamheden slimmer reizen en hinder vermijden? Bereid u dan goed voor. Kijk op de [website van Zuid-Holland Bereikbaar](#) voor een overzicht van grote werkzaamheden in Zuid-Holland én voor inspiratie om slimmer en duurzamer te reizen. Ook werkgevers of logistiek ondernemers kunnen op die website terecht voor tips over mobiliteit, regelingen en efficiëntere logistiek. Zo houden we de komende jaren met elkaar Zuid-Holland in beweging.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over bovenstaande werkzaamheden op de website van [Rijkswaterstaat Verkeersinformatie](#) of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid via 088-7970566 of wenz-perszaken@rws.nl.

Nummer persbericht: 019 RWS WNZ

Datum: 27-03-2026

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
