



Rapport Blaashal in Wognum

April 2020



Inhoud

Inleiding	3
Locaties.....	3
Vergunningsaanvraag.....	6
Planning.....	6
Voorzieningen	6
Exploitatie en beheer	7
Financieel.....	8
Kostenoverzicht realisatie blaashal per locatie.....	8
Optie: verenigingen als initiatiefnemer, gemeente subsidieert	9
Kopen of huren van een hal	9
Kanttekeningen en risico's	10
Algemene informatie blaashal	11
Formaat hal	11
Trainen met hars	11
Ventilator unit en propaantank.....	11
Duurzaamheid	12
Verwijderen gedurende zomermaanden	12
Bijlage 1 - Locatie Clapsslaan.....	13
Bijlage 2 - Locatie Spartanen	14
Bijlage 3 - Wat voorafging (2018-2020).....	15

Inleiding

In Wognum is er in de wintermaanden sprake van een capaciteitsvraagstuk voor de binnensporten. Het gaat om de activiteiten van breedtesportverenigingen in Wognum en topsportvereniging SEW handbal uit Nibbixwoud. Met het amendement 'Blaashal' van 7 november 2019 (DOC-19-200924) verzoekt u het college een raadsvoorstel voor te bereiden om ervoor te zorgen dat er, indien dit nodig blijkt, vóór aanvang van het volgende binnensportseizoen (oktober 2020) een tijdelijke blaashal in Wognum geplaatst kan worden.

Dit rapport is opgedeeld in een aantal secties. In het eerste deel wordt ingegaan op de locaties en hun specifieke kenmerken en vereisten. Vervolgens wordt ingegaan op het proces omtrent vergunningen en de tijdslijn. Tot slot worden enkele algemene kenmerken en eigenschappen van een blaashal geschetst.

Locaties

Er is eerder veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot de plaatsing van een blaashal. Locatie Clappslaan (nabij de Bloesem) kwam daarbij als meest kansrijke locatie naar voren. De verenigingen opperden nadien het handbalveld van de Spartanen als plek voor een blaashal. Een locatie die niet eerder is onderzocht.


Voor de blaashal zijn nu deze twee locaties in Wognum geanalyseerd (zie pagina 4 voor een gedetailleerd overzicht van de locaties en hun omgeving):

- Locatie Sportlaan, handbalveld van Spartanen
- Locatie Clappslaan, braakliggend terrein naast het tennispark (nabij sportcomplex De Bloesem)

Voor beide locaties wordt er van uitgegaan dat de hal jaarlijks in oktober wordt geplaatst en in april weer weggehaald.

In onderstaand overzicht worden enkele kenmerken en voor- en nadelen van de betreffende locaties geschetst.

Enkele kenmerken per locatie:

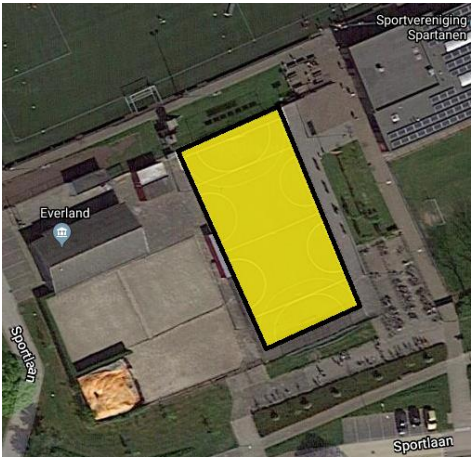Locatie	Sportlaan (handbalveld Spartanen)	Clappslaan (nabij De Bloesem)
		
Ligging	- De blaashal wordt geplaatst over het handbalveld. - De blaashal veroorzaakt geen schade aan het onderliggende veld. De ankers die nodig zijn voor het plaatsen van de blaashal blijven permanent liggen. - Er is ruimte nodig voor een propaantank en ventilator. De propaan opslagtank en aggregaat blijven gedurende het jaar staan.	- De blaashal wordt zo veel mogelijk aan de achterzijde van het terrein gesitueerd. - Er is ruimte nodig voor een propaantank en ventilator. De propaan opslagtank en aggregaat blijven gedurende het jaar staan. De ventilator unit zal achter de hal komen te liggen. Op die manier wordt geluid zo veel mogelijk gedempt.
Parkeren	- Uitgaande van een blaashal die gericht is op trainingscapaciteit wordt geen toenemend gebruik van parkeerplaatsen verwacht. - Wanneer er in de blaashal wedstrijden gespeeld worden zijn metingen nodig om in kaart te brengen of de parkeerdruk toeneemt. Bij toenemende parkeerdruk moeten mogelijk extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Kosten hiervoor zijn niet opgenomen.	- Parkeerdruk moet gemeten worden. Bij toenemende parkeerdruk moeten mogelijk extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Kosten hiervoor zijn niet opgenomen.

Formaat hal	- 22 x 45 meter. Dit heeft de maken met de oppervlakte van het handbalveld. Voor een groter formaat dient er een hokje en de dug-out verplaatst te worden.	- 27 x 47 meter
Ondergrond	- Het handbalveld biedt een stabiele ondergrond om de sportvloer op te leggen. - Het is nog onvoldoende duidelijk of de bestaande kolken naast het handbalveld voldoende zijn voor de afwatering. Wanneer de hal de aanwezige kolken bedekt, zijn extra voorzieningen voor afwatering nodig.	- Het grasveld is te zacht om direct een sportvloer op te leggen. Er is een extra ondervloer nodig. - Geschikte drainage ontbreekt en dient aangelegd te worden.
Voorzieningen	- Kleedkamers en toiletten zijn nabij de blaashal aanwezig.	- Kleedkamers en toiletten zijn op loopafstand van de blaashal aanwezig in de Bloesem - De volgende voorzieningen dienen aangelegd te worden: Riolering, toegangsweg, fietsenstalling, verlichting, aanleg elektra, etc.
Draagvlak omwonenden	- Uit een brief, getekend door 18 omwonenden van de Sportlaan (6 april 2019), blijkt dat er geen draagvlak is voor een beeldbepalende sporthal in de straat. Het is onduidelijk of een blaashal op het handbalveld wel op steun van omwonenden kan rekenen.	- In een brief van 30 oktober 2018 hebben de betrokken omwonenden aangegeven in principe akkoord te gaan met de komst van een blaashal voor enkele jaren, mits er uitzicht is op een permanente oplossing ten tijde van de realisatie van de blaashal. Navraag levert op dat zij nog steeds op dit standpunt staan. - Hierbij geven zij tevens aan dat er geen draagvlak is voor een blaashal gedurende tien jaar, maar in principe voor 2 seizoenen.
Beheer en exploitatie	- De Wognumse sportverenigingen kunnen gevraagd worden om het beheer en de exploitatie van de blaashal te doen. - Aandachtspunt is samenwerking met de exploitant van De Bloesem (<i>zie paragraaf: exploitatie en beheer/ risico's</i>).	- Het beheer en de exploitatie van de blaashal kan gekoppeld worden aan die van De Bloesem. Er ontstaat dan synergie in het rooster/ het gebruik van beide voorzieningen.

Vergunningsaanvraag

Om een blaashal te kunnen plaatsen is een vergunning nodig. Het gaat om een vergunning voor maximaal tien jaar. De vergunningaanvraag kan pas starten op het moment dat alle gegevens bekend zijn (locatie, kenmerken hal et cetera). Deze aanvraag kan daarom pas starten nadat de raad een besluit heeft genomen over de locatie en het beschikbaar stellen van middelen.

Een vergunningaanvraag kent een looptijd van 8 weken. In deze periode wordt onderzocht of de aanvraag voldoet aan de normen zoals verkeer, geluid- en lichthinder, veiligheid en ligging.

Geadviseerd wordt om eerst een principeverzoek in te dienen. Daarmee dien je een schetsplan in bij de gemeente en ga je met omwonenden in gesprek over het plan. Zij komen dan niet voor een verrassing te staan wanneer de vergunning wordt aangevraagd en openbaar wordt gemaakt. De looptijd van een principeverzoek is momenteel 12 weken.

Er is akoestisch onderzoek nodig om te bepalen of een blaashal op betreffende locatie gerealiseerd mag worden. Dit onderzoek kan uitgevoerd worden zodra er een raadsbesluit ligt en het principeverzoek compleet is. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegewogen in de uiteindelijke vergunningsaanvraag.

Planning

Onderstaande planning gaat uit van een ideale situatie zonder bezwaren van omwonenden en de mogelijkheid bij alle betrokkenen om op het gewenste moment te leveren. Er is in de huidige planning geen rekening gehouden met vertraging of onvoorziene zaken.

Doorlooptijd in weken	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Vorbereidende werkzaamheden																											
Principeverzoek (12 wkn)																											
Vergunningprocedure (8 wkn)**																											
Realiseren voorzieningen																											
Levertijd en plaatsing (16 wkn)*																											

* Afhankelijk van beschikbaarheid leverancier

** Indien er geen bezwaren zijn, anders is de looptijd langer

Voorzieningen

Aan de Clappslaan dienen voorzieningen, zoals een toegangsweg, gerealiseerd te worden. Bij locatie Spartanen hoeven minder voorzieningen getroffen te worden. In de planning is uitgegaan van de locatie Spartanen, voor de voorzieningen aan de Clappslaan is meer tijd nodig om deze te realiseren. De planning gaat uit van een ideaal scenario waarbij er geen vertraging is.

Vorbereidende werkzaamheden starten al tijdens de vergunningaanvraag. Het risico is dat we werkzaamheden verrichten die achteraf niet nodig waren (omdat er geen vergunning verstrekt wordt).

Bij de realisatie van de blaashal wordt er vanuit gegaan dat er gebruik gemaakt wordt van de elektriciteit van naastgelegen vereniging. Er worden geen blijvende voorzieningen getroffen, maar er wordt gebruik gemaakt van flexibele nutsvoorzieningen (aggregaat en gasopslag). Daarmee voorkomen we langdurende procedures voor de aanleg van nutsvoorzieningen die voor een relatief korte termijn nodig zijn.

Exploitatie en beheer

Over het beheer en de exploitatie van de blaashal moeten nog formele afspraken worden gemaakt. De sportverenigingen in Wognum hebben aangegeven dat zij zelf het beheer kunnen organiseren en dat dit geen extra kosten met zich meebrengt voor de gemeente.

De komst van een blaashal heeft impact op de al aanwezige binnensportvoorzieningen in Wognum. De exploitant van De Bloesem voorziet dat er – bij de realisatie van een hal aan de Sportlaan - minder gebruik gemaakt wordt van de Westfrieslandhal en dat de sociale functie van het sportcafé minder benut wordt. De exploitant acht het niet haalbaar om de Westfrieslandhal dan nog kostendekkend te exploiteren. Met het oplossen van het ene probleem wordt dan een ander probleem gecreëerd. Dit heeft grote consequenties, onder andere financieel en voor ambtelijke inzet.

Met de verenigingen en de exploitant van De Bloesem moeten aanvullende afspraken worden gemaakt over hoe om te gaan met een verschil in het gebruik van de Westfrieslandhal zodra de blaashal gerealiseerd is. Hoe wordt omgegaan met eventuele ondercapaciteit/ inkomstenderving door een eventuele overcapaciteit aan sportvoorzieningen in Wognum? Uitgangspunt moet zijn dat de Bloesem en de Westfrieslandhal het sportieve hart van Wognum blijven en de blaashal slechts als 'overdrukventiel' functioneert.

Financieel

De kosten voor een blaashal zijn afgelopen jaar fors toegenomen. Dit heeft te maken met stijgende kosten voor de materialen waar de blaashal van gemaakt wordt.

Kostenoverzicht realisatie blaashal per locatie

		Locatie Sportlaan (Spartanen)	Locatie Sportlaan (Spartanen)	Locatie Clappsalaan (De Bloesem)
		Initiatiefnemer: gemeente*	Initiatiefnemer: sportverenigingen (gemeente subsidieert)	Initiatiefnemer: gemeente*
Structurele lasten voor gemeente				
Opblaashal 27 x 47 meter Type A lichtdicht				€ 178.500,00
Opblaashal 22 x 45 meter Type A lichtdicht		€ 169.000,00		
Extra voorzieningen: personensluis, nooddeur en kaartleesslot		€ 10.000,00		€ 10.000,00
Revolution sportvloer (extra ondervloer nodig op zachte ondergrond)		€ 60.500,00		€ 102.500,00
Inrichting hal (sportattributen)		€ 28.000,00		€ 28.000,00
Mogelijke voorzieningen Sportlaan: Elektriciteit, afwatering hemelwater, fundament ventilator unit/ gasopslag en riolering		€ 15.000,00		
Voorzieningen locatie Clappsalaan: Riolering, drainage, toegangsweg, fietsenstalling, verlichting, aanleg elektra, etc.				€ 60.000,00
Onvoorzien	10%	€ 28.000,00		€ 37.500,00
Subtotaal		€ 310.500,00	€ 0,00	€ 416.500,00
Incidentele lasten voor gemeente				
Aanschaf containers voor opslag		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Vorbereidingskosten (o.a. inhuur projectleider, leges)	10%	€ 31.000,00	€ 5.000,00	€ 41.500,00
Opblaashal 22 x 45 meter Type A lichtdicht			€ 169.000,00	
Extra voorzieningen: personensluis, nooddeur en kaartleesslot			€ 10.000,00	
Revolution sportvloer (extra ondervloer nodig op zachte ondergrond)			€ 60.500,00	
Inrichting hal (sportattributen)			€ 28.000,00	
Mogelijke voorzieningen Sportlaan: Elektriciteit, afwatering hemelwater, fundament ventilator unit/ gasopslag en riolering (inclusief BTW)			€ 18.000,00	
Onvoorzien	10%		€ 29.000,00	
BOSA subsidie (20%) voor sportverenigingen**			€ -64.500,00	
Subtotaal		€ 34.000,00	€ 258.000,00	€ 44.500,00
Totaal		€ 344.500,00	€ 258.000,00	€ 461.000,00
Jaarlijkse kosten:				
Verzekering, WOZ e.d.		€ 2.500,00	n.v.t.	€ 2.500,00
Gas en elektra		€ 10.000,00	n.v.t.	€ 10.000,00
Montage en demontage hal (i.v.m. plaatsing gedurende winter seizoen)		€ 2.500,00	n.v.t.	€ 2.500,00
Afschrijving opblaashal (Afschrijftermijn: 10 jaar. Dit heeft te maken met ons investeringen- en		€ 26.500,00	n.v.t.	€ 31.500,00
Afschrijving drainage e.d. (Afschrijftermijn: 40 jaar)			n.v.t.	€ 1.500,00
Totaal		€ 41.500,00		€ 31.500,00

*bij sportuitgaven kan de gemeente de BTW niet terugkrijgen. In plaats daarvan is er de SPUK (Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport). Deze aanvraag voor compensatie moest uiterlijk 1 maart jl. ingediend zijn. Het is niet mogelijk om achteraf een aanvraag in te dienen.

**bij de BOSA-regeling geldt 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Per 23 april is er nog € 73 miljoen beschikbaar. Voor deze regeling kunnen het hele jaar aanvragen ingediend worden totdat de pot leeg is.

Optie: verenigingen als initiatiefnemer, gemeente subsidieert

We kunnen dit jaar voor de blaashal geen aanspraak maken op de SPUK subsidieregeling. De termijn om daar een aanvraag voor in te dienen is verstreken. Hierdoor lopen we zo'n € 54.000,- aan BTW compensatie mis.

Wanneer de verenigingen initiatiefnemer zijn van de blaashal, en de gemeente eenmalig subsidie verstrekt om dit mogelijk te maken, kan aanspraak gemaakt worden op de BOSA subsidieregeling van het rijk. Deze subsidie dient dan aangevraagd te worden door de verenigingen. Het gaat om een subsidie van 20% van de kosten, wanneer de aanvraag goedgekeurd wordt.

Kopen of huren van een hal

In de informatienota van april 2019 (referentie: Z-18-037288/ DOC-19-145-413) staat een financieel overzicht van het kopen en huren van een blaashal. Op dit moment is het huren van een blaashal bij de betreffende leverancier niet mogelijk. Er zijn geen hallen op voorraad om te verhuren. De leverancier geeft aan dat het kopen van een blaashal de enige optie is.

Kanttelingen en risico's

Het draagvlak bij omwonenden is nog niet gepolst bij omwonenden van De Sportlaan. Een blaashal wordt relatief dichtbij woningen gerealiseerd. Zij hebben recht om in bezwaar te gaan. Wanneer omwonenden in bezwaar gaan is het niet haalbaar om een blaashal op de twee locaties in Wognum te realiseren. Uitwijken naar Nibbixwoud is dan nog de enige optie. Ook bij die locatie dient een vergunning aangevraagd te worden. Het is niet duidelijk hoe omwonenden van De Dres naar deze oplossing kijken. De verenigingen in Nibbixwoud staan open voor deze mogelijkheid.

Uit een brief, getekend door 18 omwonenden van de Sportlaan (6 april 2019), blijkt dat er geen draagvlak is voor een beeldbepalende sporthal in de straat. Het is onduidelijk of een blaashal op het handbalveld wel op steun van omwonenden kan rekenen. Er is nog geen duidelijkheid over hoe de omwonenden van de Sportlaan staan tegen over een blaashal. Dit kan mogelijk in het vergunningstraject een vertragend effect hebben. Vanwege de coronacrisis heeft een bijeenkomst met deze omwonenden niet kunnen plaatsvinden.

De geschatte doorlooptijd gaat uit van een traject waarbij er geen vertraging is in een van de fases voor realisatie van een blaashal. Bij bezwaar- en beroep is het vergunning traject langer.

Om het proces te versnellen kan de blaashal besteld voordat het de vergunningsprocedure is afgerond. Dit is waar in de geschetste planning rekening mee is gehouden. Tegelijk met de vergunningaanvraag wordt opdracht verstrekt voor de productie van de blaashal. Het productieproces duurt circa 12 weken. Het risico is dat er geen vergunning verstrekt wordt en wel is geïnvesteerd in een blaashal.

Er is niet gekeken naar alternatieve oplossingen voor het capaciteitsprobleem. Mogelijk zijn er ook andere oplossingsrichtingen. Die hebben we buiten beschouwing gelaten. We hebben ons gericht op de opdracht van de gemeenteraad om een onderzoek te doen naar een blaashal in Wognum. Mogelijk alternatieven kunnen worden meegenomen in een breder onderzoek in het kader van het lange termijn accommodatiebeleid.

De komst van een blaashal heeft impact op de al aanwezige binnensportvoorzieningen in Wognum. De exploitant van De Bloesem voorziet dat er – bij de realisatie van een hal aan de Sportlaan - minder gebruik gemaakt wordt van de Westfrieslandhal en dat de sociale functie van het sportcafé minder benut wordt. De exploitant acht het niet haalbaar om de Westfrieslandhal dan nog kostendekkend te exploiteren. Er is een risico dat met het oplossen van het ene probleem, een ander probleem wordt gecreëerd. Met grote consequenties, onder andere financieel en voor ambtelijke inzet om het nieuwe probleem op te lossen.

Algemene informatie blaashal

Een blaashal is een tijdelijke sporthal, die snel neergezet kan worden. Met behulp van lucht wordt de constructie omhoog gehouden. Er komt een speciale vloer in de hal, die geschikt is voor de diverse sporten die Wognum kent (zaalvoetbal, handbal, tennis, badminton, volleybal en judo). De hal zal, wanneer er een vergunning wordt verstrekt, voor maximaal tien jaar staan.



Formaat hal

De leverancier adviseert een ruimte van 3,5 meter aan elke zijde van de sportvloer, omdat de hal aan de zijden schuin afloopt. De binnenmaat van de sportvloer is 20x40 meter. Een maatvoering van 27x47 meter is gebruikelijk voor een blaashal. Dan is er ruimte om doelen en spullen op te bergen. Ook kunnen sporters hun schoenen dan op een daarvoor geschikte vloer bij de ingang van de hal omwisselen en hun jas ophangen. Wat betreft de sportattributen is het lastig om veel spullen van binnen naar buiten te verplaatsen in verband met de luchtdruk (de deur te lang open laten betekent drukverlies). Het is daarom beter om sportattributen in de hal achter te laten.

Het formaat hal aan de Sportlaan zal kleiner zijn (22x45 meter). Dat heeft te maken met de beschikbare ruimte (de aanwezigheid van een hokje en de dug-out). Wanneer gekozen wordt voor een groter formaat blaashal kan het hokje en de dug-out verplaatst worden. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden (er is uitgegaan van een kleiner formaat blaashal op betreffende locatie). De blaashal is circa 10 meter hoog.

Trainen met hars

Een blaashal is geschikt om te trainen met hars. De sportvloer en de belijning zijn bestand tegen schoonmaakmiddelen. De hars welke gebruikt wordt door de handballers is eenvoudig te verwijderen met aceton of industriecleaner.

Eventuele vlekken op de 'halhuid' zijn te verwijderen. De halhuid van de luchthal is *niet* bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen (thinner, wasbenzine, aceton). Met terpentijn is hars te verwijderen.

De handbalbond staat het spelen van officiële wedstrijden in een blaashal niet toe.

Ventilator unit en propaantank

De afmeting van de propaantank is B1,5 x L6 meter. Het hekwerk daarom heen is L13 x B7,5 meter. De behuizing van de ventilator is ongeveer B5 x L3,5 meter. De afstand van de verwarmingsunit naar de gastank is ongeveer 12 meter. Dit wordt ter plekke beoordeeld door de gastankleverancier. Er moet een milieutoets gedaan worden voor deze voorzieningen.

De propaantank en ventilator blijven gedurende de zomermaanden op betreffende locatie staan.

Duurzaamheid

In een blaashal wordt gebruik gemaakt van LED-verlichting, een energiezuinige ventilator door middel van een frequentieregelaar en een topmembraan met een 50% daglicht doorlatend dakvlak, waardoor overdag geen kunstlicht nodig is.

Voor een blaashal is gas nodig om de buitenlucht te verwarmen. Als duurzaam alternatief kan gekozen worden voor biopropan. Biopropan is iets duurder, maar ook duurzamer doordat het CO₂ neutraal is.

Hoewel de ventilator die de hal op druk houdt energiezuinig is, is hiervoor wel 24/7 stroom nodig. De hal is gemaakt van kunststof. De technische levensduur wordt geïndiceerd op 20 jaar.


Verwijderen gedurende zomermaanden

Voor beide locaties is het voornemen om de hal jaarlijks in oktober de plaatsen en in april weer te weg te halen. Voor het plaatsen en verwijderen van de hal en de vloer zijn per keer 25 vrijwilligers nodig. De leverancier begeleidt dit proces. Kosten hiervoor zijn opgenomen in de begroting.

Omdat nog niet duidelijk is waar de zogenaamde 'halhuid', het isolatiemateriaal en de vloer opgeborgen kunnen worden, is aan de leverancier gevraagd wat de kosten zijn om het bij hen te stallen. Kosten voor opslag inclusief monteren, demonteren, belijning et cetera van de vloer bedraagt ongeveer € 9.000,- per jaar. Het advies is om een container te kopen/huren. Daarmee kunnen behoorlijk wat kosten bespaard worden. In de begroting zijn daarom de kosten voor aanschaf van containers opgenomen. Het is nog niet duidelijk waar de container geplaatst kan worden. Voor het plaatsen van een container is een vergunning nodig.

Wanneer we er voor kiezen om de hal elders op te bergen is het van belang om te weten dat de onderdelen van de hal 2000 kilo (halhuid) en 800 kilo (isolatiemateriaal) wegen. De benodigde opslagruimte is 35 m² (2,5 meter hoog) voor de blaashal exclusief de vloerdelen.

Bijlage 1 - Locatie Clapsslaan

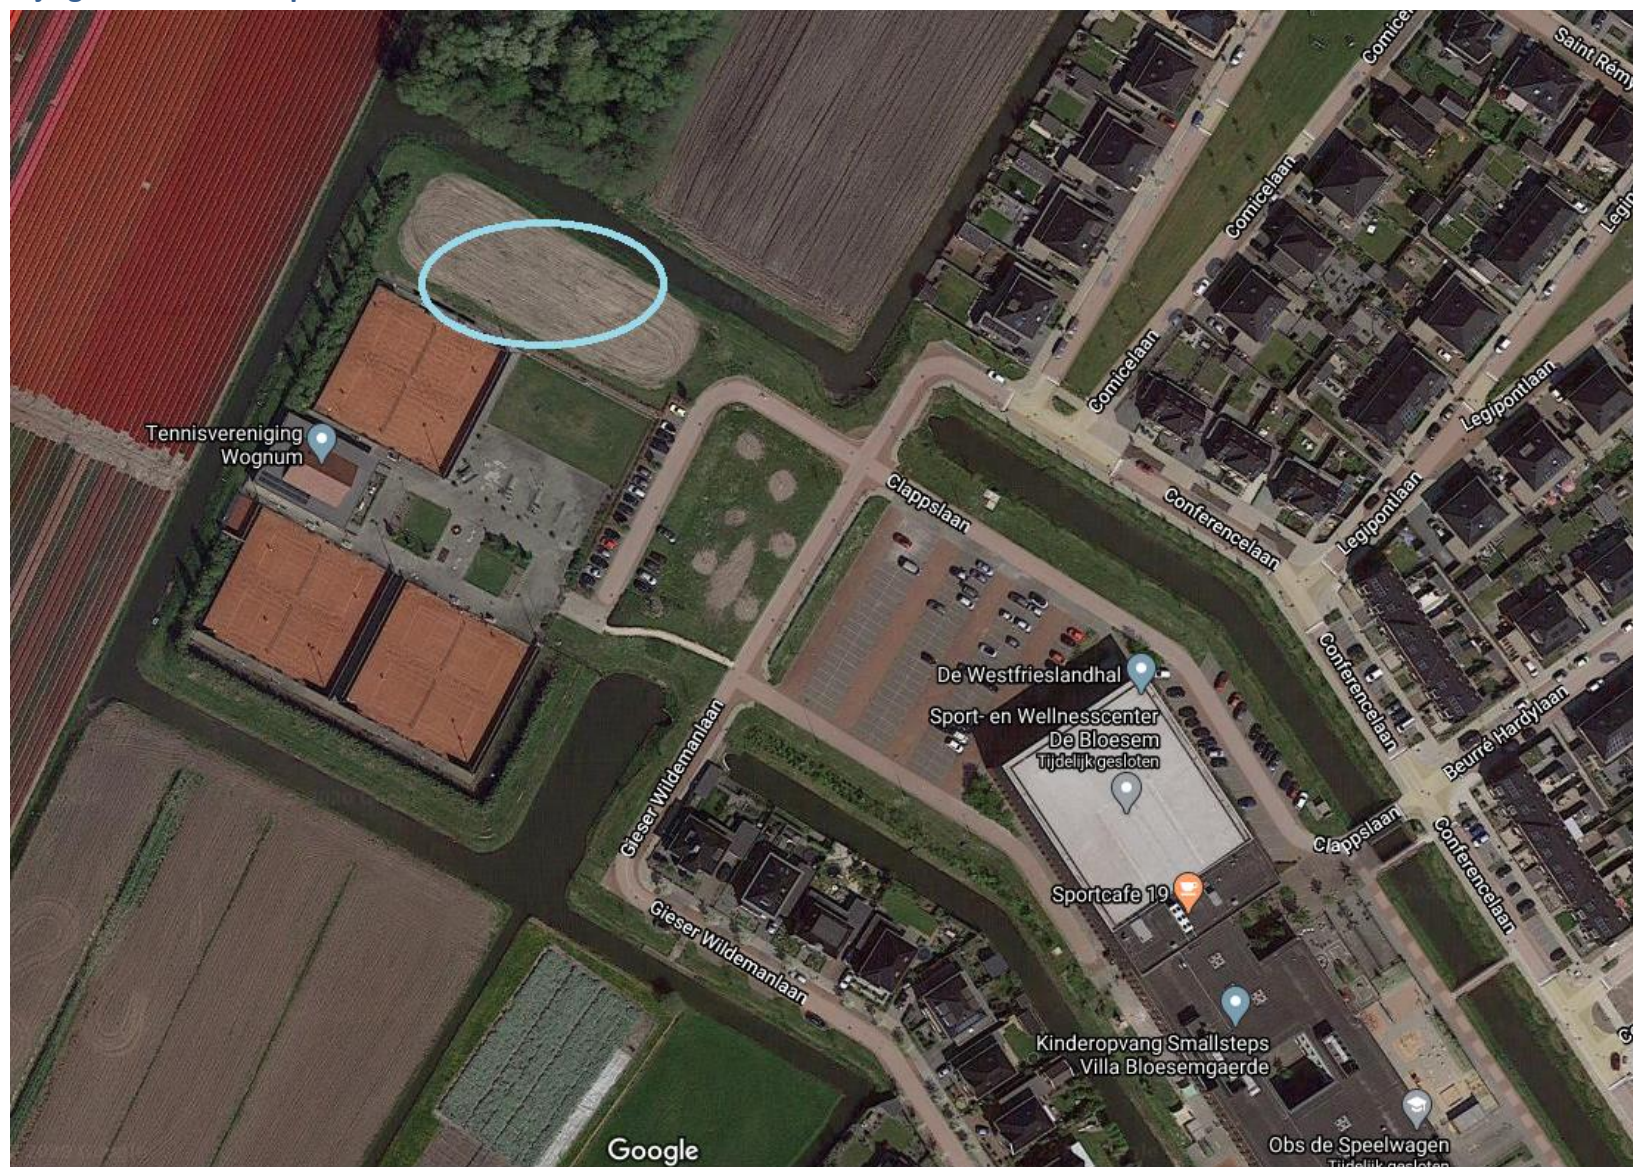

Bijlage 2 - Locatie Spartanen



Bijlage 3 - Wat voorafging (2018-2020)

Onderstaand tijdspad geeft een overzicht van belangrijke momenten in het proces om toe te werken naar een oplossing voor het capaciteitsprobleem. Te beginnen bij het moment dat het college opdracht gaf om samen met de initiatiefnemer van een blaashal in Wognum in gesprek te gaan.

2018:

- Juni 2018: College geeft opdracht om samen met de initiatiefnemer van een blaashal in gesprek te gaan.
- September 2018: Informatieavond met omwonenden MFA De Bloesem over het voornemen van de initiatiefnemer om een blaashal te realiseren.
- 18 september 2018: Informatienota blaashal (DOC-18-098278)
- 18 oktober 2018: Informatienota blaashal Wognum (DOC-18-103683)
- 8 november 2018: Motie vreemd aan de orde van de dag Capaciteit zaalsport in Wognum (CDA/ VVD/ BAMM) (Z-18-042643)
- 5 december 2018: Informatienota Uitvoering motie zaalcapaciteit Wognum (Z-18-044289/ IVR-18-05484)
Initiatiefnemer zet aanvraag voor blaashal in Wognum niet door.

2019:

- 11 april 2019: Informatienota Stand van zaken blaashal Nibbixwoud-Wognum (Z-18044289)
- 25 april 2019: Raadsvoorstel Haalbaarheidsonderzoek extra sporthal Wognum (Z-18-044289)
 - Amendement volwaardige sporthal voor breedtesport en behoud gymnastieklokaal (CDA/ PvdA/ GemeenteBelangen/ GroenLinks)
- 2 oktober 2019: Informatienota Vervolgonderzoek 2^e sporthal Wognum (Z-18-044289/ DOC-19-190664)
- 7 november 2019: Raadsvoorstel programmabegroting 2020 (Z-19072455)
 - Amendement (gewijzigd aangenomen) tweede sporthal Wognum (VVD, CDA, BAMM, ChristenUnie, D66)
 - Amendement Blaashal (VVD/ CDA/ BAMM/ ChristenUnie)

2020:

- 28 januari 2020: Informatienota Zaalcapaciteit Wognum (Z-18-044289/ DOC-20-23361)
