

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr. M.H.P. van Oosterhout
BEL/RO

Telefoonnummer +31235143952
oosterhoutm@noord-holland.nl

1 | 2

Verzenddatum

- 9 JULI 2020

Kenmerk

1439296/1439303

Betreft: Gewijzigde planning SCAN-project geothermie

Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) informeren wij u over de gewijzigde planning rond het geothermie-onderzoeksproject SCAN.

SCAN-onderzoeksproject

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de toepassing van geothermie (aardwarmte) nog onvoldoende van de grond gekomen, met name vanwege het gebrek aan kennis over de ondergrond. Het landelijke SCAN-project (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) moet hier verandering in gaan brengen. Het project wordt uitgevoerd door Energiebeheer Nederland (EBN), een staatsdochter waarvan de aandelen worden beheerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Met EBN en het ministerie van EZK is overeengekomen om via het SCAN-project aanvullend seismisch onderzoek te doen voor het MRA-gebied (aanvullende "lijnen").¹ Dit aanvullend onderzoek wordt door de provincies Flevoland en Noord-Holland gefinancierd. Separaat hebben beide provincies een kennisprogramma 'Versnelling Aardwarmte MRA' opgezet ter ondersteuning van overheden en initiatiefnemers en om de uitvoering van dit aanvullend onderzoek vanuit de provincies als opdrachtgever te begeleiden.

Vertraging deel seismische lijnen MRA

Eind mei zijn wij door EBN geïnformeerd over wijzigingen in de planning van het SCAN-project. Als belangrijkste reden van deze wijzigingen zijn de afgekondigde corona-maatregelen genoemd. Maar ook het gebrek aan beschikbaar, gekwalificeerd personeel zou

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143


Dreef 3

2012 HR Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

¹ Op 8 maart 2019 hebben de provincies Noord-Holland en Flevoland hieromtrent een convenant gesloten met EBN en het ministerie (zie PS-brief 1182027/1182080).

meespelen, alsook onzekerheden rond het tijdig verkrijgen van ontheffing van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

In de nieuwe planning van EBN wordt een onderscheid gemaakt tussen "MRA deel 1", met daarin enkele reguliere SCAN-lijnen en "MRA deel 2", met de resterende reguliere lijnen en de aanvullende lijnen. Met name de aanvullende lijnen zijn relatief complex (o.a. open water, gebieden met slappe bodemgesteldheid) en vragen om voldoende voorbereidingstijd. Deze voorbereiding is als gevolg van bovenstaande redenen in het geding gekomen. Dit betekent dat veel lijnen doorschuiven naar het voorjaar van 2021. Uitvoering van minder complexe SCAN-lijnen in de MRA vindt nog wél in zomer en najaar 2020 plaats.

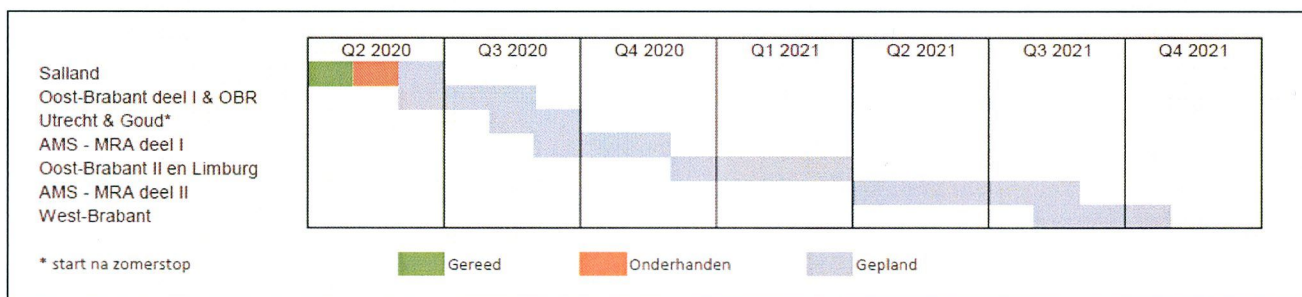

Figuur 1: Aangepaste planning SCAN (d.d. mei 2020, zie ook www.scanaardwarmte.nl)

Hoewel om begrijpelijke redenen, leidt deze vertraging bij ons tot zorgen over de voortgang van de energie-ontwikkelingen in het MRA-gebied. De zoektocht naar alternatieve warmtebronnen, als onderdeel van de afspraken uit het Klimaatakkoord, krijgt een nog krappere planning. Het opdoen van meer ondergrond-kennis is immers randvoorwaardelijk om nieuwe stappen te kunnen zetten in de ontwikkeling van geothermie. Wij gaan in overleg met EBN en het ministerie van EZK om de gevolgen van de nieuwe planning te bekijken en te bespreken hoe we verdere vertraging kunnen voorkomen.

Ondertussen bekijken wij met de betrokken MRA-partners in hoeverre in bepaalde gebieden de vertraging te beperken is door de informatie uit "MRA deel 1" te benutten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,


 provinciesecretaris
R.M. Bergkamp


 voorzitter
A.Th.H. van Dijk
