



VV - verenigde vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	31-01-2018	Agendapuntnummer 4.04.
Onderwerp	Krediet watergebiedsplannen Noord	
Collegevergadering	12-12-2017	
VV-commissie	Cie VW: 17-01-2018	
Portefeuillehouder	J.J.J. Langeslag	
Corsanummer	17.027046	
BABS id	6434	
Bijlagen		

(concept) De verenigde vergadering

besluit:

1. De lopende projecten Bennebroekpolders (00.08009/998) en Haarlem 023 (00.08009/999) samen te voegen en te continueren als 1 project genaamd WGP Haarlem/Bloemendaal.
2. De lopende projecten Haarlemmermeerpolder (00.08009/997) en Spaarnwoude (00.08009/868) samen te voegen en te continueren als 1 project genaamd WGP Spaarnwoude/Haarlemmermeer.
3. Voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.300.000,- voor 'Watergebiedsplannen Noord', ten behoeve van: * Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 800.000,- en een uitvoeringskrediet van €100.000 voor het project WGP Haarlem/Bloemendaal.
aanvullend uitvoeringskrediet van € 400.000,- voor het project WGP Spaarnwoude/Haarlemmermeer.

* Een

VV-besluitnota

De verenigde vergadering

besluit:

1. De lopende projecten Bennebroekpolders (00.08009/998) en Haarlem 023 (00.08009/999) samen te voegen en te continueren als 1 project genaamd WGP Haarlem/Bloemendaal.
2. De lopende projecten Haarlemmermeerpolder (00.08009/997) en Spaarnwoude (00.08009/868) samen te voegen en te continueren als 1 project genaamd WGP Spaarnwoude/Haarlemmermeer.
3. Voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.300.000,- voor 'Watergebiedsplannen Noord', ten behoeve van:
 - a. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 800.000,- en een uitvoeringskrediet van €100.000 voor het project WGP Haarlem/Bloemendaal.
 - b. Een aanvullend uitvoeringskrediet van € 400.000,- voor het project WGP Spaarnwoude/Haarlemmermeer.

Context

'Watergebiedsplannen Noord' beslaat het Rijnlandse gebied in de provincie Noord-Holland. Het grootste deel is ondertussen opgepakt (WGP-Spaarnwoude, WGP-Aalsmeer, WGP-Kennemerland, en WGP-Haarlemmermeerpolder). Een gedeelte tussen de duinen en de Haarlemmermeerpolder is nog niet opgepakt. Dit gebied bestaat grotendeels uit boezemland, maar hier liggen ook enkele polders en peilafwijkingen van de boezem in. Het gaat daarbij vooral om de polders en peilvakken rondom Haarlem, maar niet uitsluitend.

De polders zijn aangegeven op de kaart (bijlage 1). Het project heeft tot doel om uiterlijk in 2027 voor het gehele gebied de peilbesluiten te actualiseren, knelpunten op het gebied van waterkwaliteit- en kwantiteit aan te pakken en de NBW-opgave op te lossen.

De watergebiedsplannen zijn gewoonlijk samenstellingen van werk aan peilbesluiten, waterberging en -afvoer en waterkwaliteit in meerdere polders. De kredieten voor de watergebiedsplannen zijn bedoeld voor de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden in deze polders.

Uitvoeringskrediet wordt per polder of per watergebiedsplan aangevraagd en toegevoegd aan een (verzameld) krediet voor het betreffende watergebiedsplan. De uitgaven zijn per polder te herleiden. Voorbereidingskosten zijn minder efficiënt uit te splitsen naar de diverse watergebiedsplannen. De voorbereidingskredieten voor de verschillende watergebiedsplannen worden gebundeld in een krediet.

Door de onder besluitpunt 1 en 2 genoemde samenvoegingen gaat Watergebiedsplannen Noord qua kredietstructuur (samenhangende werkzaamheden gebundeld in een krediet) bestaan uit:

- a. Watergebiedsplan Spaarnwoude/Haarlemmermeer
- b. Watergebiedsplan Haarlem/Bloemendaal (hieronder vallen dan Bennebroekpolders, Haarlem023 en Haarlem)

Hieronder is een overzicht van reeds verstrekte kredieten opgenomen.

Tabel 1 Overzicht van reeds verstrekte kredieten per watergebiedsplan

Watergebiedsplannen Noord	krediet (€)	Type krediet, jaar (en evt. specificatie)	Reeds besteed /verplicht (€)
Watergebiedsplan Haarlem023	250.000 -----+ 250.000	Voorbereiding, april 2017 totaal tot heden Voorstel: samenvoegen met Haarlem e.o.	249.000
Watergebiedsplan Haarlemmermeerpolder	990.000 -----+ 990.000	Uitvoering, 2016 Totaal tot heden Voorstel: samenvoegen met Spaarnwoude	214.000
Bennebroekpolders	165.000 -----+ 165.000	Voorbereiding, 2016 Totaal tot heden Voorstel: samenvoegen met Haarlem e.o.	37.500
Watergebiedsplan Spaarnwoude	410.000 1.300.000 -----+ 1.700.000	Voorbereiding en quick wins, 2013 Voorbereiding en uitvoering, 2016 Totaal tot heden Voorstel: samenvoegen met Haarlemmermeerpolder	1.200.000

Voor WGP Haarlem/Bloemendaal bedraagt het totaal aan reeds beschikbaar gesteld krediet € 415.000. Na goedkeuring van besluit 3 bedraagt het totaal beschikbaar krediet zodoende € 1.315.000.

Voor WGP Spaarnwoude/Haarlemmermeer bedraagt het totaal aan reeds beschikbaar gesteld krediet € 2.690.000. Na goedkeuring van besluit 3 bedraagt het totaal beschikbaar krediet zodoende € 3.090.000.

Een aantal lopende watergebiedsplannen/peilbesluiten in Noord is inmiddels afgerond. Het betreft:

Watergebiedsplannen Noord	krediet (€)	status	Reeds besteed /verplicht (€)
Verbreed GRP+ Heemstede	425.000	Afgerond in 2017	330.000
Watergebiedsplan Zuid-Kennemerland	743.000	Afgerond in 2017	654.000
Verenigde Binnenpolder	685.000	Afgerond in 2017	730.000
Watergebiedsplan Mariënduin en Vogelenzang	407.000	Afgerond in 2017	446.000

Deze vier kredieten worden afgesloten. De kredietoverschrijdingen op de projecten Verenigde Binnenpolder en WGP Mariënduin en Vogelenzang vallen binnen de 10% marge die gesteld is in de vigerende Budgethoudersregeling.

Argumenten

1. Samenvoegen van kredieten leidt tot goedkopere projectbeheersing en efficiënter aanbesteden

Voorgesteld wordt om de kredieten voor de resterende watergebiedsplannen in Noord (zie tabel 1) samen te voegen tot twee stuks:

- a. Watergebiedsplan Spaarnwoude/Haarlemmermeer
- b. Watergebiedsplan Haarlem/Bloemendaal (hieronder vallen dan Bennebroekpolders, Haarlem023 en het nieuwe WGP Haarlem)

Een samengevoegd krediet geeft de mogelijkheid om het project goedkoper te beheersen. Bovendien maakt het het gemakkelijker om adviesdiensten en onderzoeken efficiënter aan te besteden voor meerdere polders tegelijk.

2. De voorgestelde investeringen zijn opgenomen in de Programmabegroting 2018

De genoemde investeringsprojecten zijn in de Programmabegroting 2018 opgenomen voor € 5.100.000.

Er zullen in 2018-2022 nog kredietaanvragen volgen, voor uitvoering van maatregelen voor polders die nu worden voorbereid. En voor nieuwe polders in voorbereiding.

3a.1 Voorbereiding van laatste resterende gebieden in Watergebiedsplannen Noord start

Voor de voorbereiding van de nieuwe polders in Haarlem/Bloemendaal is nieuw voorbereidingskrediet nodig. Het gaat om €600.000,-. Hiervoor worden interne uren besteed en opdrachten uitgezet waarmee onder andere knelpunten worden verkend, oplossingsrichtingen uitgewerkt, de peilen afgewogen en maatregelenpakketten samengesteld. Tevens worden afspraken met grondeigenaren gemaakt en overeenkomsten opgesteld. Daarnaast is er rekening gehouden met in 2018 uit te voeren onderzoeken, zoals flora en fauna onderzoek en inmeten van kunstwerken. Ook zijn kosten voor communicatie meegenomen in deze raming. Hiernaast zal er krediet besteed worden aan een waterkwaliteitsstudie om zo kansen voor waterkwaliteit in beeld te brengen en waar mogelijk in de uitvoering mee te nemen. Naar verwachting zal er begin 2019 voor Haarlem/Bloemendaal opnieuw voorbereidingskrediet worden aangevraagd voor de periode 2019 en verder.

De nieuwe polders in Haarlem/Bloemendaal worden per 2018 in de scope van Watergebiedsplannen Noord opgenomen. Omdat dit voorbereidingskrediet na 2018 zal worden aangevuld met nieuw voorbereidingskrediet, is er nu geen risicoreservering opgenomen. Pas als er uitvoeringskrediet wordt aangevraagd zal er ook een bedrag aan risicoreservering worden aangevraagd.

3a.2 Scopewijziging voor Haarlem023 noopt tot meer voorbereiding, eerder verstrekt krediet is benut

In Haarlem wordt het gebied tussen de N205, Amerikaweg, Boerhaavevaart en het volkstuintencomplex ontwikkeld tot woningbouwgebied Vijverpark in het project Haarlem023 Oost. Om het gebied goed te kunnen ontwateren, moet ook het watersysteem in het gebied worden aangepast. De variant van de projectontwikkelaar bleek onvoldoende robuust. Dit heeft geresulteerd in het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de voorkeursvariant van Rijnland. Het onderzoek is opgeleverd en de voorkeursvariant bleek te duur en niet realistisch om uit te werken. Nieuwe scope is nu: een reeds onderzochte alternatieve voorkeursvariant uitwerken tot een realistisch prijsvoorstel en voorlopig en definitief ontwerp. Door de VV is eerder krediet verstrekt voor de voorbereiding van Haarlem023 (zie tabel 1). Dit krediet zal begin 2018 volledig besteed dan wel verplicht zijn. Voor de voortzetting van de voorbereiding is nieuw voorbereidingskrediet nodig, namelijk €200.000,-(SSK-raming). Dit krediet zal worden gebruikt voor nog te maken engineeringskosten in 2018.

Omdat het voorbereidingskrediet naar verwachting in de loop van 2018 zal worden aangevuld met uitvoeringskrediet is in deze kredietaanvraag geen risicoreservering opgenomen. Pas als er uitvoeringskrediet wordt aangevraagd zal er ook een bedrag aan risicoreservering worden aangevraagd.

3a.3 Kansen benutten in WGP Haarlem vraagt om een 'quick-win'- krediet

Het uitvoeringskrediet van € 100.000,- wordt gebruikt om tijdens de voorbereidingsfase van Haarlem/Bloemendaal al kansen te benutten en geen-spijt-maatregelen (quick wins) uit te kunnen voeren. Dit kan onder andere bestaan uit het vervangen van knellende duikers of verbreden van watergangen. Hiermee kan een positief signaal worden afgegeven of in het gebied worden aangesloten op externe gebiedsontwikkelingen.

Omdat de maatregelen waarvoor het uitvoeringskrediet voor quick wins is bedoeld nog niet bekend zijn is er ook geen raming en risicoreservering beschikbaar. Pas bij de aanvraag van uitvoeringskrediet voor specifieke polders en maatregelen zal er ook een bedrag aan risicoreservering worden aangevraagd. Dit uitvoeringskrediet is juist volledig bedoeld om kansen te pakken.

3b.1 Scopewijziging WGP Haarlemmermeer ter verbetering van de waterkwaliteit

In de Haarlemmermeerpolder is sprake van een kwelsituatie, waardoor zout grondwater omhoog komt. Hierdoor treedt verzilting op van het oppervlaktewatersysteem. In 2016 is met het onderzoekproject "Slimmer doorspoelen Haarlemmermeerpolder" onderzocht of met minder inlaatwater dezelfde doelen bereikt kunnen worden. Inzicht hierin is wenselijk, omdat de behoefte aan zoetwater voor de Haarlemmermeerpolder een groot aandeel vormt in de inlaatbehoefte van heel Rijnland. Een efficiënter inlaat- en doorspoelbeheer levert een positieve bijdrage aan de zoetwatervoorziening binnen heel Rijnland. Uitkomsten van dit onderzoek geven aan dat het uitvoeren van een extra maatregel in de Haarlemmermeer "Nieuwe verbinding (inlaat) met polderboezem in noordwestelijk deel van peilvak 9" bijdraagt aan een efficiënter inlaat/ en doorspoelbeheer. Voor de uitvoering van peilbesluit Haarlemmermeerpolder is eerder krediet verstrekt, zie tabel 1. In de kredietaanvraag van 2016 was deze extra scope niet meegenomen. Daarnaast was bij de SSK-raming voor het reeds verstrekte uitvoeringskrediet een te lage raming gemaakt voor de engineeringkosten (eigen uren en adviesdiensten). Daarom wordt nu aanvullend € 400.000,- krediet gevraagd.

Het totale krediet voor de Haarlemmermeerpolder, inclusief het nu aan te vragen krediet, bedraagt 1,4 miljoen. Hiervan bestaat 150.000 uit een risicoreservering, waarvan circa de helft bestaat uit benoemde risico's en de andere helft onbenoemd is.

Risico's

1.1 Geen draagvlak voor de uit te voeren maatregelen

Voor uitvoering van inrichtingsmaatregelen in de polders is overeenstemming met eigenaren nodig. Indien deze niet wordt verkregen, kan dat leiden tot procedures en de daarbij komende kosten en vertraging. Door in de voorbereidingsfase veel aandacht aan communicatie en omgevingsmanagement te geven, wordt aan draagvlak gewerkt. O.a. door het organiseren van publieksavonden in de inventarisatiefase, ontwerpfase en afrondingsfase. Daarnaast zijn er gesprekken met belanghebbenden over concrete maatregelen.


1.2 Er wordt naar verwachting voor Haarlem/Bloemendaal de komende jaren meer voorbereidingskrediet gevraagd.

Het voorbereidingskrediet is bedoeld voor het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden tot en met eind 2018. Naar verwachting zal begin 2019 voorbereidingskrediet worden aangevraagd voor de voorbereidingskosten die in 2019 nodig zijn.

1.3 Met het uitvoeringskrediet kan slechts een beperkt aantal maatregelen worden uitgevoerd.


Het uitvoeringskrediet is bedoeld voor het uitvoeren van een beperkt aantal geen-spijt maatregelen. Duurdere en complexe maatregelen worden in de voorbereidingsfase verder uitgewerkt, waarna per polder uitvoeringskrediet zal worden aangevraagd.

Bijlage 1 – Lijst met polders WGP-Noord (corsa 17.115622)

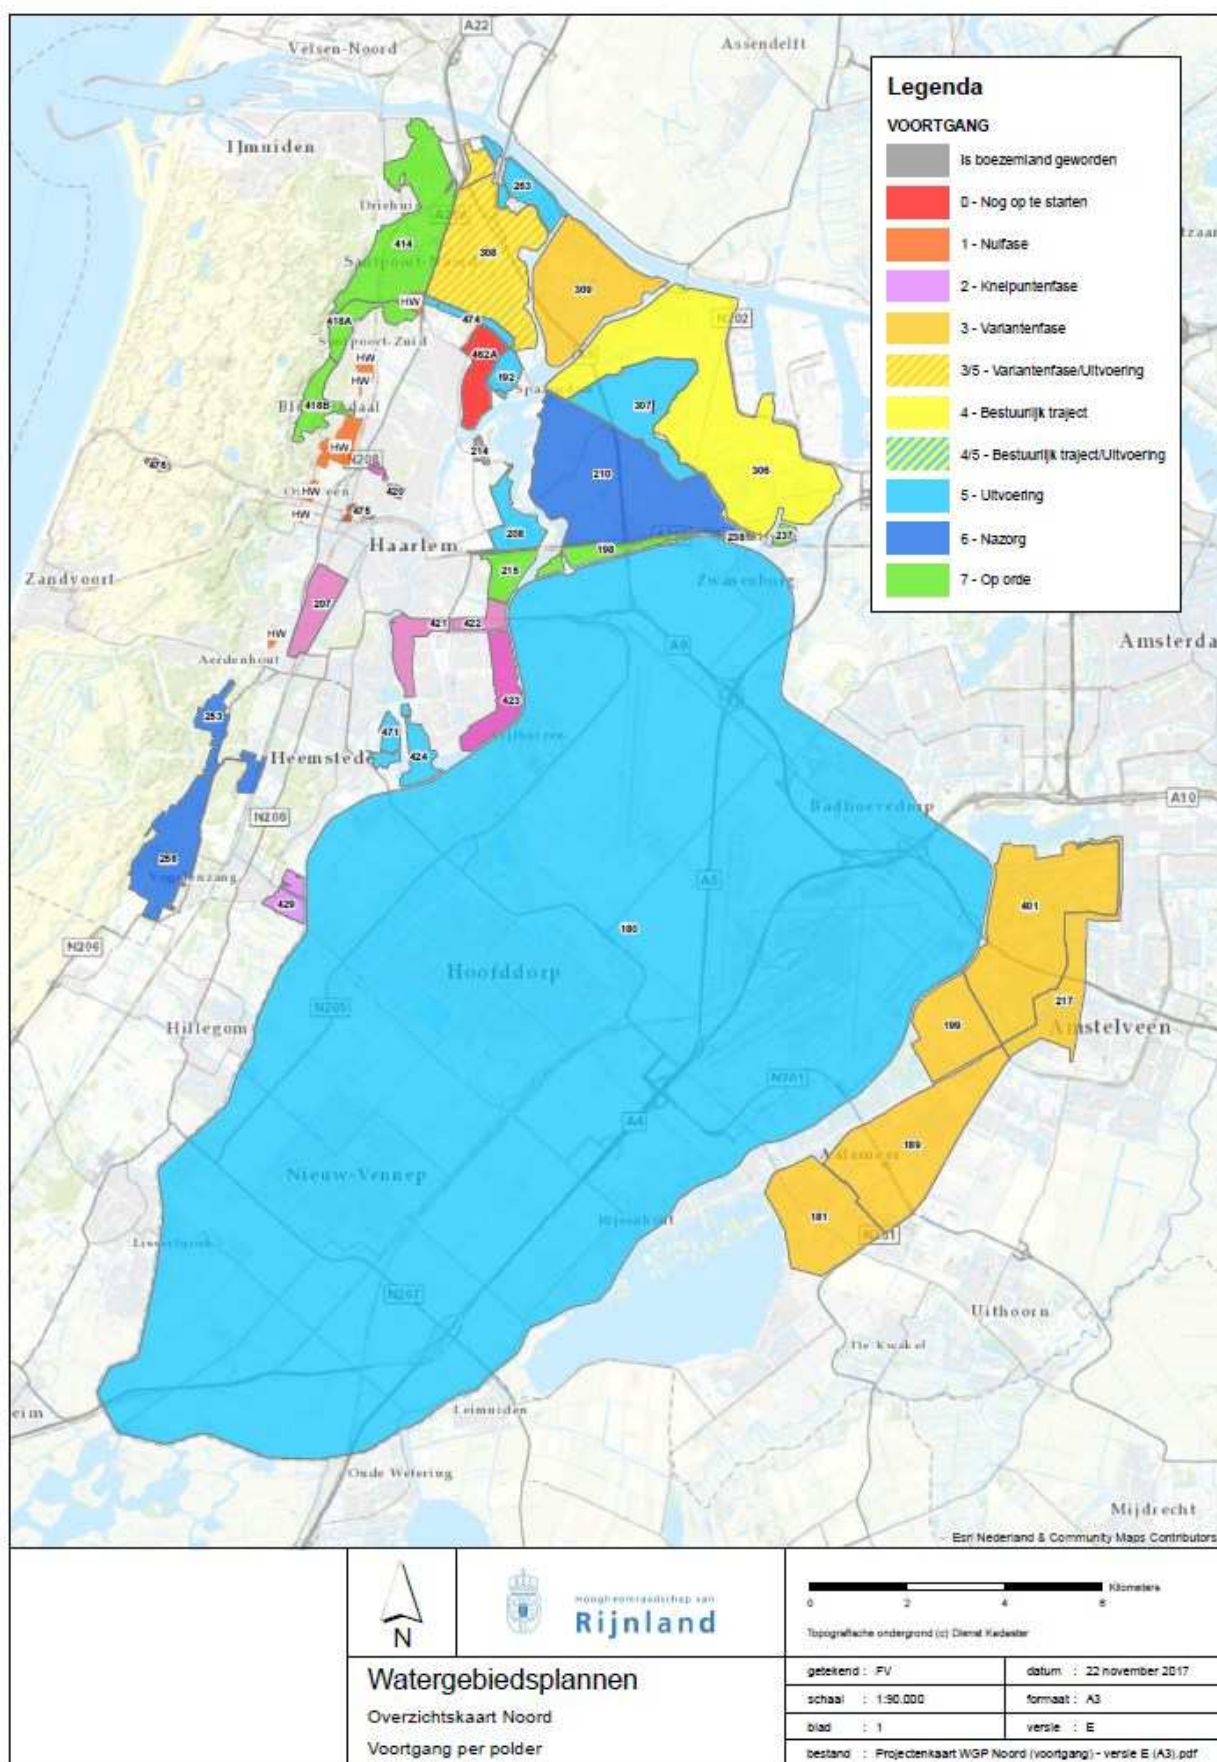

CODEPOLDER	CODE	NAAM
424	RL-424	Verenigde Groote en Kleine Polders
253	RL-253	Mariënduin
258	RL-258	Vogelenzang
420	RL-420	Schoter Veenpolder / Ripperdaterrein
423	RL-N-07	Vijfhuizer- en Poelpolder
429	RL-N-16	Bennebroekerpolder
422	RL-N-05	Poelpolder (Noord)
421	RL-N-04	Romolenpolder
308	GH-020	Polder de Velserbroek
414	RL-028	Hogergelegen Santpoort
263	GH-010	Noord-Spaarndammerpolder
192	GH-030	Oude Spaarndammerpolder
208	GH-050	Waarder- en Veerpolder
215	GH-060	Zuiderpolder
309	GH-070	Zuid-Spaarndammerpolder
306	GH-080	Houtrakpolder
307	GH-090	Inlaagpolder
210	GH-100	Vereenigde Binnenpolder
198	GH-110	Rottepolder
237	GH-120	IJpolder
238	GH-130	Zwetpolder
180	GH-140	Haarlemmermeerpolder
217	GH-150	Buitendijksche Buitenveldersche polder
199	GH-160	Schinkelpolder
189	GH-170	Oosteinderpoelpolder
181	GH-180	Horn- en Stommeerpolder
401	GH-190	Het Amsterdamse Bos
214	GH-040	Waarder- en Schoteroog
207	RL-N-11	Veenpolder
471	RL-471	Polder Heemstederveld
418B	RL-030	Stroomgebied Halve Maantje
418A	RL-029	Stroomgebied Brederode
462A	RL-U-04	Hekslootpolder
474	GH-200	De Verdolven Landen
475	RL-475	Julianalaan
476	RL-476	De Bokkedoorns

Bijlage 2 – Polderkaart WGP Noord kredietaanvraag januari 2018 (corsa 17.115621)

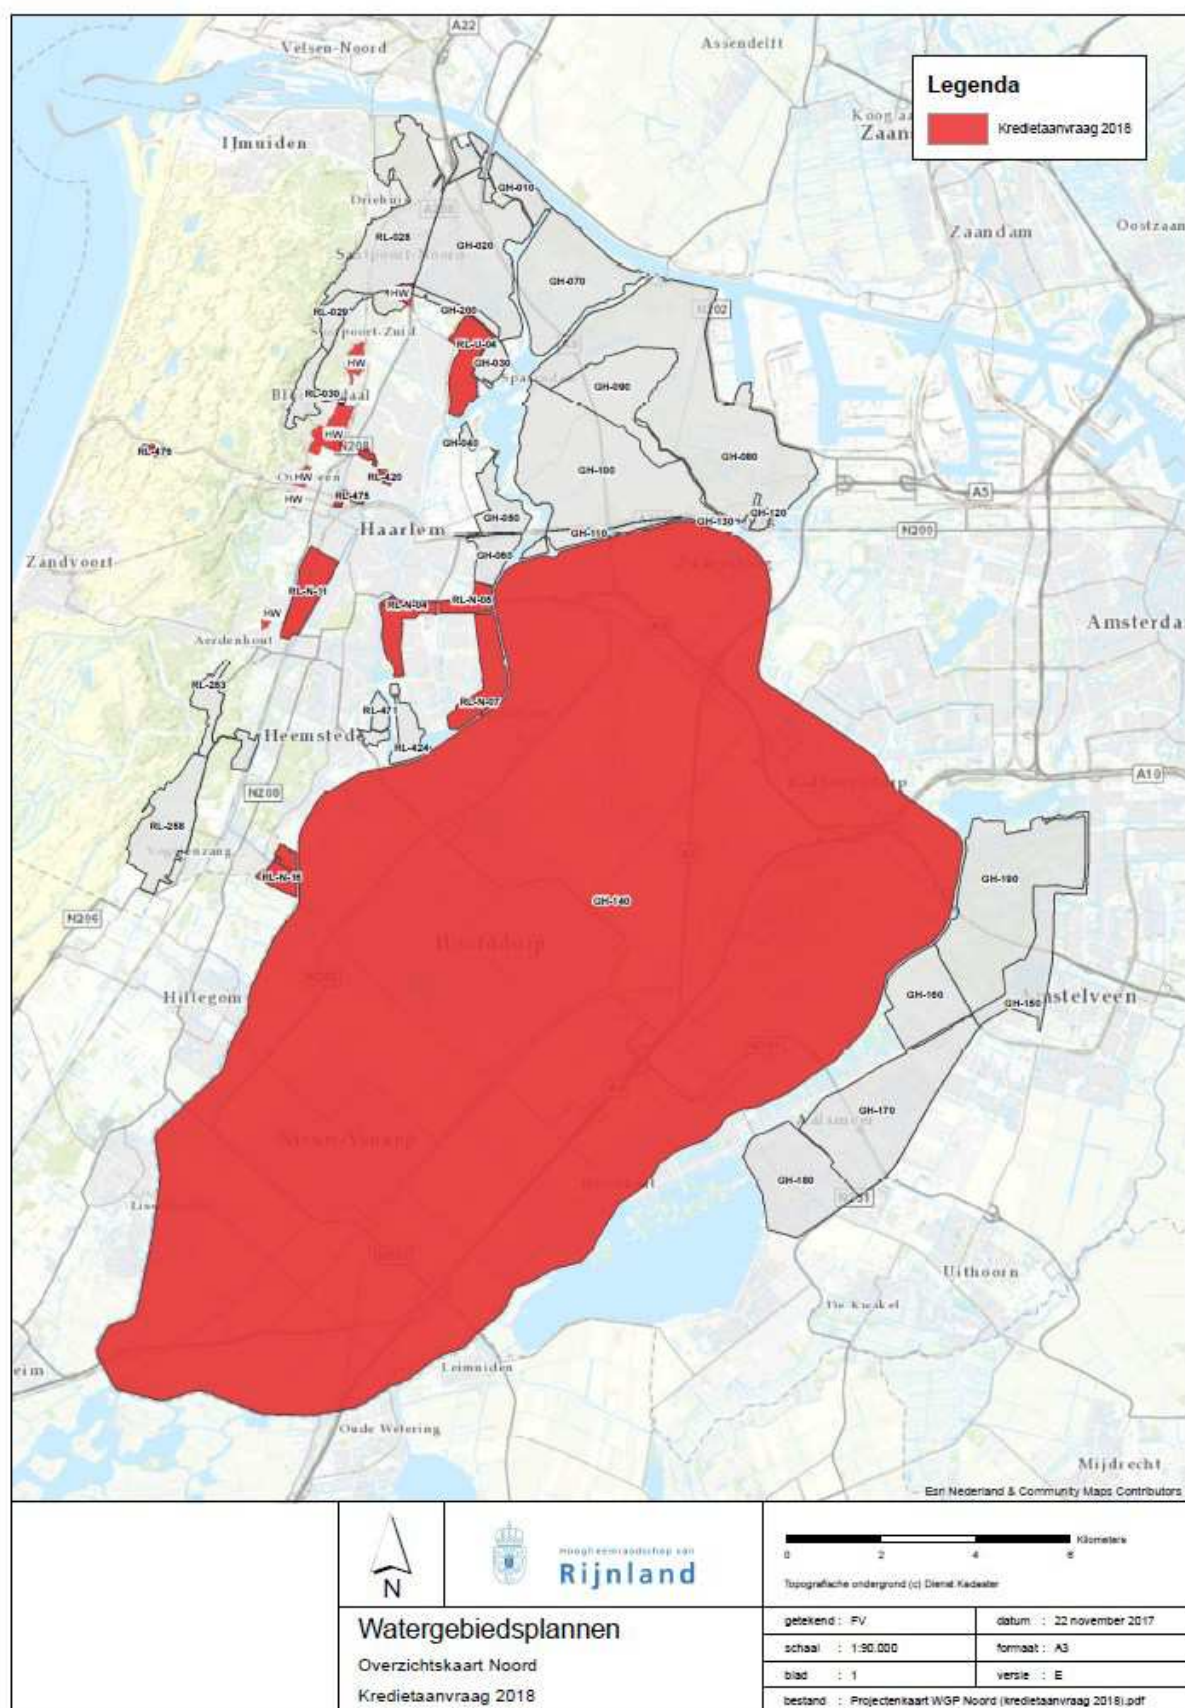



VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 12-12-2017, kenmerk
17.027046,
en gelet op art. 99 van de Waterschapswet,

besluit:

1. De lopende projecten Bennebroekpolders (00.08009/998) en Haarlem 023 (00.08009/999) samen te voegen en te continueren als 1 project genaamd WGP Haarlem/Bloemendaal.
2. De lopende projecten Haarlemmermeerpolder (00.08009/997) en Spaarnwoude (00.08009/868) samen te voegen en te continueren als 1 project genaamd WGP Spaarnwoude/Haarlemmermeer.
3. Voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.300.000,- voor 'Watergebiedsplannen Noord', ten behoeve van: * Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 800.000,- en een uitvoeringskrediet van €100.000 voor het project WGP Haarlem/Bloemendaal. * Een aanvullend uitvoeringskrediet van € 400.000,- voor het project WGP Spaarnwoude/Haarlemmermeer.

Leiden, 31-01-2018.

De verenigde vergadering,

R.A.M. van der Sande
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

